

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 1**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Demolice ŽB konstrukce brouzdaliště, dle rozsahu specifikovaného přílohou č. 1 – rozpočtem změny a přílohou č.2 – projektem bouracích prací			
Odůvodnění změny: Po odtěžení ŠD dle PD a rozpočtu, byla nalezena historická konstrukce ŽB brouzdaliště v prostoru budoucí zpevněné plochy a travního porostu. AD a TDS rozhodli o rozsahu bouracích prací této konstrukce viz. Příloha č. 2 ZL 1.. Zhotovitel s rozsahem bouracích prací nesouhlasí, jelikož je ponechávána ŽB deska pod konstrukcemi budoucích zpevněných ploch, jež svou přítomností v podkladních vrstvách může ovlivňovat. V místech ponechané ŽB nebude možné uplatňovat záruku na dílo dle SoD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	229 859,66,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	229 859,66,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	48 270,53,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	278 130,19,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	1 týden	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	1 týden	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	29.3.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	29.3.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	29.3.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	29.3.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	29.3.2022	
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		
	č.2 - Projektová dokumentace změny		
	č.3 - Fotodokumentace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Objekt: ZL - 01 ZL 01 - Bourání ŽB brouzdaliště

Rozpočet: 1 ZL 1 - Bourání ŽB brouzdaliště - nabídka sdružení

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			229 859,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			229 859,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	229 859,66 CZK
Základní DPH	21 %	48 270,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 278 130,19 CZK

v BRNĚ

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

[Signature]

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Popis objektu: ZL - 01 - ZL 01 - Bourání ŽB brouzdaliště
Popis rozpočtu: 1 - ZL 1 - Bourání ŽB brouzdaliště - nabídka sdružení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			105 300,47	46
96	Bourání konstrukcí	HSV			73 136,40	32
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			51 422,79	22
Cena celkem					229 859,66	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 01	ZL 01 - Bourání ŽB brouzdaliště
R:	1	ZL 1 - Bourání ŽB brouzdaliště - nabídka sdružení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				73 136,40
1	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	10,33000	7 080,00	73 136,40
Boky bazénu : 7,46+1,44+1,43				10,33000		

Díl: 1		Zemní práce				105 300,47
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	31,71701	3 320,00	105 300,47
Původní předpoklad :				62,91818		
$(16*4,146+7,875*3,5+3,893*6,506)*0,5+(0,6*2,8)*2*0,5+2*2*0,35+0,5*1,5*0,3$						
Odpočet původního : -				-62,91818		
$((16*4,146+7,875*3,5+3,893*6,506)*0,5+(0,6*2,8)*2*0,5+2*2*0,35+0,5*1,5*0,3)$						
Přepočet dle odvozu suti :						
(194,932-24,792)odpočet za bourání okraje výsledek						
170,14 při 62,9818 m3 :						
Odvezeno na skládku dle VL 110,57 :						
(110,57-24,792)=85,778 :						
85,778/170,14=0,5041 :						
62,9181*0,5041				31,71701		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				51 422,79
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 100,83000	1,07	2 247,89
110,57*19				2 100,83000		
4	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	110,57000	392,67	43 417,52
5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	110,57000	32,72	3 617,85
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	110,57000	19,35	2 139,53

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

BOURACÍ PRÁCE- BROUZDA

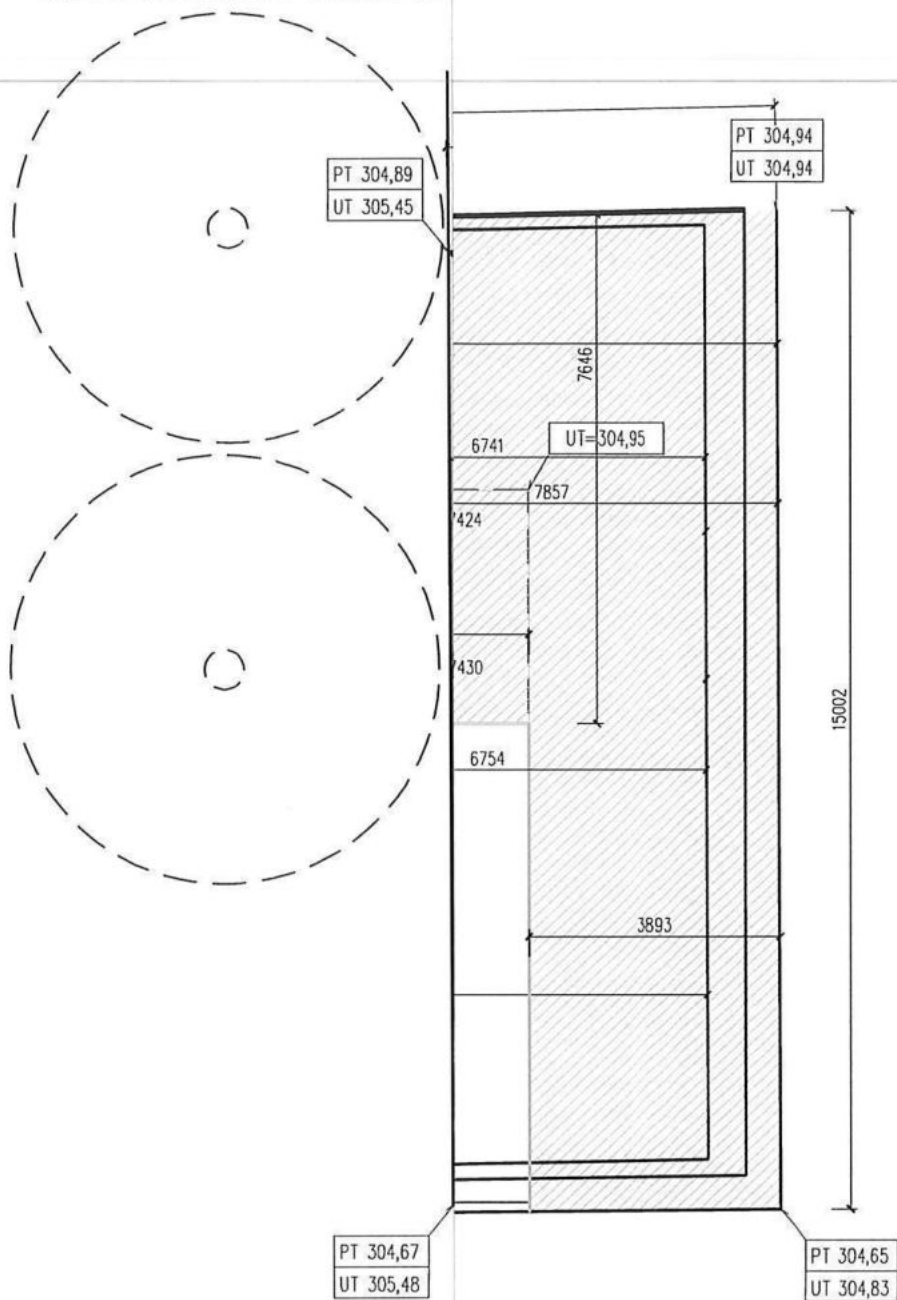


n. Michal Říčný

MO

měřítka
1:100

přil. č. paré

ZL. 1. - Příloha č. 3 Fotodokumentace

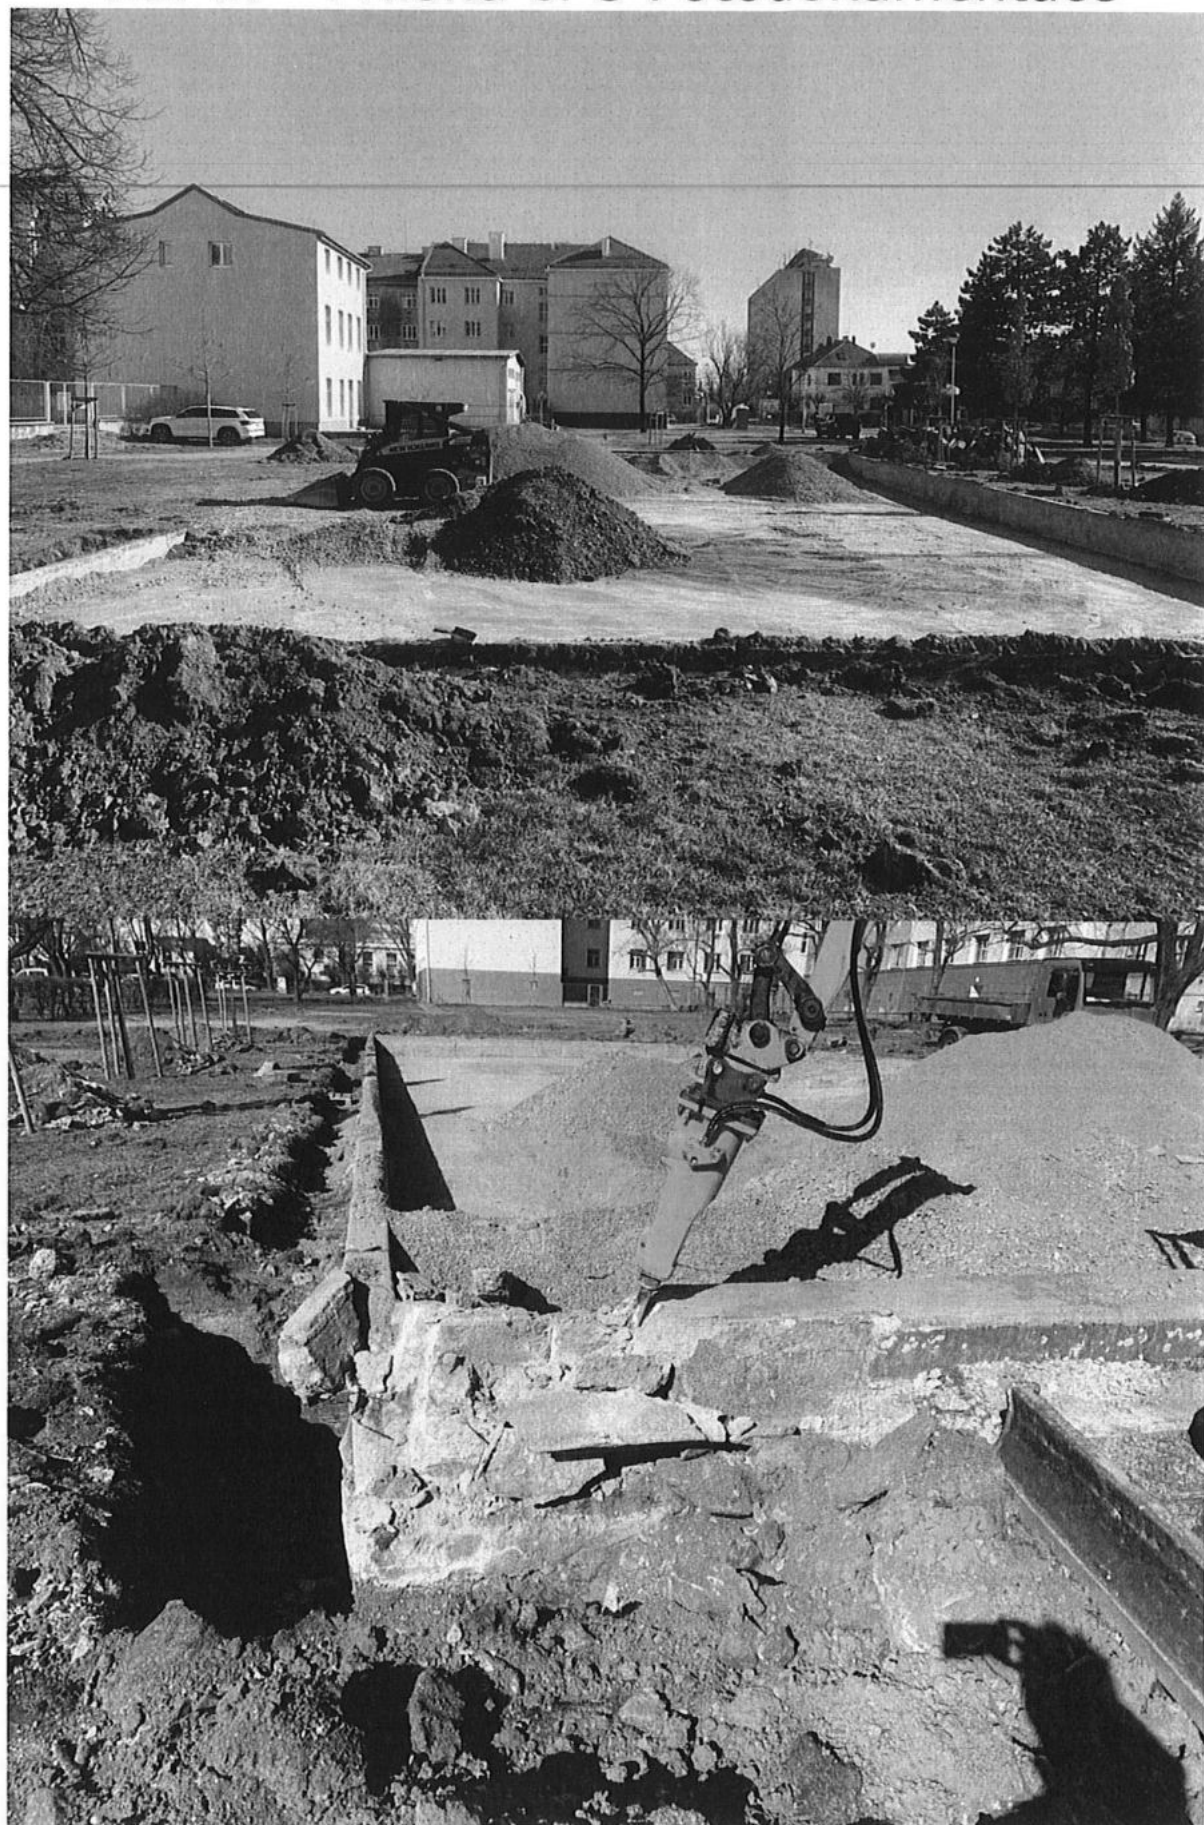

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 2**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Bourání chodníku, který byl vybudovaný během přípravy projektu rekonstrukce lokality Kolonka, a nebyl do PD zanesen.			
Odůvodnění změny: Během bouracích prací, byla zjištěna nová skutečnost, kterou projektová dokumentace nereflektovala, že byl v lokalitě Kolonka vybudován nový chodník o výměrách, dle přílohy. č.1 rozpočtu změny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	17 477,58,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	17 477,58,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	3 670,29,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	21 147,87,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	2 dny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	2 dny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	29.3.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	29.3.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	29.3.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	29.3.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	29.3.2022	
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 - Fotodokumentace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL**

Objekt: **ZL - 02 ZL 02 - Bourání chodníku nové zámkové dlažby**

Rozpočet: **1 ZL 02 - Bourání chodníku nové zámkové dlažby**

Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
--------------------	---	--

Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 477,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 477,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 477,58 CZK
Základní DPH	21 %	3 670,29 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **21 147,87** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 128,88	24
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 386,46	31
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 962,24	46
Cena celkem					17 477,58	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 02	ZL 02 - Bourání chodníku nové zámkové dlažby
R:	1	ZL 02 - Bourání chodníku nové zámkové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 128,88
1	113107324R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.24 cm	m2	20,44000	202,00	4 128,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,44000		20,44000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 386,46
2	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	20,44000	49,30	1 007,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,44000		20,44000		
3	113 10-61 Sb1	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic do tl.120 mm	m2	20,44000	58,84	1 202,69
		1,14+5,7+13,6		20,44000		
4	96R01	Skládání dlažby na palety	m2	20,44000	82,00	1 676,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,44000		20,44000		
5	96R02	Dodání EUR palet	ks	3,00000	500,00	1 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 962,24
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	292,43508	1,07	312,91
		19*15,39132		292,44000		
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	76,95660	5,23	402,48
		5*15,39132		76,96000		
8	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí beton,obrubník	t	15,39132	392,67	6 043,71
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,39132	19,33	297,51
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,39132	58,84	905,63

ZL. 1. - Příloha č. 2 Fotodokumentace




① Platba vorební + paletování (čištění)
 $1,14 + 5,7 + 13,6 = 20,44 \text{ m}^2$

② Odvoz na FCC

③ Bovení obrub (v 33,5 km (50 m tloušťka)
- nakládka
- odvoz
- skládka

④ Odstranění vzorových vrstev

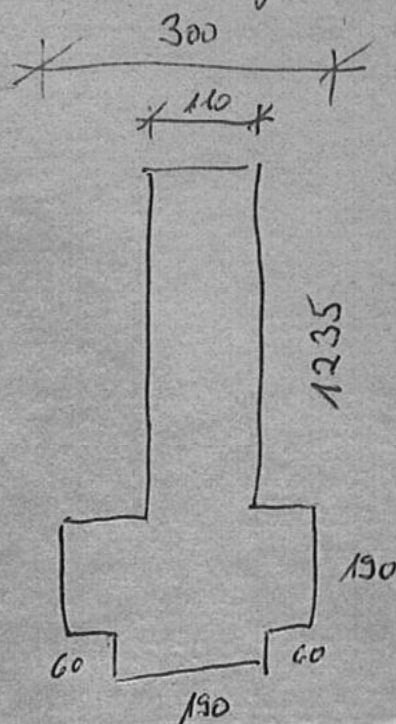

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 3**


Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
<p>Popis změny: Z důvodu optimalizace ceny, došlo ke zvýšení základové pasu pod kamennou zídou o 15 cm a tím ke snížení výšky realizované kamenné zídky viz. příloha č.2 projektová dokumentace změny č. 3. Tímto postupem zhotovitele došlo ke snížení nákladů na straně objednatele. Tato změna neměla dopad na způsob provádění základu oproti původní PD a necenění ve veřejné soutěži.</p>			
<p>Odůvodnění změny: V rámci ekonomického přístupu k plnění díla zhotovitel navrhl optimalizaci realizace detailu založení a výstavby kamenné zídky. Cenová úspora je vyčíslena v příloze č. 1 rozpočet změny.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	142 536,72,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-256 647,43,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-114 110,71,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-23 963,25,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-138 073,96,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	bez dopadu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	29.3.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	29.3.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	29.3.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	29.3.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	29.3.2022	
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:		ZL - 03 ZL 03 - Zvýšení základů opěrné kamenné stěny	
Rozpočet:		1 ZL 03 - Zvýšení základů opěrné kamenné stěny	
Objednatel:		Město Znojmo IČO: 00293881 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 66902 Znojmo	
Zhotovitel:		FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 60200 Brno-Trnitá	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-114 110,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-114 110,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-114 110,71 CZK
Základní DPH	21 %		-23 963,25 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-138 073,96 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			142 536,72	-125
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-256 647,43	225
Cena celkem					-114 110,71	100

**PŘED ZMĚNOU DLE PD
ŘEZ D-D, DETAIL 1:10**

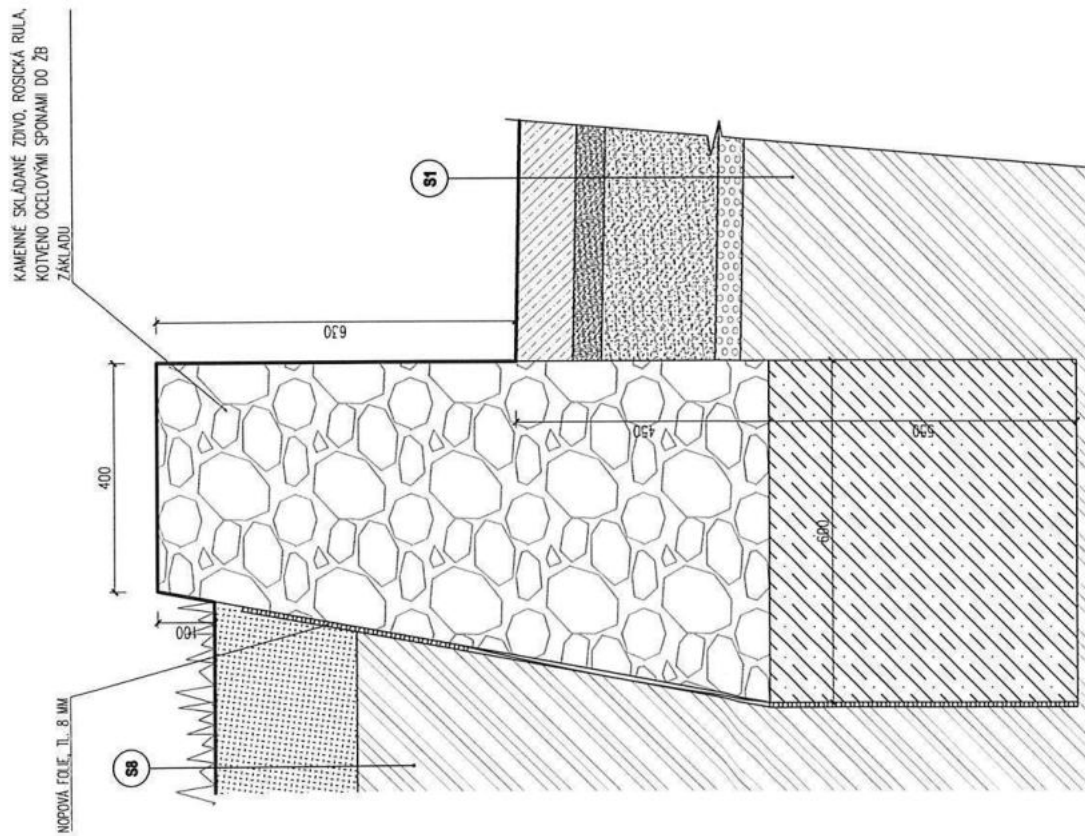

**NÁVRH ZMĚNY
ŘEZ D-D, DETAIL 1:10**

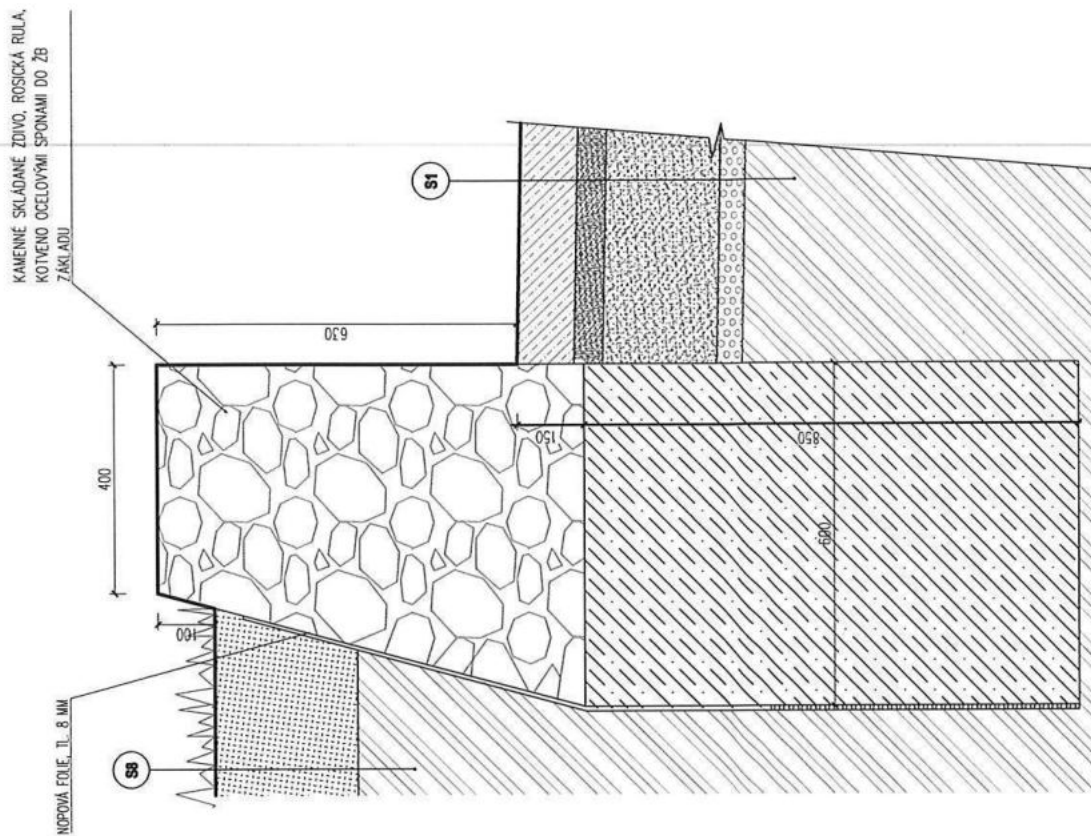

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 4**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
<p>Popis změny: Sanace pláň provedena v tloušťce 300 mm, kamenivem vyzískaným z bouracích prací páteřní komunikace.</p>			
<p>Odůvodnění změny: Na základě výsledků statické zatěžovací zkoušky (SZZ), bylo vyhodnoceno, že pláň nesplňuje požadovanou únosnost 45 MPa viz. protokoly SZZ příloha č. 3. Na základě toho byl ze strany TDI navrhnutý postup sanace pláň v tloušťce 300 mm za použití vyzískané štěrkodrtě z bourání páteřní komunikace v lokalitě Kolonka. Dále byl ze strany TDS a AD snížen požadavek na únosnost nové pláň a to 30 MPa. Zhotovitel upozornil, že pokud nedojde k zaústění dešťových vod z okolních střeš do dešťové kanalizace a budou nadále odváděny tyto vody na těleso komunikace, nemůže v daném úseku dodržet záruční podmínky.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		166 046,20,- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-62 935,03,- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		103 111,17,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	21 653,35,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		124 764,52,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		3 dny
	Vliv změny na termín dokončení díla:		3 dny
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		29.3.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		29.3.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		29.3.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		29.3.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		29.3.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		
	č.2 - Fotodokumentace		
	č.3 - Protokoly SZZ		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:		ZL - 04 ZL 04 - Zlepšení únosnosti parkoviště F1	
Rozpočet:		1 ZL 04 - Zlepšení únosnosti parkoviště F1	
Objednatel:		Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:		FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			94 671,17
PSV			8 440,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			103 111,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		103 111,17 CZK
Základní DPH	21 %		21 653,35 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			124 764,52 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> v _____ </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 45%;"> _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			83 191,87	81
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			21 977,44	21
5	Komunikace	HSV			52 436,89	51
711	Izolace proti vodě	PSV			8 440,00	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-62 935,03	-61
Cena celkem					103 111,17	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 04	ZL 04 - Zlepšení únosnosti parkoviště F1
R:	1	ZL 04 - Zlepšení únosnosti parkoviště F1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				83 191,87
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 479,752*0,3	m3	143,92560	114,50	16 479,48
				143,92560		
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 143,92560	m3	143,92560	24,30	3 497,39
				143,92560		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 143,92560	m3	143,92560	130,32	18 756,38
				143,92560		
4	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 143,92560	m3	143,92560	308,90	44 458,62
				143,92560		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				21 977,44
5	451971113R00	Položení vrstvy z geotextilie, 479,752	m2	479,75200	45,81	21 977,44
				479,75200		
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 440,00
6	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků Zajištění základů BD u parkoviště F1 proti tlakové vodě : 40	m2	40,00000	211,00	8 440,00
				40,00000		
Díl: 5		Komunikace				52 436,89
7	564782111RHBH	Podklad z kam.drceného 30 cm bez dodávky materiálu 479,752	m2	479,75200	109,30	52 436,89
				479,75200		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-62 935,03
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	-320,16600	19,33	-6 188,81
				-320,16600		
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -19*320,166	t	-6 083,15400	1,07	-6 508,97
				-6 083,15400		
10	003	Poplatek za skládku	t	-320,16600	156,91	-50 237,25

ZL. 4. - Příloha č. 2 Fotodokumentace

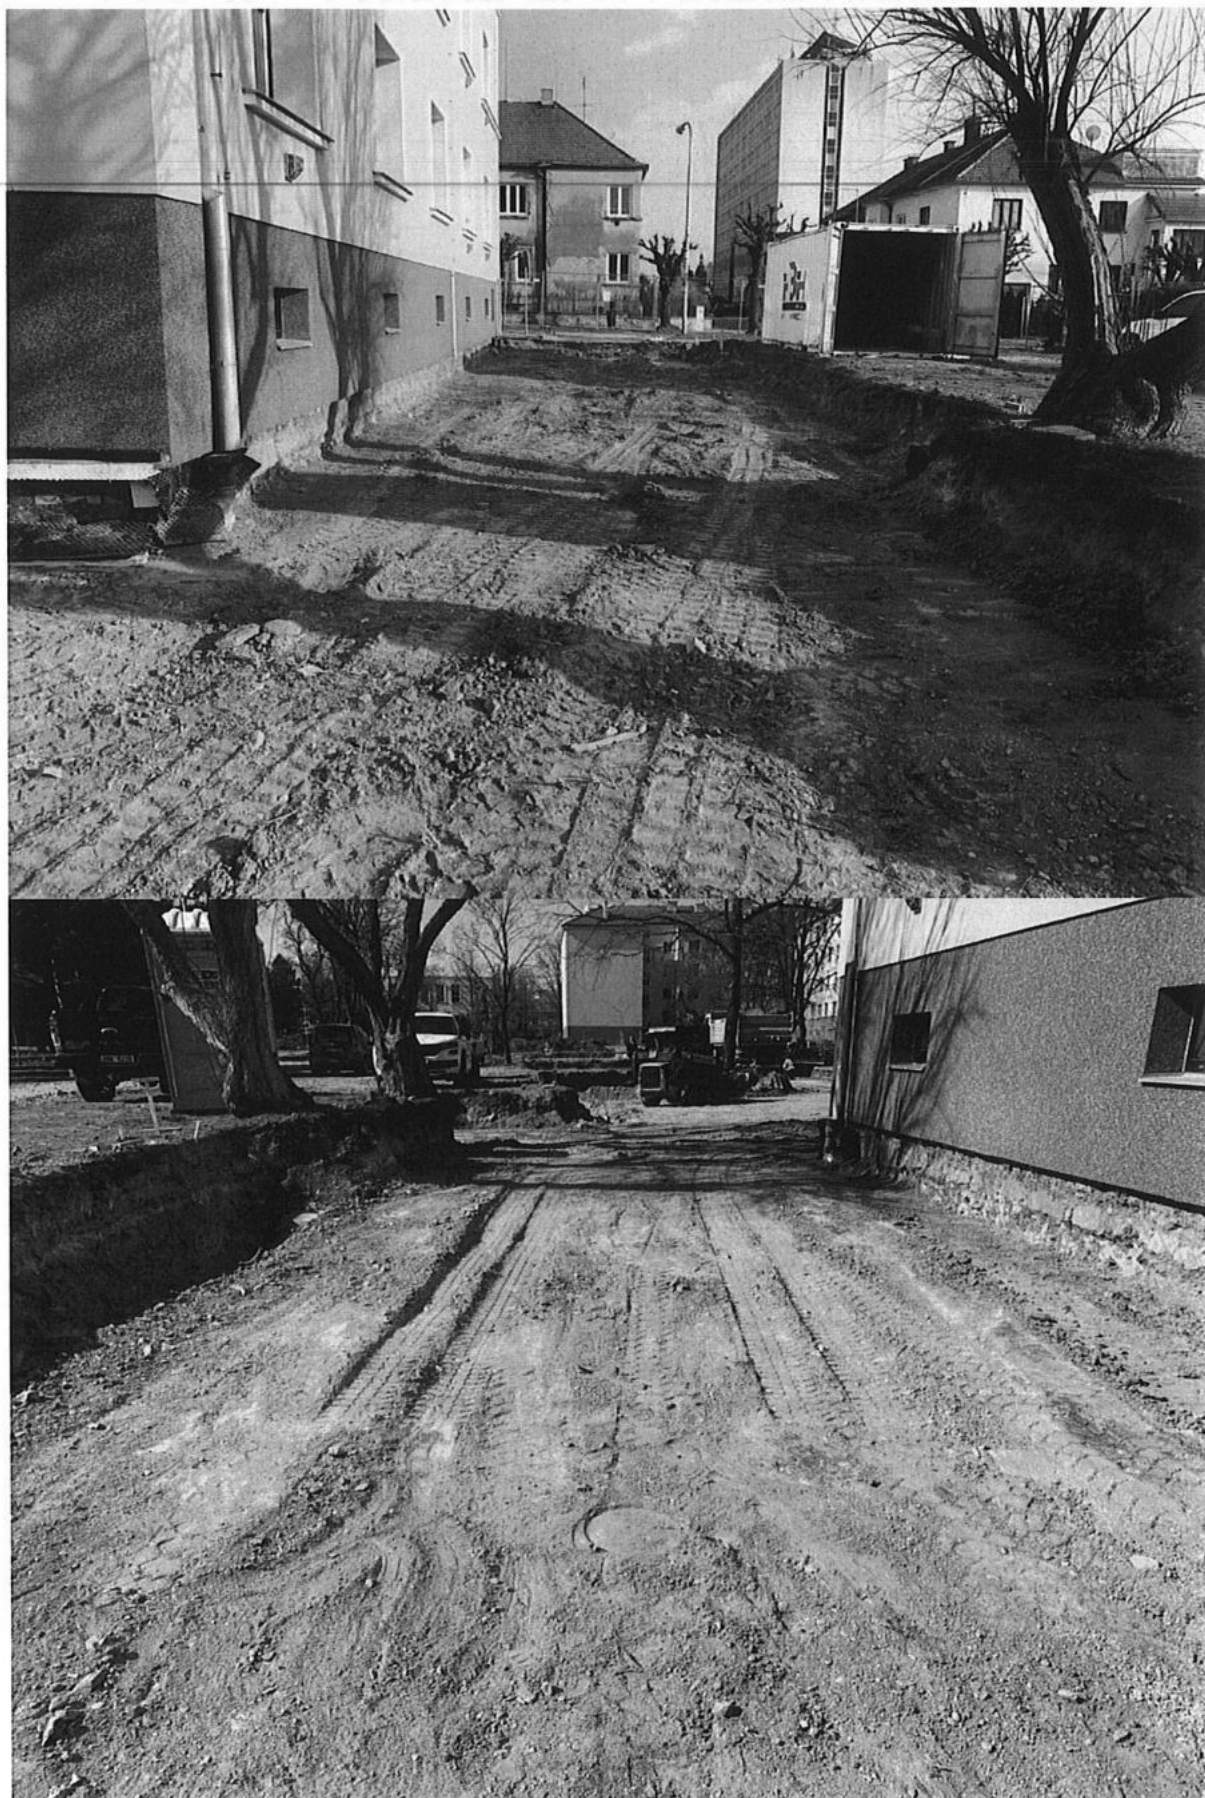



Protokol o zkoušce č. 0821 V211003/K31

Naše značka: 122/22/Kr


Strana: 1/2

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel:	FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	Objednávka:
Místo:	Znojmo	Účast: Ing. Hromek
Objekt:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, komunikace	Vrstva: pláň
Skladba:	sanace pláně 30cm ŠD 0/125	Datum: 25.03.2022
Zkoušel:	J. Chytrý	Umístění : mezi řezem 8 a 9
Zkouška:	1	

Normy: ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa

Čtení indikátoru (mm)	Kontaktní napětí p (MPa)	Zatlačení desky y (mm)
0,00	0,00	0,00
0,34	0,08	0,68
0,76	0,16	1,52
1,21	0,24	2,42
1,67	0,32	3,34
2,02	0,40	4,04
2,26	0,45	4,52
2,48	0,50	4,96
2,30	0,25	4,60
2,02	0,12	4,04
1,27	0,00	2,54
1,56	0,08	3,12
1,78	0,16	3,56
1,98	0,24	3,96
2,17	0,32	4,34
2,35	0,40	4,70
2,46	0,45	4,92

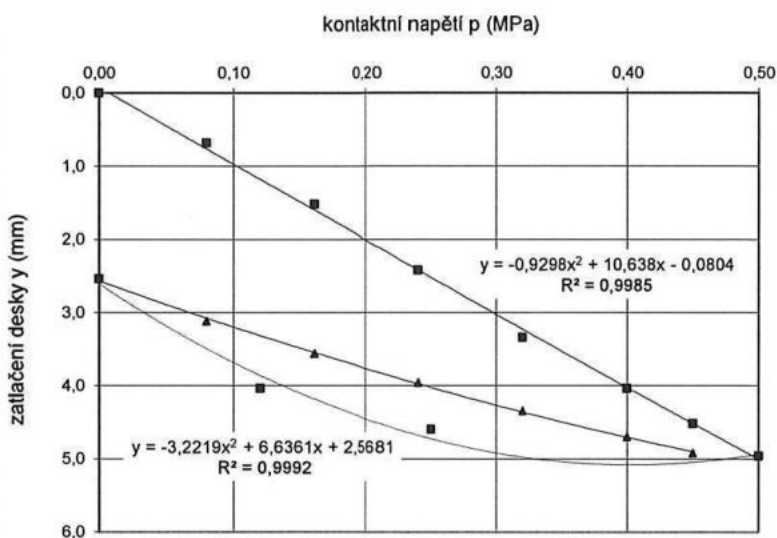
Výsledky zkoušky

Nejistota ±

Počítané veličiny	Zatěžovací cyklus	Dílčí modul přetvárnosti, $E_{def,1}$ (MPa)	22,1	1,1
označení	rozměr	první ($E_{def,1}$)	druhý ($E_{def,2}$)	
q_{max}	MPa	0,500	0,450	
a_1	mm · MPa ⁻¹	10,638	6,636	
a_2	mm · MPa ⁻¹	-0,930	-3,222	
E_{def}	MPa	22,1	43,4	
$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	2,0		

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin". Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána únosnost modulem přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2 platí min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,0$ až 4,0 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou uvedeny "Orientační převody hodnot $E_{def,2}$ pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je uvedena v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem $D \geq 95$ až 103 nebo $ID \geq 0,80$ až 0,90). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr:	Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše.	Výsledek	Hodnocení
	Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění $E_{def,2} / E_{def,1}$	2,0	
	Modul přetvárnosti $E_{def,2}$ (MPa)	43,4	

Poznámka: V - vyhovuje N - nevyhovuje L - limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2.1 ILAC - G8: 09/2019).

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Data dodány zákazníkem jsou kurzívou. Laboratoř odmítá odpovědnost za data dodaná zákazníkem.

Výtisk číslo:

1 2 3 4

Protokol přezkoumal:

Ing. Vlastimil Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:

Mgr. Jiří Krésa

Datum vystavení protokolu:

28.03.2022



Protokol o zkoušce č. 0821 V211003/K31

Naše značka: 122/22/Kr


Strana: 2/2

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel:	FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	Objednávka:	
Místo:	Znojmo	Účast:	Ing. Hromek
Objekt:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, komunikace	Vrstva:	pláň
Skladba:	sanace pláň 30cm ŠD 0/125	Datum:	25.03.2022
Zkoušel:	J. Chytrý	Umístění :	mezi řezem 9 a 10
Zkouška:	2		

Normy: ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa

Čtení indikátoru (mm)	Kontaktní napětí p (MPa)	Zatlačení desky y (mm)
0,00	0,00	0,00
0,28	0,08	0,56
0,72	0,16	1,44
1,17	0,24	2,34
1,59	0,32	3,18
1,91	0,40	3,82
2,19	0,45	4,38
2,41	0,50	4,82
2,27	0,25	4,54
2,02	0,12	4,04
1,43	0,00	2,86
1,60	0,08	3,20
1,77	0,16	3,54
1,94	0,24	3,88
2,12	0,32	4,24
2,29	0,40	4,58
2,41	0,45	4,82

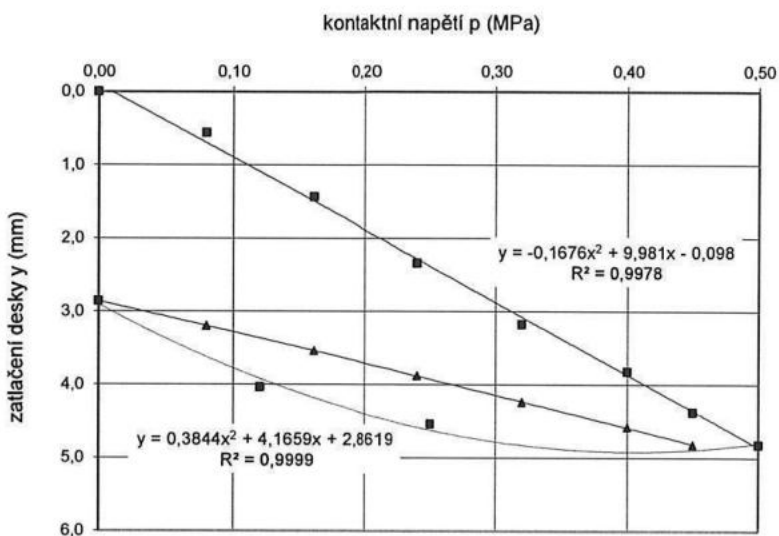
Výsledky zkoušky

Nejistota ±

Výsledky zkoušky				nejistota ±		
Počítané veličiny		Zatěžovací cyklus		Dílčí modul přetvárnosti, $E_{def,1}$ (MPa)	22,7	1,1
označení	rozměr	první ($E_{def,1}$)	druhý ($E_{def,2}$)	Dílčí modul přetvárnosti, $E_{def,2}$ (MPa)	51,9	2,6
q_{max}	MPa	0,500	0,450	Koeficient zhutnění $E_{def,2}/E_{def,1}$	2,3	0,18
a_1	mm . MPa ⁻¹	9,981	4,166	Vlhkost w (%) z místa měření		
a_2	mm . MPa ⁻¹	-0,168	0,384	U: ± 5 % rel. modul přetvárnosti, ± 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % .		
E_{def}	MPa	22,7	51,9			
$E_{def,2}/E_{def,1}$	-	2,3				

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin". Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána únosnost modulem přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2 platí min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,0$ až 4,0 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou uvedeny "Orientační převody hodnot $E_{def,2}$ pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je uvedena v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem $D \geq 95$ až 103 nebo $ID \geq 0,80$ až 0,90). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr:	Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše.	Výsledek	Hodnocení
	Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění $E_{def,2}/E_{def,1}$	2,3	
	Modul přetvárnosti $E_{def,2}$ (MPa)	51,9	

Poznámka: V - vyhovuje N - nevyhovuje L - limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2.1 ILAC - G8: 09/2019).

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Data dodány zákazníkem jsou kurzívou. Laboratoř odmítá odpovědnost za data dodaná zákazníkem.

Výtisk číslo:

1 2 3 4

Protokol přezkoumal:

Ing. Vlastimil Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:

Mgr. Jiří Krása

Datum vystavení protokolu:

28.03.2022



Protokol o zkoušce č. 0821 V211003/K27

Naše značka: 99/22/Kr

Strana: 1/3

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel:	FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	Objednávka:
Místo:	Znojmo	Účast:
Objekt:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, komunikace	Vrstva:
Skladba:	původní materiál (rostlý terén)	Datum:
Zkoušel:	J. Chytrý	Umístění :
Zkouška:	1	mezi řezem 8 a 9

Normy: ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa

Čtení indikátoru (mm)	Kontaktní napětí p (MPa)	Zatlačení desky y (mm)	kontaktní napětí p (MPa)
0,00	0,00	0,00	
1,29	0,08	2,58	
3,59	0,16	7,18	
5,90	0,24	11,80	
8,20	0,32	16,40	
	0,40		
	0,45		
	0,50		
	0,25		
	0,12		
	0,00		
	0,08		
	0,16		
	0,24		
	0,32		
	0,40		
	0,45		

Výsledky zkoušky				Nejistota ±	
Počítané veličiny	Zatěžovací cyklus		Dílčí modul přetvárnosti, $E_{def,1}$ (MPa)	3,7	0,2
označení	rozměr	první ($E_{def,1}$)	druhý ($E_{def,2}$)	Dílčí modul přetvárnosti, $E_{def,2}$ (MPa)	
q_{max}	MPa	0,500	0,450	Koeficient zhutnění $E_{def,2}/E_{def,1}$	
a_1	mm · MPa ⁻¹	38,025	0,000	Vlhkost w (%) z místa měření	
a_2	mm · MPa ⁻¹	45,313	0,000	U: ± 5 % rel. modul přetvárnosti, ± 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 %.	
E_{def}	MPa	3,7			
$E_{def,2}/E_{def,1}$	-				

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin". Pro aktivní zónu a zemní plášť je předepsána únosnost modulem přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2 platí min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,0$ až 4,0 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou uvedeny "Orientační převody hodnot $E_{def,2}$ pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je uvedena v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem $D \geq 95$ až 103 nebo $ID \geq 0,80$ až 0,90). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr:	Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše.	Výsledek	Hodnocení
	Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění $E_{def,2}/E_{def,1}$	Zkouška přerušena pro neúnosné podloží	
	Modul přetvárnosti $E_{def,2}$ (MPa)		

Poznámka: V - vyhovuje N - nevyhovuje L - limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2.1 ILAC - G8: 09/2019).

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Data dodány zákazníkem jsou kurzívou. Laboratoř odmítá odpovědnost za data dodaná zákazníkem.

Výtisk číslo:

1 2 3 4

Protokol přezkoumal:

Ing. Vlastimil Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:

Mgr. Jiří Krása

Datum vystavení protokolu:

22.03.2022



Protokol o zkoušce č. 0821 V211003/K27

Naše značka: 99/22/Kr


Strana: 2/3

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel:	FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	Objednávka:	
Místo:	Znojmo	Účast:	Ing. Hromek
Objekt:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, komunikace	Vrstva:	pláň
Skladba:	původní materiál (rostlý terén)	Datum:	21.03.2022
Zkoušel:	J. Chytrý	Umístění :	mezi řezem 9 a 10
Zkouška:	2		

Normy: ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa

Čtení indikátoru (mm)	Kontaktní napětí p (MPa)	Zatlačení desky y (mm)
0,00	0,00	0,00
0,91	0,08	1,82
2,12	0,16	4,24
3,50	0,24	7,00
5,35	0,32	10,70
9,00	0,40	18,00
	0,45	
	0,50	
	0,25	
	0,12	
	0,00	
	0,08	
	0,16	
	0,24	
	0,32	
	0,40	
	0,45	

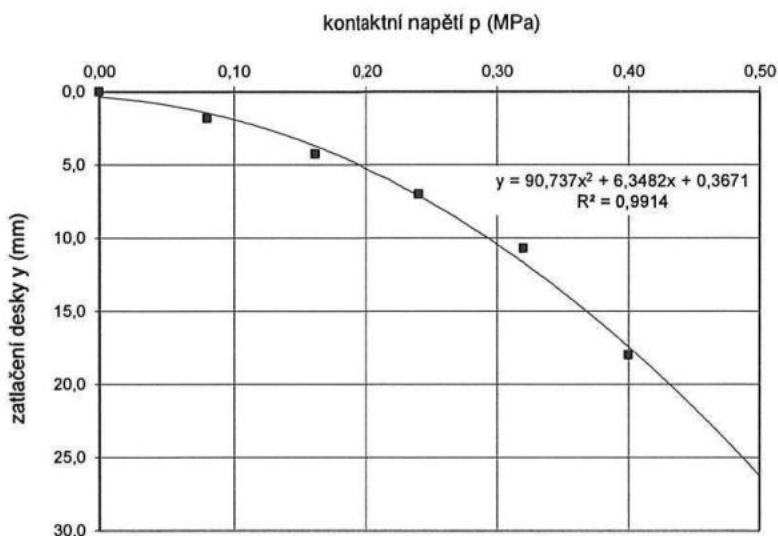
Výsledky zkoušky

Nejistota ±

Počítané veličiny	Zatěžovací cyklus			Nejistota ±	
označení	rozměr	první ($E_{def,1}$)	druhý ($E_{def,2}$)	Dílčí modul přetvárnosti, $E_{def,1}$ (MPa)	4,4
q_{max}	MPa	0,500	0,450	Dílčí modul přetvárnosti, $E_{def,2}$ (MPa)	
a_1	mm · MPa ⁻¹	6,348	0,000	Koeficient zhutnění $E_{def,2} / E_{def,1}$	
a_2	mm · MPa ⁻¹	90,737	0,000	Vlhkost w (%) z místa měření	
E_{def}	MPa	4,4		U: ± 5 % rel. modul přetvárnosti, ± 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 %.	
$E_{def,2} / E_{def,1}$	-				

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin". Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána únosnost modulem přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2 platí min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,0$ až 4,0 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou uvedeny "Orientační převody hodnot $E_{def,2}$ pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je uvedena v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem $D \geq 95$ až 103 nebo $ID \geq 0,80$ až 0,90). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr:	Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše.	Výsledek	Hodnocení
	Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění $E_{def,2} / E_{def,1}$	Zkouška přerušena pro neúnosné podloží	
	Modul přetvárnosti $E_{def,2}$ (MPa)		

Poznámka: V - vyhovuje N - nevyhovuje L - limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2.1 ILAC - G8: 09/2019).

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Data dodány zákazníkem jsou kurzívou. Laboratoř odmítá odpovědnost za data dodaná zákazníkem.

Výtisk číslo:

1 2 3 4

Protokol přezkoumal:

Ing. Vlastimil Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:

Mgr. Jiří Krésa

Datum vystavení protokolu:

22.03.2022



Protokol o zkoušce č. 0821 V211003/K27

Naše značka: 99/22/Kr


Strana: 3/3

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel:	FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno	Objednávka:
Místo:	Znojmo	Účast: Ing. Hromek
Objekt:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, parkoviště	Vrstva: pláň
Skladba:	původní materiál (rostlý terén)	Datum: 21.03.2022
Zkoušel:	J. Chytrý	Umístění : v řezu 9
Zkouška:	3	

Normy: ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa

Čtení indikátoru (mm)	Kontaktní napětí p (MPa)	Zatlačení desky y (mm)
0,00	0,00	0,00
0,23	0,08	0,46
0,50	0,16	1,00
0,72	0,24	1,44
0,93	0,32	1,86
1,15	0,40	2,30
1,29	0,45	2,58
1,43	0,50	2,86
1,29	0,25	2,58
1,08	0,12	2,16
0,64	0,00	1,28
0,78	0,08	1,56
0,92	0,16	1,84
1,05	0,24	2,10
1,19	0,32	2,38
1,31	0,40	2,62
1,39	0,45	2,78

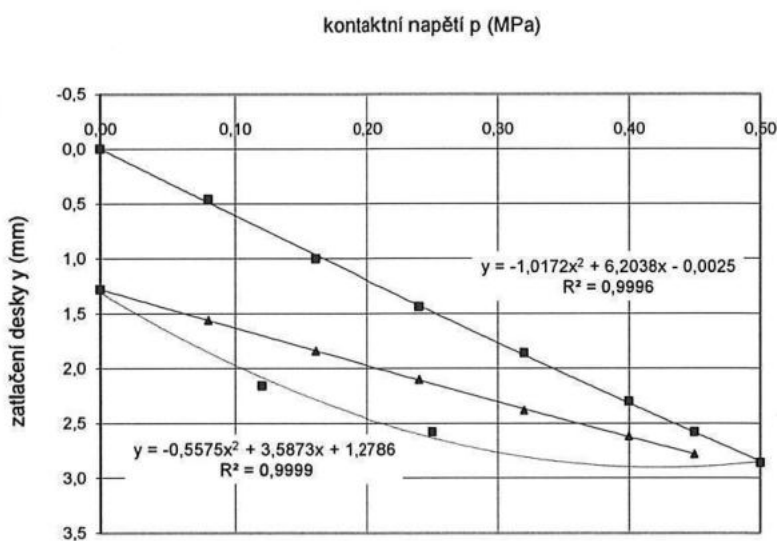
Výsledky zkoušky

Nejistota ±

Počítané veličiny	Zatěžovací cyklus		Dílčí modul přetvárnosti, $E_{def,1}$ (MPa)	39,5	2,0
označení	rozměr	první ($E_{def,1}$)	druhý ($E_{def,2}$)	Dílčí modul přetvárnosti, $E_{def,2}$ (MPa)	67,4
q_{max}	MPa	0,500	0,450	Koeficient zhutnění $E_{def,2}/E_{def,1}$	1,7
a_1	mm · MPa ⁻¹	6,204	3,587	Vlhkost w (%) z místa měření	0,14
a_2	mm · MPa ⁻¹	-1,017	-0,557	U: ± 5 % rel. modul přetvárnosti, ± 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 %.	
E_{def}	MPa	39,5	67,4		
$E_{def,2}/E_{def,1}$	-	1,7			

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin". Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána únosnost modulem přetvárnosti $E_{def,2} \geq 45$ MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2 platí min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,0$ až 4,0 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou uvedeny "Orientační převody hodnot $E_{def,2}$ pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je uvedena v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem $D \geq 95$ až 103 nebo $ID \geq 0,80$ až 0,90). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr:	Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše.	Výsledek	Hodnocení
	Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění $E_{def,2}/E_{def,1}$	1,7	
	Modul přetvárnosti $E_{def,2}$ (MPa)	67,4	

Poznámka: V - vyhovuje N - nevyhovuje L - limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2.1 ILAC - G8: 09/2019).

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušební místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Data dodány zákazníkem jsou kurzívou. Laboratoř odmítá odpovědnost za data dodaná zákazníkem.

Výtisk číslo:

1 2 3 4

Protokol přezkoumal:

Ing. Vlastimil Suchyňa

Protokol vystavil a schválil:

Mgr. Jiří Krésa

Datum vystavení protokolu:

22.03.2022



**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 5**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Odtěžení skály v ploše parkoviště F2.			
Odůvodnění změny: Při provádění vykopávek pro parkoviště F2 zhotovitel narazil na skalní masiv, který zasahoval do tělesa budoucí skladby parkoviště F2. Při zachování výšek komunikace dle původní PD by bylo nutné tento skalní masiv odtěžit ve velkém rozsahu. Z důvodu tohoto zjištění zhotovitel navrhl AD výškovou změnu parkoviště F2, na kterou AD přistoupil viz. příloha č. 2 změna projektové dokumentace. I přes toto řešení musela být malá část skalního masivu vybourána.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	65 173,80,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	65 173,80,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	13 686,50,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	78 860,3,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	1 týden	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	1 týden	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	29.3.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	29.3.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	29.3.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	29.3.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	29.3.2022	
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		
	č.2 - Projektová dokumentace změny		
	č.3 - Fotodokumentace		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:		ZL - 05 ZL 05 - Odtěžení skály v ploše parkoviště F2	
Rozpočet:		1 ZL 05 - Odtěžení skály v ploše parkoviště F2	
Objednatel:		Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:		FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			65 173,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 173,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		65 173,80 CZK
Základní DPH	21 %		13 686,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			78 860,30 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			65 173,80	100
Cena celkem					65 173,80	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 05	ZL 05 - Odtěžení skály v ploše parkoviště F2
R:	1	ZL 05 - Odtěžení skály v ploše parkoviště F2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				65 173,80
1	131401111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ	m3	57,00000	528,00	30 096,00
		Výpočet objemu na základě 3Dscanu lokality : 57		57,00000		
		Hloubka odstranění 30 od úpraveného terénu :				
2	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	57,00000	306,50	17 470,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 57,00000		57,00000		
3	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku	m3	57,00000	308,90	17 607,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 57,00000		57,00000		

UT=303,35

PT=UT=303,21

ing. arch. Michal Říčný

ZNOJMO

ŠEK PLOCHY PARKOVIŠTĚ

měřítko
1:100

příl. č. paré

5
ZL. ~~1~~. - Příloha č. 3 Fotodokumentace



**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 6**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Nebudou realizovány okapní chodníčky vč. drenážního potrubí.			
Odůvodnění změny: AD společně s TDI a objednatelem rozhodli, že nebudou realizovány okapní chodníčky vč. drenáže v rozsahu dle přílohy č. 2 projektová dokumentace změny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	AD, TDI, a objednatel město Znojmo	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-548 171,84,- Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-548 171,84,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-115 116,09,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-663 287,93,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:	bez dopadu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	3.5.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	3.5.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	3.5.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	3.5.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	3.5.2022	
přílohy	Přílohy:		
	č. 1 - Rozpočet změny		
	č. 2 - Projektová dokumentace změny – situace rozsahu		
	č. 3 - Projektová dokumentace změny – detail K1		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt:	ZL - 06	ZL 06 - Neprovádění okapního chodníčku vč. drenáží
Rozpočet:	1	ZL 06 - Neprovádění okapního chodníčku vč. drenáží
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-548 171,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-548 171,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-548 171,84 CZK
Základní DPH	21 %	-115 116,09 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-663 287,93 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Popis objektu: ZL - 06 - ZL 06 - Neprovádění okapního chodníčku vč. drenáží
Popis rozpočtu: 1 - ZL 06 - Neprovádění okapního chodníčku vč. drenáží

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-548 171,84	100
Cena celkem					-548 171,84	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 06	ZL 06 - Nprovádění okapního chodníčku vč. drenáží
R:	1	ZL 06 - Nprovádění okapního chodníčku vč. drenáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-548 171,84
1	591 05 *S7ad*	Dlažba z žulové kostky - kompletní skladba okapový chodník	m2	-288,50000	2 656,67	-766 449,30

;ve skladbě

;* žulová kostka 50/50/50 mm tl.50 mm- mozaika spára 20mm

;* spáry vyplněny drtí

;* lože dlažby z drti fr.4-8mm tl.40 mm

;* makadam + drenážní potrubí DN 100mm tl.412-442 mm

;* betonové lože C12/15 tl.100 - 130 mm

;* geotextilie

;* zhutněná pláň

Dle SoD : -288,5

-288,50000

2	591 05 *S7ad* - ak	Dlažba z žulové kostky - kompletní skladba okapový chodník aktualizace 5.4.2022	m2	86,00000	2 538,11	218 277,46
---	--------------------	---	----	----------	----------	------------

;ve skladbě

;* žulová kostka 50/50/50 mm tl.50 mm- mozaika spára 20mm

;* spáry vyplněny drtí

;* lože dlažby z drti fr.4-8mm tl.40 mm

;* makadam + drenážní potrubí DN 100mm tl.512-572 mm


;* nopová fólie

;* geotextilie

;* zhutněná pláň

Skutečnost : 172*0,5

86,00000

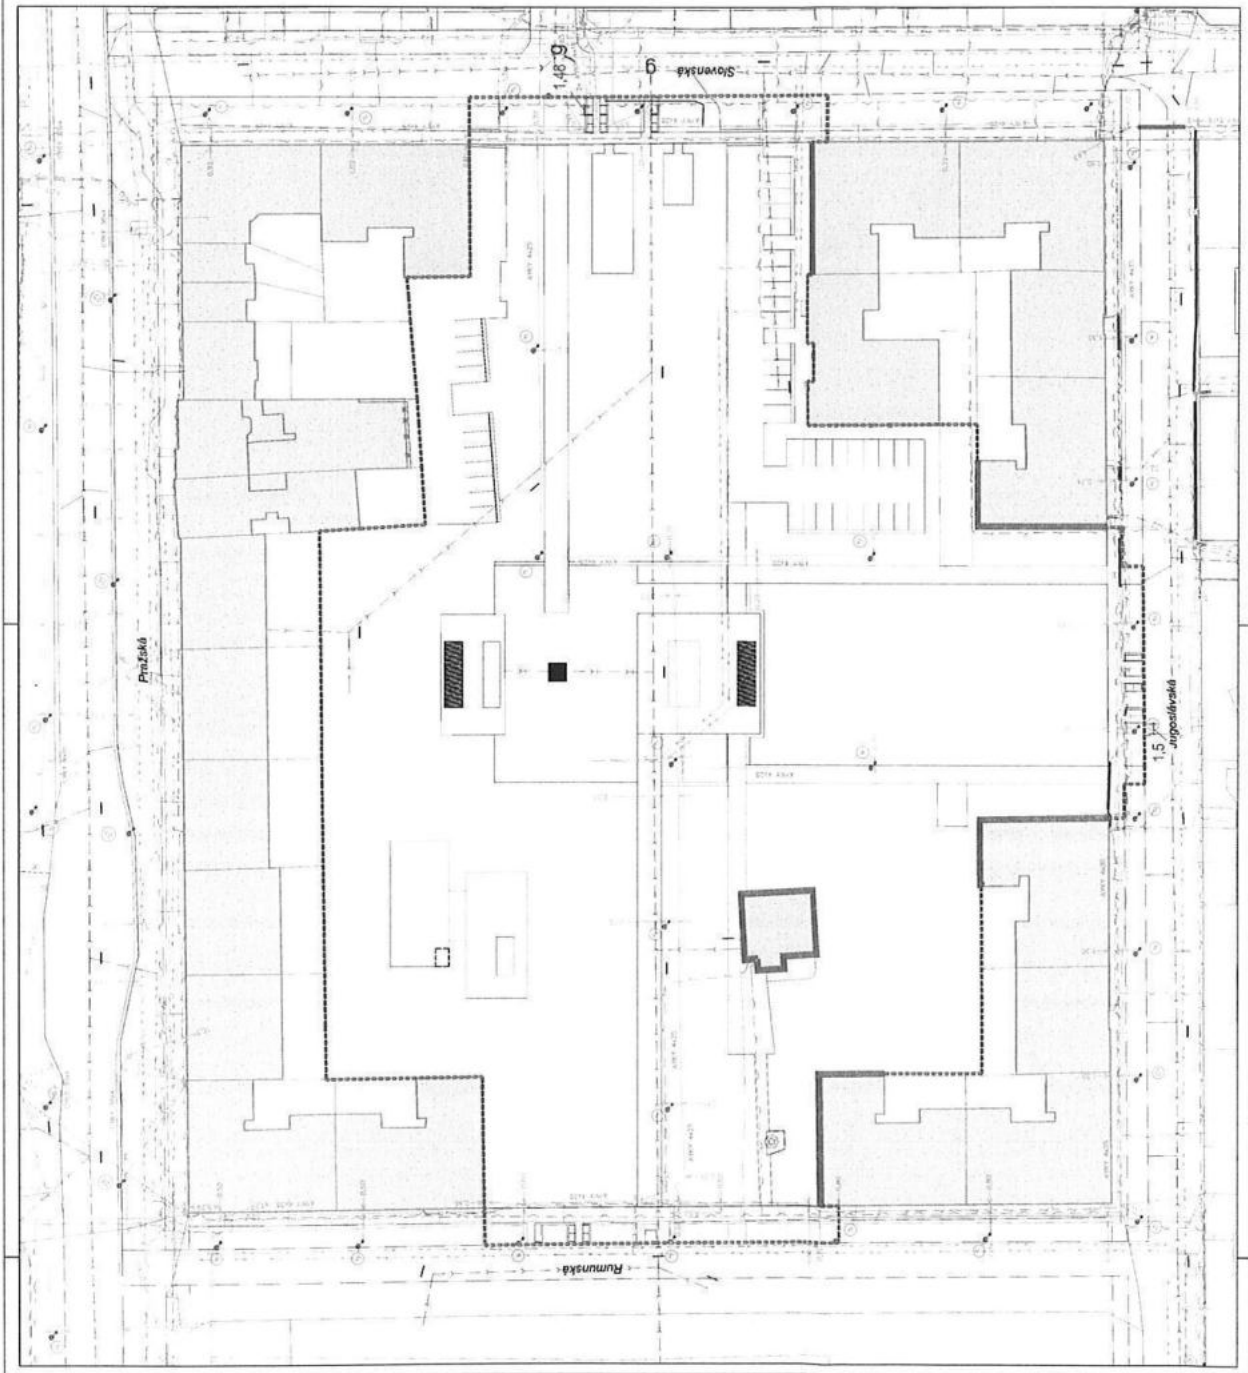

LEGENDA STAVACÍCH SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

	GAZOVÁ SÍŤ VODNÝ SÍŤ
	CESTNÍ ZÁSTĚBNÝ PRŮMYŠLENÝ KABEL
	CESTNÍ ZÁSTĚBNÝ PRŮMYŠLENÝ KABEL
	CESTNÍ ZÁSTĚBNÝ PRŮMYŠLENÝ KABEL
	CESTNÍ ZÁSTĚBNÝ PRŮMYŠLENÝ KABEL
	CESTNÍ ZÁSTĚBNÝ PRŮMYŠLENÝ KABEL
	CESTNÍ ZÁSTĚBNÝ PRŮMYŠLENÝ KABEL
	CESTNÍ ZÁSTĚBNÝ PRŮMYŠLENÝ KABEL
	CESTNÍ ZÁSTĚBNÝ PRŮMYŠLENÝ KABEL
	CESTNÍ ZÁSTĚBNÝ PRŮMYŠLENÝ KABEL

	VAKUACIČNÍ JEDNOTKA
	VAK. VODKOVÉ BND
	KABEL E.ON. 10 kV
	KABEL EPC
	KABEL T. MOKET

LEGENDA RÚBNÝCH SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

	VAKUACIČNÍ JEDNOTKA
	VAK. VODKOVÉ BND
	KABEL E.ON. 10 kV
	KABEL EPC
	KABEL T. MOKET

CELKOVÝ DELKA - OBRUBNÍKY: 172 m


autor: Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. arch. Michal Růžný
 spolupracovník: Ing. arch. Nina Kukušková
 lokalita: Ing. arch. Nina Kukušková, Bc. Jana Kruží
 záměr: Záměr
 název: REKONSTRUKCE LOKALITY KOLONIA, ZNOJMO
 datum: 02.2022
 měřítko: 1:500
 příl. č.: par. 1

DETAIL K1:

DETAIL PŘECHODU TRÁVNÍK x OKAPOVÝ CHODNÍK

- REVIZE

K1

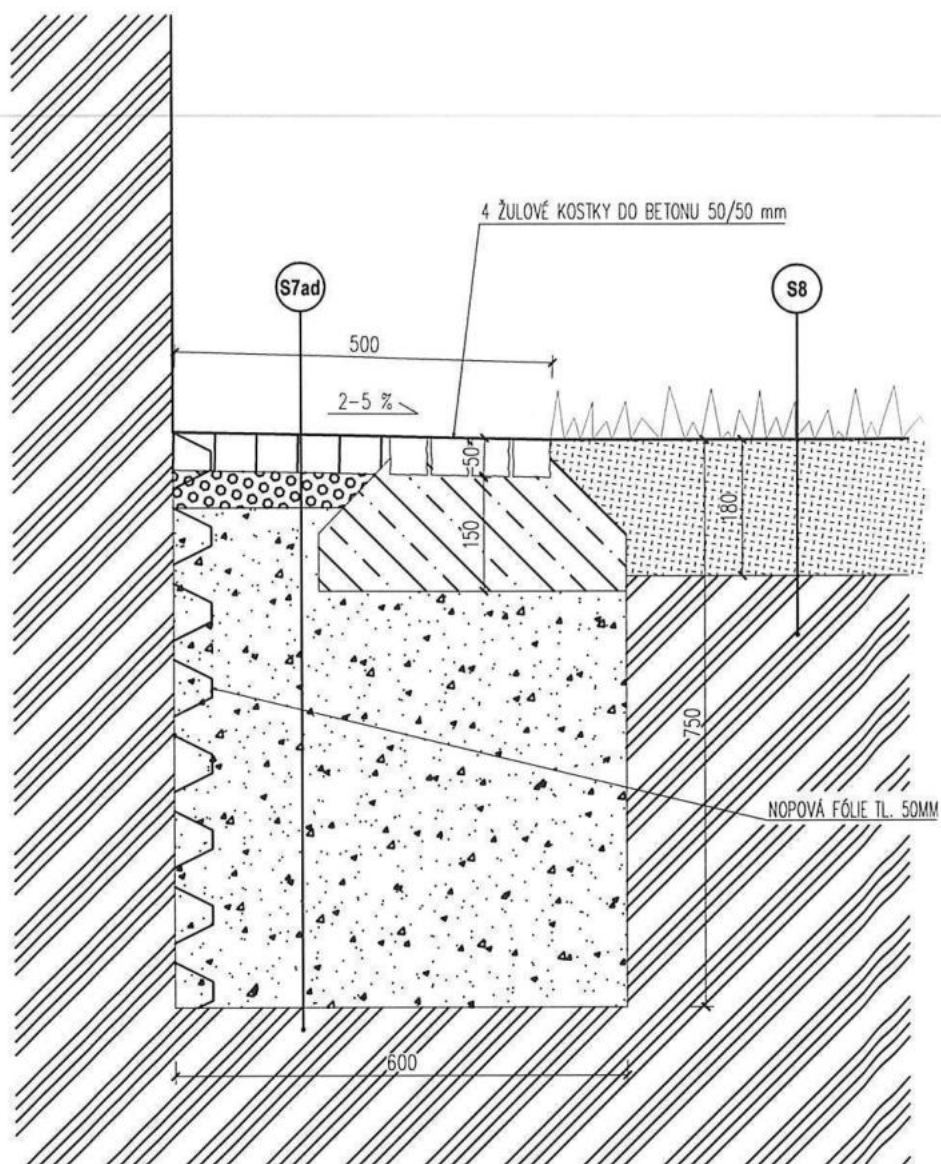

LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  TRÁVNÍK
-  ORNICE
-  ŽULOVÁ KOSTKA 50/50/50 mm
-  KAMENIVO FRAKCE 4-8 mm
-  MAKADAM
-  BETONOVÉ LOŽE C12/15
-  STÁVAJÍCÍ ZEMINA

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 7**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Doplnění rozsahu prováděných obrub u komunikací v lokalitě Kolonka, dle skutečnosti.			
Odůvodnění změny: Na základě provádění objednávek materiálů zhotovitel zjistil nesrovnalost v rozsahu prováděných obrub dle PD a položkového rozpočtu. Na základě tohoto nesouladu vypracoval AD pro upřesnění PD skutečného provádění obrub viz. příloha č. 2 a provedl ocenění této skutečnosti viz. příloha č. 1.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-304 266,27,- Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-304 266,27,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-63 895,92,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-368 162,19,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	1 měsíc	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	1 měsíc	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	3.5.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	3.5.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	3.5.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	3.5.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	3.5.2022	
přílohy	Přílohy:		
	č. 1 - Rozpočet změny		
	č. 2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:	ZL - 07	ZL 07 - Skutečná výměra betonových a ocelových obrub	
Rozpočet:	1	ZL 07 - Skutečná výměra betonových a ocelových obrub	
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881	
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			255 436,12
PSV			-559 702,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-304 266,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-304 266,27 CZK
Základní DPH	21 %		-63 895,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-368 162,19 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Popis objektu: ZL - 07 - ZL 07 - Skutečná výměra betonových a ocelových obrub
Popis rozpočtu: 1 - ZL 07 - Skutečná výměra betonových a ocelových obrub

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			239 986,65	-79
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 449,47	-5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-559 702,39	184
Cena celkem					-304 266,27	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 07	ZL 07 - Skutečná výměra betonových a ocelových obrub
R:	1	ZL 07 - Skutečná výměra betonových a ocelových obrub

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				239 986,65
1	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	522,70000	404,50	211 432,15

Chodníkový 10 :

Rumunská chodník : 2,6+36,7- 120,30000

2,1+25,45+3,4+3,4+29,9+2,5+18,45

Rumunská stání pro popelnice : 22,10000

1,5+1,3+6,3+3,9+6,3+1,3+1,5

Mezisoučet 142,40000

Jugoslávská chodník : 72,90000

5,65+2,45+5,65+3,6+3,6+12,65+16,2+3,6+4,2+6,7+1,9+6,7

Jugoslávská stání pro popelnice : 26,60000

0,9+0,9+2,6+4,9+4,9+2,6+4,9+4,9

Mezisoučet 99,50000

Slovenská chodník : 98,70000

36,8+7,35+5,75+5,75+6,65+1,3+8,9+4,6+11,15+1,75+8,7

Slovenská stání pro popelnice I. : 20,30000

0,9+1,3+3,15+6,5+3,15+1,3+0,9+0,9+1,3+0,9

Slovenská stání pro popelnice II. : 14,60000

0,9+1,3+3,15+3,9+3,15+1,3+0,9

Mezisoučet 133,60000

Záhonový 10 :

Workout : 1,65+1,75+8,5+5+8,5+1,75+1,65 28,80000

Dětské Hřiště I. : 21+9,8+4,3+8,4+9,8 53,30000

Dětské Hřiště II. : 21+10,2-1,5+3,1+9,6+10,2-1,5 51,10000

Mezisoučet 133,20000

Přípočet dle poslední situace výkresů popelnicových stání : 14 14,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 449,47
2	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	135,66444	113,88	15 449,47

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				239 986,65
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

3	917411111RT5	Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože bet C12/15 včetně kamen. obrubníku	m	9,55000	1 786,67	17 062,70
---	--------------	--	---	---------	----------	-----------

Dle SoD : -436

-436,00000

Dle změny AD z 1.4.2022 :

Kamenné obruby : 110,6+334,95

445,55000

4	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,48750	4 619,82	11 491,80
		9,95*0,25		2,48750		

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-559 702,39
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--------------------

5	76701 E4	Ocelová pásovina vč. podbetonování a kotvení ocel. pracnami	m	-329,51000	1 698,59	-559 702,39
---	----------	---	---	------------	----------	-------------

Dle SoD : -999,36

-999,36000

Mezisoučet

-999,36000

Dle změny od AD ze dne 1.4.2022 :

Petangue : 19,95*2+6,9*2-1,9-2,2+2+14

65,60000

česaný beton nad petangue : 69,85+7,85+4+7,85+69,85-1,95

157,45000

česaný beton v ploše parku : 15,1+15,1+3

33,20000

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 07	ZL 07 - Skutečná výměra betonových a ocelových obrub
R:	1	ZL 07 - Skutečná výměra betonových a ocelových obrub

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mlat u delší kamenné zídky : 33+22,95		55,95000		
		Mlat u kratší opěrné zídky : 49,9+24,1+32,5		106,50000		
		Mlat k Zuš : 45,05+7,75+14,1-2+18,45+5,15+3		91,50000		
		česaný beton k ulici Rumunská : 70,75+70,75+8,05+4+8,05-1,95		159,65000		
		Mezisoučet		669,85000		

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 8**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo			
Objekt:	SO 01 – Stavební část			
Objednatel:	Město Znojmo			
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH			
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.			
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.			
Popis změny: Doplnění rozsahu chybějících výkopů pro osazení jímky technologie vodních prvků.				
Odůvodnění změny: Před zahájením výkopových prací pro jímku technologie vodních prvků se zhotovitel domlouval na způsobu provedení výkopu, jelikož nedohledal výkres zemních prací. Na základě tohoto zjistil, že takový výkres neexistuje a tento objem prací není ani zahrnut v položkovém rozpočtu stavby. Na základě zaslaného rozboru podložní zeminy rozhodl TDS o provedení zásypu z tohoto materiálu. Zhotovitel i tak daný materiál pro zásyp nedoporučuje a v případě reklamace z důvodů sedání nebude brát na toto zřetel.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5	X	
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
		dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		280 542,26,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		280 542,26,- Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	58 913,87,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		339 456,13,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termí ny	Termín realizace změny:	14 dní		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	14 dní		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		20.4.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		20.4.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		20.4.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		20.4.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		20.4.2022	
přílohy	Přílohy:			
	č.1 - Rozpočet změny			
	č.2 - Projektová dokumentace změny			
	č.3 - Rozbor podložní zeminy			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Objekt: ZL - 08 ZL 08 - Výkopy pro instalaci šachty technologie vodního prvku

Rozpočet: 1 ZL 08 - Výkopy pro instalaci šachty technologie vodního prvku

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			280 542,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			280 542,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	280 542,26 CZK
Základní DPH	21 %	58 913,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 339 456,13 CZK

v BRNĚ

dne _____

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 08 - ZL 08 - Výkopy pro instalaci šachty technologie vodního prvku

Popis rozpočtu: 1 - ZL 08 - Výkopy pro instalaci šachty technologie vodního prvku

Rekapitulace dílů




Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			264 095,45	94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 446,81	6
Cena celkem					280 542,26	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 08	ZL 08 - Výkopy pro instalaci šachty technologie vodního prvku
R:	1	ZL 08 - Výkopy pro instalaci šachty technologie vodního prvku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				264 095,45
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl. 250 mm : 169,3*0,25	m3	42,32500 42,33000	229,06	9 694,96
2	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	240,00000	171,50	41 160,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m $((80,25+39,95)/2)*1,5$	m3	90,15000 90,15000	133,50	12 035,03
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m $((39,95+26,5)/2)*0,6$	m3	19,93500 19,93500	213,00	4 246,16
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	273,11000	130,32	35 591,70
		Jáma : 240		240,00000		
		Rýha : 33,11		33,11000		
6	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl vč. poplatku Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 273,11000	m3	273,11000 273,11000	308,90	84 363,68
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu $240-(11*3)$ 33,11-10,9263	m3	229,18370 207,00000 22,18000	235,60	53 995,68
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 229,18370	m3	229,18370 229,18370	67,30	15 424,06
9	32201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro vsakovací	m3	33,11000	229,06	7 584,18
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 446,81
10	631571004R00	podsypaní a obsyp potrub ze štěrkopísku 0 - 4mm lože pod Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 33,11000*0,33	m3	10,92630 10,93000	1 505,25	16 446,81

ŘEZ A-A'

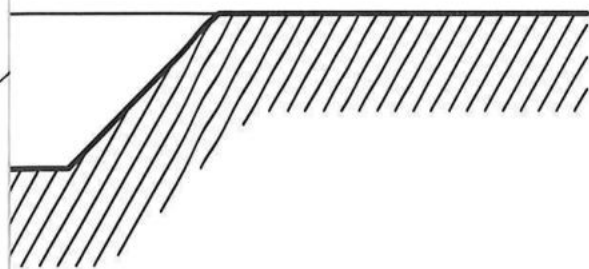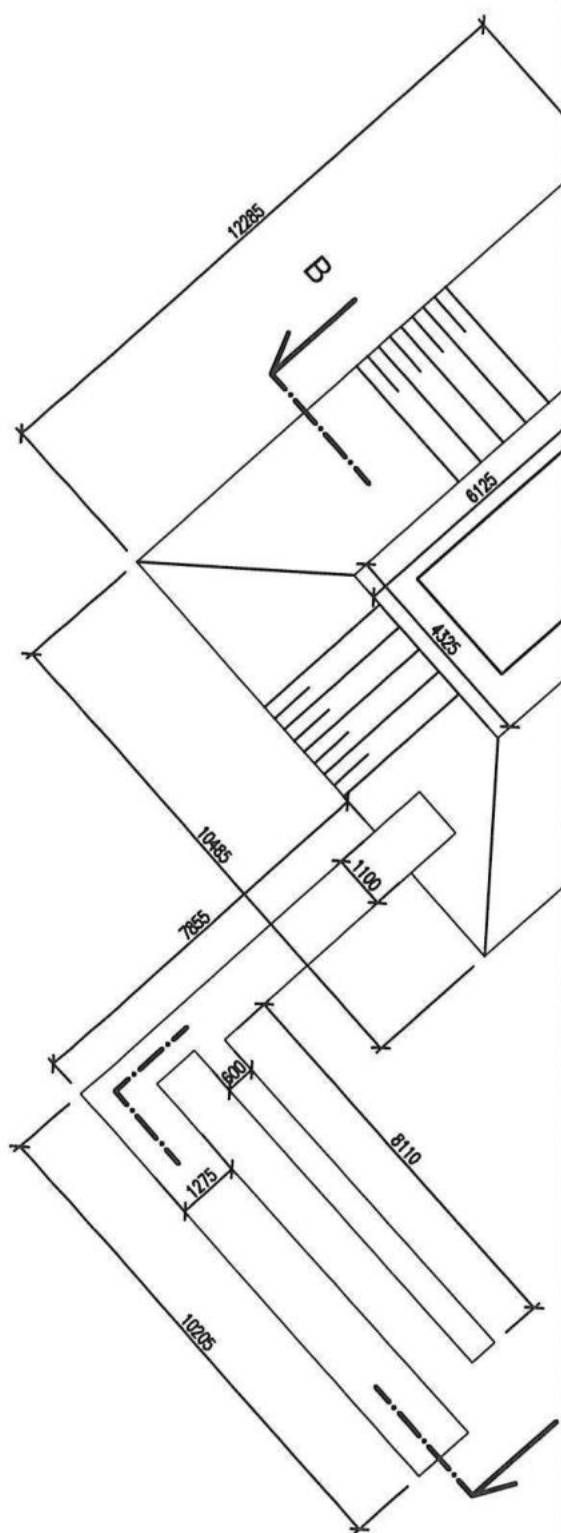

IAZAR HUDYMA


Protokol o zkoušce č. č: 0821 V221003/K04

Naše značka: 190/22/Kr
Strana: 1/1

ROZBOR PODLOŽNÍ ZEMINY - STANOVENÍ ZRNITOSTI, VLHKOSTI A KONZISTENČNÍCH MEZÍ

Objednatel:	FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno		
Název zakázky:	Znojmo, Rekonstrukce lokality Kolonka, materiál pro zásyp		
Číslo zakázky:	č: 0821 V221003/K04		
Odebral:	J. Chytrý	Datum:	05.04.2022
Zkoušel:	p. Bundálek, Ing. Navrátilová	Datum:	8.-14.4.2022

Stanovení zrnitosti zemín - ČSN EN ISO 17892-4, kap. 5.2., 5.3

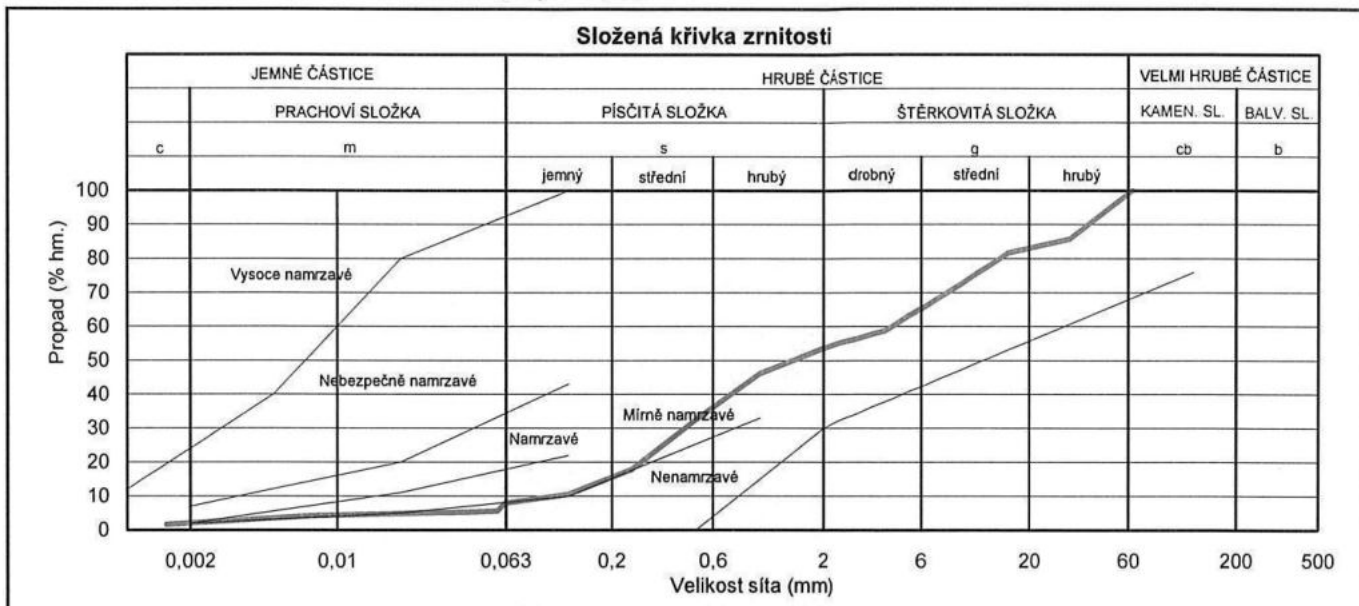

Nejistota měření: síťový rozbor 5,0 % rel. zrna < 2 mm, 7,0 % rel. zrna 2 až 8 mm, 9,0 % rel. zrna 11 až 32 mm, 6 % rel. vlhkost, 6 % rel. mez tekutosti, 5 % rel. mez plasticity, 7 % rel. číslo plasticity je uváděna jako rozšířená s koeficientem $k = 2$, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 %.

Sonda	Znojmo	
Staničení / jízdní pruh (km)	Kolonka	
Hloubka odběru (m)		
Číslo vzorku	22142	
Aktuální vlhkost (%)	ČSN EN ISO 17892-1	4,51
Mez tekutosti (%)	ČSN 72 1014:2005, met. A,B	-
Mez plasticity (%)	ČSN 72 1013:2005	-
Číslo plasticity	ČSN 73 6133	-
Konzistence	ČSN 73 6133	-
Namrzavost	ČSN 73 6133	mírně namrzavé
Klasifikace	ČSN 73 6133	S3-S-F
Klasifikace	ČSN EN ISO 14688-2	grSa
Vhodnost do aktivní zóny	TP 146	podmínečně vhodné
Vhodnost do zásypu	TP 146	vhodné

S3 S-F písek s příměsí jemnozrné zeminy

Vysvětlivky: P, L pravá, levá strana ZÚ, KÚ začátek, konec úseku DL délka úseku

Zkušební laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamena schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak, než celý.

Výtisk číslo: 1 2 3
Protokol vypracoval: Ing. Vlastimil Suchyňa
Protokol schválil: Mgr. Jiří Kréša - vedoucí laboratoře
Datum vystavení protokolu: 14.04.2022



**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 9**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Záměna plastové obetonované šachty za prefabrikát obsahující plastovou retenční nádrž splňující parametry původního řešení.			
Odůvodnění změny: Na základě ekonomického přístupu k realizaci díla zhotovitel objednateli navrhl záměnu obetonované plastové šachty pro technologii vodního prvků za levnější variantu prefabrikované atypické jímky obsahující plastovou retenční nádrž a splňující veškeré další původní parametry řešení.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		385 025,44,- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-609 567,72,- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-224 542,28,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-47 153,88,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-271 696,16,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:		bez dopadu
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez dopadu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		13.4.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		13.4.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		13.4.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		13.4.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		13.4.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt:	ZL - 09	ZL 09 - Záměna šachty monolitické za prefabrikovanou - technologie vodního prvku
Rozpočet:	1	ZL 09 - Záměna šachty monolitické za prefabrikovanou - technologie vodního prvku
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	
		IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. MLýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	
		IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-63 257,33
PSV			0,00
MON			-161 284,95
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-224 542,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-224 542,28 CZK
Základní DPH	21 %	-47 153,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-271 696,16 CZK

v ZNOJME

dne 13.4.2022

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO

IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

MAZAR HUDYMA

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 09	ZL 09 - Záměna šachty monolitické za prefabrikovanou - technologie vodního prvku
R:	1	ZL 09 - Záměna šachty monolitické za prefabrikovanou - technologie vodního prvku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-402 795,57
1	273 32-01	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění a výztuže č.v.10, 11,	m3	3,37500	10 570,50	35 675,44

základová deska pod prefajímku : (2,5*4,5)*0,3

3,38000

2	380 32-0	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 20/25 vč.výztuže a bednění, šachta č.v.03, 04,	m3	11,38960	-38 497,49	-438 471,01
---	----------	---	----	----------	------------	-------------

Díl: 31a		Železobetonové prefa konstrukce				349 350,00
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

3	31aFIHBH01	Dodávka ŽB prefajímky pro strojovnu technologie vč. plastové retenční nádrže , (vč. dopravy na místo stavby)	kpl.	1,00000	324 350,00	324 350,00
---	------------	--	------	---------	------------	------------

CN obsahuje:

Prefabrikovanou atypickou železobetonovou jímku, vč. otvorů, prostupů a jejich zatěsnění, osazení a dodání plastové retenční nádrže technologie vodního prvku a její zabudování při betonáži.

4	31aFIHBHR01	Montáž prefabrikované železobetonové šachty dle navržené změny	kpl.	1,00000	25 000,00	25 000,00
---	-------------	--	------	---------	-----------	-----------

Včetně zřízení maltového lože a předepsaného dobetonování v množství do skladebního rozměru dílce včetně potřebného bednění.

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-9 811,76
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

5	631 31-00	Mazanina podkladní z betonu C 15/20, tl. 10 cm podkladní beton č.v.03, 04	m2	-12,32340	502,43	-6 191,65
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------


6	632 45-00	Vyrovnávací potěr podlahy šachty tl. 80mm č.v.03, 04,	m2	-7,60000	476,33	-3 620,11
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Díl: M99		Ostatní práce "M"				-161 284,95
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--------------------

7	atyp.plast 01	PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,8x2,0x2,0m, s integrovanou re , tenční nádrží o rozměrech 1,2x2,0x2,0m, objem 4,8m3, dva vstupní komínky 600x600mm, čerpací jímka	kpl.	-1,00000	161 284,95	-161 284,95
---	---------------	--	------	----------	------------	-------------


v

STROJOVNA TECHNOLOGIE PŮDORYS

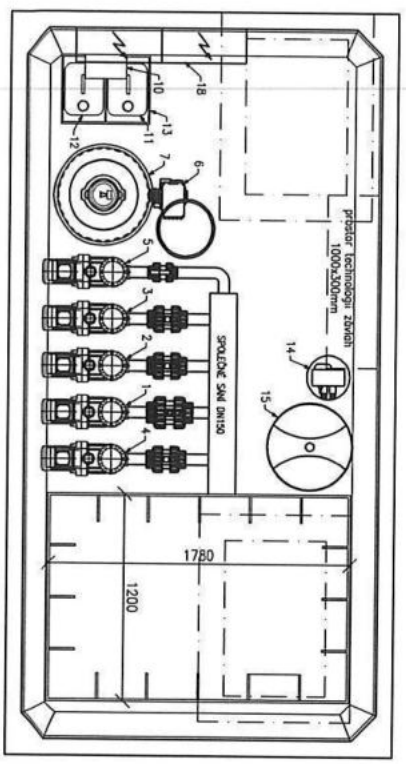


SMĚR VODNÍ PRŮVOK 1

ŘEZ C-C'

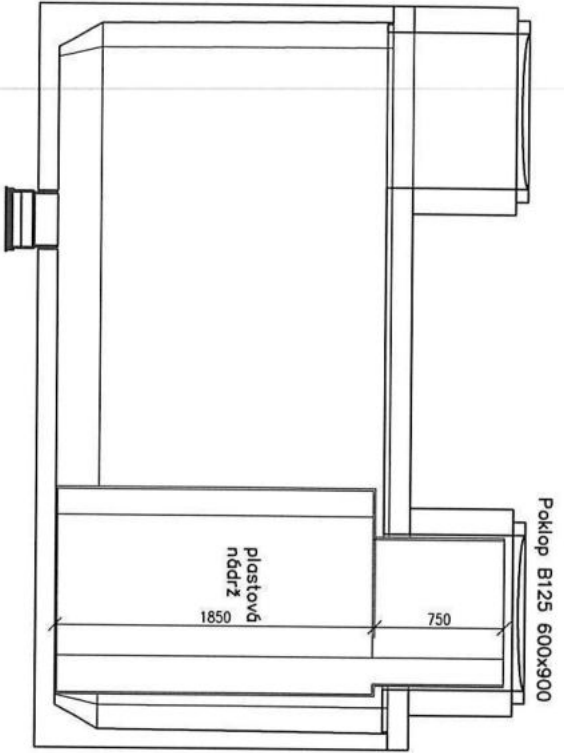


SMĚR VODNÍ PRŮVOK 2

RETENČNÍ NÁDRŽ PŮDORYS

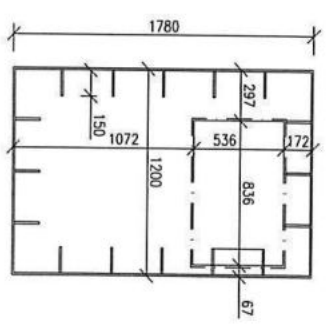

ŘEZ C-C'



Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentací stavební část, která později bude provedena. Tato projektová dokumentace je důležitou součástí projektu LENTUS AGILUS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále předávána bez souhlasu vlastníka.

Projektant		Výpracoval		Zodpovědný projektant	
Ing. Libor Lovelák		Ing. Petr Jeleček		Ing. Ivo Pospíšil	
Investor:		Město Znojmo, Okružní 11/2, 690 22, Znojmo			
Název zakázky:					
Číslo stavby: SO 06 - Vodní prvky					
Obsah výkresu					
Strojovna technologie- retenční nádrž					
Číslo výkresu					
03					

LENTUS
agilus

LENTUS a.s., spol. s r.o., Štátní 690, 691 10 Křižovice
www.lentus.cz, info@lentus.cz, tel: +420 519 431 417

Číslo zakázky: -

Datum: únor 2021

Kraj: Jihočeský

Stupeň: DPS

Formát: A4

Měřítko: 1:30

Číslo výkresu: 03

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 10**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Skutečný rozsah odstranění ornice a vykopávek pro budoucí komunikace a zpevněné plochy dle PD a taktéž narovnání bouracích prací komunikací dle skutečnosti.			
Odůvodnění změny: Při přípravě ZL zhotovitel zjistil nesoulad odstranění ornice a vykopávek pro budoucí komunikace a zpevněné plochy, mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Tímto změnovým listem dochází k narovnání skutečnosti na stavbě. Dále provedl porovnání rozsahu bouracích prací v rozpočtu SoD se skutečností dle PD a provedl toto narovnání viz. příloha č. 1 tohoto ZL.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		753 231,02,- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		753 231,02,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	158 178,51,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		911 409,53,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	21 dní	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	21 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	3.5.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	3.5.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	3.5.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	3.5.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	3.5.2022	
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt: ZL - 10 ZL 10 - Chybějící odkopávky v zemníku, skrývka a rozprostření ornice, odstranění vozovkových vrstev
Rozpočet: 1 ZL 10 - Chybějící odkopávky v zemníku, skrývka a rozprostření ornice

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
 Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
 60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			753 231,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			753 231,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	753 231,02 CZK
Základní DPH	21 %	158 178,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 911 409,53 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Popis objektu: ZL - 10 - ZL 10 - Chybějící odkopávky v zemníku, skrávka a rozprostření ornice, odstranění vozovkových vrste
Popis rozpočtu: 1 - ZL 10 - Chybějící odkopávky v zemníku, skrávka a rozprostření ornice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			588 823,16	78
96	Bourání konstrukcí	HSV			164 407,86	22
Cena celkem					753 231,02	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 10	ZL 10 - Chybějící odkopávky v zemníku, skryvka a rozprostření ornice, odstranění vozovkových
R:	1	ZL 10 - Chybějící odkopávky v zemníku, skryvka a rozprostření ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				588 823,16
1	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 odstranění zeminy	m3	465,55628	163,61	76 169,66
		Odpočet množství z SoD : -456,50		-456,50000		
		Odpočet skály parkoviště F2 : -96		-96,00000		
		Mezisoučet		-552,50000		
		Dle výkresu příloha č. 3 ZL 10 :				
		3,01 : 178,787*0,25		44,69675		
		3,02 : 319,169*0,05		15,95845		
		3,03 : 0				
		3,04 : 687,221*0,25		171,80525		
		3,05 : 332,266*0,25		83,06650		
		3,06 : 14,451*0,25		3,61275		
		3,07 : 46,213*0,25		11,55325		
		3,08 : 20,621*0,25		5,15525		
		3,09 : 812,744*0,32		260,07808		
		3,10 : 0				
		Mezisoučet		595,92628		
		Plochy skladby SB2 bourací práce dle skladby nových konstrukcí :				
		2.05 : 970,2*0,27		261,95400		
		2.06 : 712,4*0,19		135,35600		
		2.14 : 70,6*0,2		14,12000		
		2.23 : 53,5*0,2		10,70000		
		Mezisoučet		422,13000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, odvoz zeminy na skládku	m3	465,55628	130,32	60 671,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 465,55628		465,55628		
3	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku	m3	465,55628	308,90	143 810,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 465,55628		465,55628		
4	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	586,30750	229,06	134 299,60
		Odpočet m3 dle SoD : -135,5		-135,50000		
		Odpočet kubatury ornice u jímky technologie : -167,2*0,25		-41,80000		
		Mezisoučet		-177,30000		
		Výměra dle PD příloha č. 3 ZL 10 :				
		3,01 : 178,787*0,25		44,69675		
		3,02 : 319,169*0,25		79,79225		
		3,03 : 412,928*0,25		103,23200		
		3,04 : 687,221*0,25		171,80525		
		3,05 : 332,266*0,25		83,06650		
		3,06 : 14,451*0,25		3,61275		
		3,07 : 46,213*0,25		11,55325		
		3,08 : 20,621*0,25		5,15525		
		3,09 : 812,744*0,25		203,18600		
		3,10 : 230,03*0,25		57,50750		

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 10	ZL 10 - Chybějící odkopávky v zemníku, skryvka a rozproštění ornice, odstranění vozovkových
R:	1	ZL 10 - Chybějící odkopávky v zemníku, skryvka a rozproštění ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Mezisoučet				763,60750		
5	181301117R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2	m2	1 465,76875	43,40	63 614,36
		586,3075/0,4		1 465,76875		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	586,30750	67,30	39 458,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 586,30750		586,30750		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						164 407,86
7	113 10-61 Sb1	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic tl.120 mm	m2	34,25700	58,84	2 015,68
		Dle SoD : -531,53		-531,53000		
		Dle skutečnosti příloha č.3 PD ZL 10 : 565,787		565,78700		
8	113 10-71 Sb1	Odstranění podkladu v tl.400 mm	m2	34,25700	62,18	2 130,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,25700		34,25700		
9	113 10-9 Sb6	Odstranění živичného betonu v tl.100 mm	m2	86,68200	124,22	10 767,64
		Dle SoD : -339,4		-339,40000		
		přípočet dopravní řešení : 251,39		251,39000		
		Dle PD příloha č.2 ZL 10 : 426,082		426,08200		
		odpočet dopravní řešení : -251,39		-251,39000		
10	113 10-71 Sb6	Odstranění podkladu v tl.400 mm	m2	86,68200	71,53	6 200,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 86,68200		86,68200		
11	113 10-71 Sb2	Odstranění nepevněného štěrku v tl.100 mm	m2	496,73000	15,53	7 714,22
		Dle SoD : -3364,99		-3 364,99000		
		Dle PD příloha č.2 ZL 10 : 3861,72		3 861,72000		
		Mezisoučet		496,73000		
12	113 10-72 Sb2	Odstranění podkladu v tl.200 mm	m2	496,73000	31,07	15 433,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 496,73000		496,73000		
Díl: 1 Zemní práce						588 823,16
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	879,46125	98,20	86 363,09
		Přemístění ornice na místo deponie na stavbě :		293,15375		
		586,3075/2				
		Přemístění ornice na místo rozproštění : 586,3075		586,30750		
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-495,50000	31,41	-15 563,66
		Odpočet rozsahu z SoD : -495,50		-495,50000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						164 407,86
15	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	426,71710	58,84	25 108,03
16	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 133,58550	5,23	11 158,65
		426,7171*5		2 133,58550		
17	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	426,71710	19,33	8 248,44
		Navýšení oproti SoD : 426,7171		426,71710		
18	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8 107,62490	1,07	8 675,16
		426,7171*19		8 107,62490		
19	979 99-99	Poplatek za skládku	t	426,71710	156,91	66 956,18

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 12**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Skutečný rozsah bouraných obrubníků dle PD.			
Odůvodnění změny: Při přípravě fakturace a kontrole vážných lístků zhotovitel zjistil nesoulad rozsahu bouracích prací obrubníků mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Tímto změnovým listem dochází k narovnání skutečnosti na stavbě.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		418 190,86,- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		418 190,86,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	87 820,08,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		506 010,94,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:		5 dní
	Vliv změny na termín dokončení díla:		5 dní
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		3.5.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		5.5.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		3.5.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		3.5.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		3.5.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22030202** Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Objekt: **ZL - 12** **ZL 12 - Bourání obrub dle skutečnosti na stavbě**

Rozpočet:	1	ZL 12 - Bourání obrub dle skutečnosti na stavbě
-----------	---	---

Objednatel:	Město Znojmo	IČO: 00293881
	Obroková 1/12	DIČ: CZ00293881
	66902 Znojmo	

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			418 190,86
-----	--	--	------------

PSV			0.00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			418 190,86
--------	--	--	------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	418 190.86 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	87 820,08 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	506 010,94 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Popis objektu: ZL - 12 - ZL 12 - Bourání obrub dle skutečnosti na stavbě
Popis rozpočtu: 1 - ZL 12 - Bourání obrub dle skutečnosti na stavbě

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			163 760,64	39
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			254 430,22	61
Cena celkem					418 190,86	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 12	ZL 12 - Bourání obrub dle skutečnosti na stavbě
R:	1	ZL 12 - Bourání obrub dle skutečnosti na stavbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				163 760,64
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2 026,22000	85,08	172 390,80
		Odpočet dle SoD : -245		-245,00000		
		Dle skutečnosti :		2 156,50000		
		123,3+42,9+29,5+2,7+6,1+30,1+2,6+1,2+182,5+471,8+9,5+24,7+21,2+40,3+44,9+96+2+2,5+2,6+13,6+1,8+2+2+14,8+7,3+1,7+20,5+90,7+53,3+54,7+60,3+120,5+57,7+96,9+34,6+23,4+41,4+90,3+76,1+33,1+44+40,4+39				
		76,12+14,6+20,6+14+12,5+3,6+10+7,1+10,1+2,2+34,5+42,7+8,2		256,22000		
		Dle poslední odsouhlasené úpravy rozsahu PD příloha č. 2 ZL 12 : -141,5		-141,50000		
2	113 20-11 Sb3	Vytrhání obrub vč. podkladu - součást dopravního řešení	m	-88,00000	98,07	-8 630,16
		Odpočet obrub v místě Workout (nebyla obruba, ale žb brouzdaliště) :				
		Workout : -(29,00+15,00)*2		-88,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				254 430,22
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	547,07940	19,35	10 585,99
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
4	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10 394,50860	1,07	11 122,12
		547,0794*19		10 394,50860		
5	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	547,07940	32,72	17 900,44
		Včetně:				
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,				
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
6	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	547,07940	392,67	214 821,67



BOURANÉ OBRUBY



VYJMUTO



**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 13**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Záměna došlapového materiálu z původního návrhu betonového prvku tryskaného na obrubník o tl.100 mm			
Odůvodnění změny: Z důvodu nemožnosti nalezení výrobce atypických výrobků pro došlapové plochy skladby S6 – betonové prvky v travě, navrhl dodavatel jejich záměnu za chodníkové obruby tl. 100 mm, které již dříve touto metodou realizoval na jiných zakázkách pro investora město Znojmo, dále také tímto dojde k úspoře v ceně dodávky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-32 094,30,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-6 739,80,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-38 834,10,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	bez dopadu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		13.4.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		13.4.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		13.4.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		13.4.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		13.4.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt:	ZL - 13	ZL 13 - Změna materiálu u skladby S6 betonové prvky v trávě
Rozpočet:	1	ZL 13 - Změna materiálu u skladby S6 betonové prvky v trávě
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	
		IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	
		IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-32 094,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-32 094,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-32 094,30 CZK
Základní DPH	21 %	-6 739,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -38 834,10 CZK

v ZNOJME

dne 13.4.2022

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

ING. NAZAR HUDYMA
 Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 13 - ZL 13 - Změna materiálu u skladby S6 betonové prvky v trávě

Popis rozpočtu: 1 - ZL 13 - Změna materiálu u šlapákového chodníku

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-32 094,30	100
Cena celkem					-32 094,30	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 13	ZL 13 - Změna materiálu u skladby S6 betonové prvky v travě
R:	1	ZL 13 - Změna materiálu u skladby S6 betonové prvky v travě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-32 094,30
1	591 05 *S6*	Betonové prvky v travě - kompletní skladba	m2	-651,00000	1 232,42	-802 305,42

; ve skladbě
; řezané betonové prvky - horní povrch tryskaný
; spodní a boční lámaný vel.1500/250 mm tl.60 mm
; spára 20 mm - založ.trávník ornice s drtí
; lože dlažby z drtí fr.4-8mm tl.50 mm
; štěrkopísek tl.150 mm
; geotextilie
Dle SoD : -651,00

-651,00000

2	591 05 *S6*	Betonové prvky v travě - kompletní skladba	m2	651,00000	1 183,12	770 211,12
---	-------------	--	----	-----------	----------	------------

; ve skladbě
; obrubník tl. 100 mm o rozměru 1000/250 mm + 500/250
; spára 20 mm - založ.trávník ornice s drtí
; lože dlažby z drtí fr.4-8mm tl.50 mm
; štěrkopísek tl.150 mm
; geotextilie

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 15**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Neprovádění vrstvy geosyntetika v komunikacích parkovišť.			
Odůvodnění změny: AD a TDS rozhodli o neprovádění vrstvy geosyntetika v komunikacích parkovišť.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-337 665,48,-	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-337 665,48,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-70 909,75,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-408 575,23Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	bez dopadu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	18.4.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	18.4.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	18.4.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	18.4.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	18.4.2022	
přílohy	Přílohy: č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt:	ZL - 15	ZL 15 - Neprovádění vrstvy geosyntetika v komunikacích parkovišť
Rozpočet:	1	ZL 15 - Neprovádění vrstvy geosyntetika v komunikacích parkovišť
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-337 665,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-337 665,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-337 665,48 CZK
Základní DPH	21 %	-70 909,75 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-408 575,23 CZK
--------------------------	------------------------

v

BRNE

dne

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 623 • DIČ: CZ25317628

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 15 - ZL 15 - Nprovádění vrstvy geosyntetika v komunikacích parkovišť

Popis rozpočtu: 1 - ZL 15 - Nprovádění vrstvy geosyntetika v komunikacích parkovišť

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-337 665,48	100
Cena celkem					-337 665,48	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 15	ZL 15 - Neprovádění vrstvy geosyntetika v komunikacích parkovišť
R:	1	ZL 15 - Neprovádění vrstvy geosyntetika v komunikacích parkovišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-337 665,48
1	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	-1 803,00000	57,85	-104 303,55
2	69365027R	Geosyntetikum drenážní tl.10 mm	m2	-1 857,09000	125,66	-233 361,93

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 16**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Zjištěná duplicita položek.			
Odůvodnění změny: TDS zjistil duplicitu položky poklopu pro jímku technologie vodních prvků, na základě dohody s investorem a AD bylo rozhodnuto o odstranění ocelových poklopů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složené ceně změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-25 708,52,-
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-25 708,52,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-5 398,79,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-31 107,31,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:		bez dopadu
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez dopadu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		18.4.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		18.4.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		18.4.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		18.4.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		18.4.2022
přílohy	Přílohy:		
	č. 1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt:	ZL - 16	ZL 16 - Odpočet duplicity položky poklopu pro jímku technologie
Rozpočet:	1	ZL 16 - Odpočet duplicity položky poklopu pro jímku technologie
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	
		IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. MLýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	
		IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	0,00
PSV	-25 708,52
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-25 708,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 708,52 CZK
Základní DPH	21 %	-5 398,79 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -31 107,31 CZK

v

BRNĚ

dne

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 MLÝNSKÁ 63 • 602 00 BRNO
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 16 - ZL 16 - Odpočet duplicity položky poklopu pro jímku technologie

Popis rozpočtu: 1 - ZL 16 - Odpočet duplicity položky poklopu pro jímku technologie

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-25 708,52	100
Cena celkem					-25 708,52	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 16	ZL 16 - Odpočet duplicity položky poklopu pro jímku technologie
R:	1	ZL 16 - Odpočet duplicity položky poklopu pro jímku technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-25 708,52
1	76701	Ocelový poklop na šachtu pro vodní prvky 600/600mm D+M	ks	-2,00000	12 854,26	-25 708,52

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 17**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Drobné stavební práce nezařaditelné k 13.4.2022			
Odůvodnění změny: Na základě skutečností na stavbě byl vyhotoven ZL pro drobné práce, které je potřeba realizovat na stavbě, které nebyly v rozsahu položkového rozpočtu u SoD a to vytrhání pařezů po kácení, výšková úprava stávajících poklopů a šoupat, sondy potřebné pro zjištění vedení inženýrských sítí pro do projektování a návrhy řešení změn.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	31 978,00,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	31 978,00,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	6 715,38,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	38 693,38,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	2 dny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	2 dny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	3.5.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	3.5.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	3.5.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	3.5.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	3.5.2022	
přílohy	Přílohy: č.1 - Rozpočet změny č.2 – Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22030202** **Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL**

Objekt: **ZL - 17** **ZL 17 - Drobné nutné stavební práce k 13.4.2022**

Rozpočet:	1	ZL 17 - Drobné nutné stavební práce k 13.4.2022
-----------	---	---

Objednatel:	Město Znojmo	IČO: 00293881
	Obroková 1/12	DIČ: CZ00293881
	66902 Znojmo	

Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	IČO: 25317628
	Mlýnská 388/68	DIČ: CZ25317628
	60200 Brno-Trnitá	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			Celkem
			28 003,00

PSV			0,00
			0,00

MON			3 975,00
-----	--	--	----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			31 978,00
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
		0,00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	31 978,00 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	6 715,38 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	38 693,38 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele _____ Za objednatelē

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Popis objektu: ZL - 17 - ZL 17 - Drobné nutné stavební práce k 13.4.2022
Popis rozpočtu: 1 - ZL 17 - Drobné nutné stavební práce k 13.4.2022


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 613,00	21
8	Trubní vedení	HSV			21 390,00	67
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 975,00	12
Cena celkem					31 978,00	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 17	ZL 17 - Drobné nutné stavební práce k 13.4.2022
R:	1	ZL 17 - Drobné nutné stavební práce k 13.4.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 613,00
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	6,00000	312,00	1 872,00
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00000	750,00	3 000,00
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,00000	1 741,00	1 741,00
Sonda pro zjištění způsobu napojení kanalizace v ulici Slovenská : 1*1*1				1,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				21 390,00
4	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00
5	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00000	1 278,00	6 390,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 975,00
6	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00000	653,00	3 265,00
7	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00000	142,00	710,00

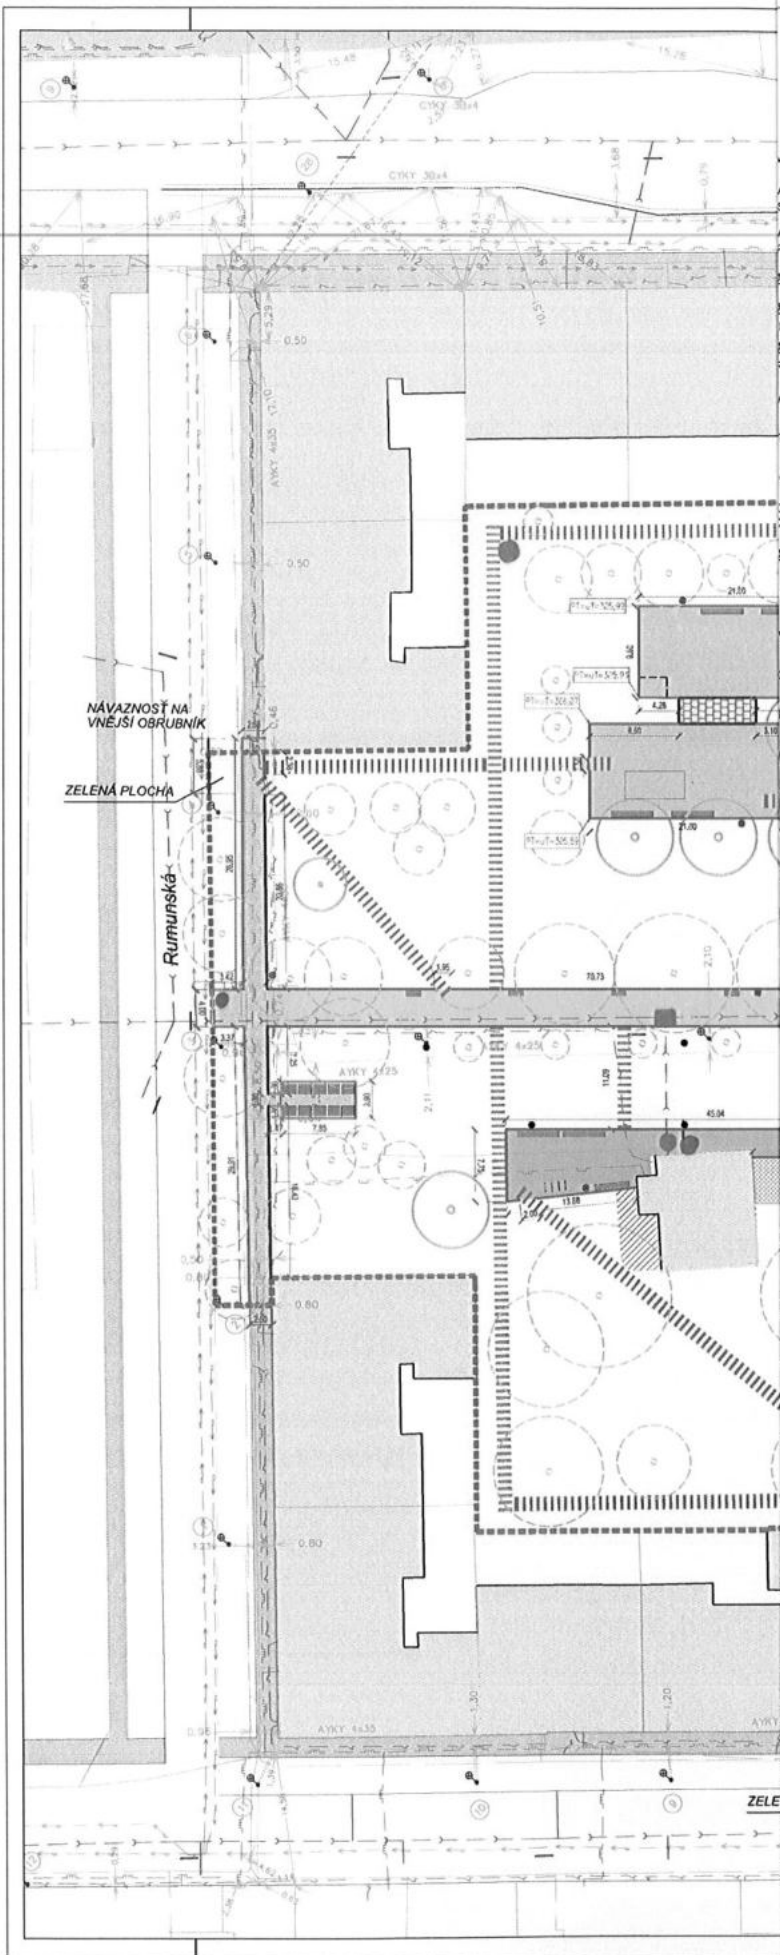

USPOŘENÉ POLOŽKY:

MLATOVÁ CESTA K UMĚL. ŠKOLE:

- MLATOVÝ POVRCH - 48,59 m²
- DLAŽBA ŽULOVÉ ODSEKY - 10,53 m²
- 1x LINIOVÁ LAVICE - L4: ROZMĚRY: 3325 x 600 x 502 mm
- 1x ODPADKOVÝ KOŠ

PŘESUNUTÉ POLOŽKY:

- 1x STOŽAROVÉ SVÍTIDLO
- 1x PÍTKO

PŘIDANÉ POLOŽKY:

- BETONOVÉ PRVKY V TRÁVĚ 13,10 m

LINIOVÝ ŽLAB U DOLNÍHO PARKOVIŠTĚ:

betonový štěrbinový žlab s průběžnou štěrbinou, průměr odtoku 140, včetně příslušenství (vpustový kus, čistící kus, zásepky).

- NOVĚ DOHODNUTÝ ROZSAH STAVBY

DU 600 4x
800x800 2x
čoupata 5x



a Wagnerová, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. arch. Michal Řičný

h. Nina Kákošová

h. Nina Kákošová, Bc. Johana Krejčí

Znojmo, Obroková 1/12, 669 22, Znojmo

NSTRUKCE LOKALITY KOLONKA, ZNOJMO

S OBRUBNÍKŮ A UKONČOVACÍCH PRVKŮ

mřítko 1:500 přil. č. paré

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 19**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Zhotovitel provedl, správné zařazení demontážních hmotností u položek v rozpočtu.			
Odůvodnění změny: Při práci na tvorbě ZL, zhotovitel zjistil, nesoulad demontážních hmotností při odpočtech a uvedených v SoD, jelikož při odpočtech docházelo k výraznému snižování odvozu sutí na skládku, což nekorespondovalo s odvezeným materiálem na skládku. Zhotovitel provedl zařazení demontážních položek dle cenové základny RTS a zjistil nesoulad, který se tímto ZL napravljuje, aby se dalo s položkami přesunů sutí správně pracovat v obou směrech jak přípočty, tak odpočty. Finální přesun sutí bude upřesněn dle skutečně odvezených tun na skládku v rámci doložení vážných lístků.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		494 366,28,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		494 366,28,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	103 816,92,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		598 183,2,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		Bez vlivu
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Bez vlivu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		10.5.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		10.5.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		10.5.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		10.5.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		10.5.2022
přílohy	Přílohy:		
	č. 1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL			
Objednatel: Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo		IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881	
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá		IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			494 366,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			494 366,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		494 366,28 CZK
Základní DPH	21 %		103 816,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			598 183,20 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div> _____ _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL - 19	ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u	0,00	494 366,28	103 816,92	598 183,20	100
1	ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek	0,00	364 328,87	76 509,06	440 837,93	74
2	ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek	0,00	130 037,41	27 307,86	157 345,27	26
Celkem za stavbu		0,00	494 366,28	103 816,92	598 183,20	100

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 19 - ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek bouracích prací

Popis rozpočtu: 1 - ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek bouracích prací - stavební řešení

Popis rozpočtu: 2 - ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek bouracích prací - dopravní řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			364 328,87	74
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			130 037,41	26
Cena celkem					494 366,28	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 19	ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek bouracích prací
R:	1	ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek bouracích prací - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00
1	113 10-61 Sb1	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic tl.120 mm	m2	565,78700	0,00	0,00
		Dle SoD : 531,53		531,53000		
		Dle ZL10 : 34,257		34,25700		
2	113 10-71 Sb1	Odstranění podkladu v tl.400 mm	m2	565,78700	0,00	0,00
		Dle SoD : 531,53		531,53000		
		Dle ZL10 : 34,257		34,25700		
3	113 10-71 Sb2	Odstranění nepevněného štěrku v tl.100 mm	m2	3 861,72000	0,00	0,00
		SoD : 3 364,99		3 364,99000		
		Dle ZL10 : 496,73		496,73000		
4	113 10-71 Sb2_	Odstranění podkladu v tl.200 mm	m2	3 861,72000	0,00	0,00
		SoD : 3 364,99		3 364,99000		
		Dle ZL10 : 496,73		496,73000		
5	113 10-71 Sb4	Odstranění podkladu v tl.400 mm	m2	667,55000	0,00	0,00
		667,55		667,55000		
		Dle SoD :				
6	113 10-71 Sb4_	Odstranění štěrku v tl.100 mm	m2	667,55000	0,00	0,00
		Dle SoD : 667,55		667,55000		
7	113 10-71 Sb5	Odstranění písku z pískoviště v tl.400 mm	m2	9,06000	0,00	0,00
		Dle SoD : 9,06		9,06000		
8	113 10-71 Sb6_	Odstranění podkladu v tl.400 mm	m2	426,08200	0,00	0,00
		Dle SoD : : 339,4		339,40000		
		Dle ZL10 : 86,682		86,68200		
9	113 10-71 Sb7_	Odstranění podkladu v tl.400 mm	m2	88,01000	0,00	0,00
		Dle SoD : : 88,01		88,01000		
10	113 10-9 Sb6	Odstranění betonu v tl.120 mm	m2	426,08200	0,00	0,00
		Dle SoD : : 339,4		339,40000		
		Dle ZL10 : 86,682		86,68200		
11	113 15-11 Sb7	Odstranění živičného betonu v tl.100 mm	m2	88,01000	0,00	0,00
		Dle SoD : 88,01		88,01000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				364 328,87
12	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 293,96531	19,33	25 012,35
		4510,68241		4 510,68241		
		Odpočet SoD : -2 790,00		-2 790,00000		
		Odpočet ZL10 : -426,7171		-426,71710		
13	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24 585,34089	1,07	26 306,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1293,96531*19		24 585,34089		
14	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1 293,96531	58,84	76 136,92
		Dle demontážní hmotnosti správné : 4510,68241		4 510,68241		
		Dle SoD : -2 790,00		-2 790,00000		
		Dle ZL10 : -426,7171		-426,71710		
15	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6 469,82655	5,23	33 837,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1293,96531*5		6 469,82655		
16	979 99-99	Poplatek za skládku	t	1 293,96531	156,91	203 036,10

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 19	ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek bouracích prací
R:	1	ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek bouracích prací - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Dle správné demontážní hmotnosti u položek :		4 510,68241		
		4510,68241				
		Dle SoD : -2 790,00		-2 790,00000		
		Dle ZL10 : -426,7171		-426,71710		

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 19	ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek bouracích prací
R:	2	ZL 19 - Doplnění správných demontážních hmotností u položek bouracích prací - dopravní řeš

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	368,00000	0,00	0,00
2	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	348,00000	0,00	0,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	245,00000	0,00	0,00
4	113107212RT1	Odstranění podkladu nad 200 m2,KZC tl.20 cm	m2	1 041,00000	0,00	0,00
5	113107212RT2	Odstranění podkladu nad 200 m2, tl.15 cm směs zeminy a štěrku	m2	1 041,00000	0,00	0,00
6	113107241RT3	Odstranění podkladu nad 200 m2, tl.5 cm asfaltový beton	m2	325,00000	0,00	0,00
7	113107242RT4	Odstranění podkladu nad 200 m2, tl.10 cm asfaltový beton	m2	325,00000	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				130 037,41
8	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	288,91426	32,72	9 453,27

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	288,91426	19,35	5 590,49
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 444,57130	1,07	1 545,69
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 288,91426*5				1 444,57130		
11	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfaltobeton	t	0,00000	850,79	0,00
Dle doplnění demontážních hmotností : 90,68				90,68000		
Odpočet z SoD : -90,68				-90,68000		
12	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí beton,obrubník	t	288,91426	392,67	113 447,96
Dle doplnění demontážních hmotností : 1185,19026				1 185,19026		
Odpočet z SoD : -896,276				-896,27600		

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 20**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Záměna litinových mříží kolem stromů na centrální ploše za zásyp kamene.			
Odůvodnění změny: Jedná se o změnu PD od AD, která odstranila realizaci litinových mříží a nahradila prostor kolem stromů v centrální části kameným zásypem.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		4 704,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-783 783,-
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-779 079,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-163 606,59,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-942 685,59,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:		2 dny
	Vliv změny na termín dokončení díla:		2 dny
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		3.5.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		3.5.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		3.5.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		3.5.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		3.5.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22030202** **Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL**

Objekt: **ZL - 20** **ZL 20 - Změna úpravy u stromů na centrální ploše**

Rozpočet:	1	ZL 20 - Změna úpravy u stromů na centrální ploše
-----------	---	--

Objednatel:	Město Znojmo	IČO: 00293881
	Obroková 1/12	DIČ: CZ00293881
	66902 Znojmo	

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 704,00
-----	--	--	----------

PSV			-783 783,00
-----	--	--	-------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			-779 079,00
--------	--	--	-------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-779 079,00 CZK
-------------------------	------	-----------------

Základní DPH	21 %	-163 606,59 CZK
--------------	------	-----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-942 685,59 CZK
-------------------	-----------------

V

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 704,00	-1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-783 783,00	101
Cena celkem					-779 079,00	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 20	ZL 20 - Změna úpravy u stromů na centrální ploše
R:	1	ZL 20 - Změna úpravy u stromů na centrální ploše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 704,00
1	247531112RHF	Obsyp stromu kamenive hrubého drceného 8 -16 mm kraj Jihomoravský	m3	1,40000	3 360,00	4 704,00

Včetně dodání obsypových hmot.

výměra : 7*2*2*0,05

1,40000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-783 783,00
2	76701 M	Mříž ke stromu - rám z HEB nosníku a litinového krytu 2300/2300mm, D+M č.v.14	ks	-5,00000	156 756,60	-783 783,00

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 21**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Nové chodníky z prvků v trávě (parkoviště F1)			
Odůvodnění změny: Na základě změny PD ze strany AD, který reaguje na nově vzniklé požadavky ze strany okolních BD a zapracování pohybových návyků obyvatel, dospěl k novému řešení chodníků z prvků v trávě.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		17 520,16,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		17 520,16,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	3 679,23,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		21 199,39,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:		3 dny
	Vliv změny na termín dokončení díla:		3 dny
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		10.5.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		10.5.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		10.5.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		10.5.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		10.5.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt:	ZL - 21	ZL 21 - Nové chodníky z prvků v trávě (ZUŠ a parkoviště F1)
Rozpočet:	1	ZL 21 Nové chodníky z prvků v trávě (ZUŠ a parkoviště F1)
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	
		IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	
		IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 520,16
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	17 520,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 520,16 CZK
Základní DPH	21 %	3 679,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 21 199,39 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 21 - ZL 21 - Nové chodníky z prvků v trávě (ZUŠ a parkoviště F1)

Popis rozpočtu: 1 - ZL 21 Nové chodníky z prvků v trávě (ZUŠ a parkoviště F1)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 257,91	13
5	Komunikace	HSV			15 262,25	87
Cena celkem					17 520,16	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 21	ZL 21 - Nové chodníky z prvků v trávě (ZUŠ a parkoviště F1)
R:	1	ZL 21 Nové chodníky z prvků v trávě (ZUŠ a parkoviště F1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 257,91
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m parkoviště F1 : 8,6*1,5*0,25	m3	3,22500 3,22500	229,06	738,72
2	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 odstranění zeminy parkoviště F1 : 8,6*1,5*0,05	m3	0,64500 0,64500	163,61	105,53
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,22500 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,22500	m3	6,45000 3,22500 3,22500	98,20	633,39
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, odvoz zeminy na skládku Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,64500	m3	0,64500 0,64500	130,32	84,06
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,22500	m3	3,22500 3,22500	67,30	217,04
6	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,64500	m3	0,64500 0,64500	308,90	199,24
7	181301117R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2 3,225/0,5	m2	6,45000 6,45000	43,40	279,93
Díl: 5		Komunikace				15 262,25
8	591 05 *S6*	Betonové prvky v trávě - kompletní skladba ; ve skladbě ; obrubník tl. 100 mm o rozměru 1000/250 mm + 500/250 ; spára 20 mm - založ.trávník ornice s drtí ; lože dlažby z drti fr.4-8mm tl.50 mm ; štěrkopísek tl.150 mm ; geotextilie parkoviště F1 : 8,6*1,5	m2	12,90000 12,90000	1 183,12	15 262,25

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 22**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Změna rozsahu mlatových ploch.			
Odůvodnění změny: Na základě změny PD ze strany AD, který reaguje na nově vzniklé požadavky ze strany okolních BD a zapracování pohybových návyků obyvatel, dospěl k novému řešení rozsahu mlatových ploch.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-41 125,16,-
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-41 125,16,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-8 636,28,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-49 761,44,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:	- 5 Dm	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	- 5 Dm	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		25.4.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		25.4.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		25.4.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		25.4.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		25.4.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:		ZL - 22 ZL 22 - Změna rozsahu mlatových ploch	
Rozpočet:		1 ZL 22 - Změna rozsahu mlatových ploch	
Objednatel:		Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:		FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-41 125,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-41 125,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-41 125,16 CZK
Základní DPH	21 %		-8 636,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-49 761,44 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Popis objektu: ZL - 22 - ZL 22 - Změna rozsahu mlatových ploch
Popis rozpočtu: 1 - ZL 22 - Změna rozsahu mlatových ploch

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-41 125,16	100
Cena celkem					-41 125,16	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 22	ZL 22 - Změna rozsahu mlatových ploch
R:	1	ZL 22 - Změna rozsahu mlatových ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-41 125,16
1	591 05 *S1*	Minerální beton tzv. mlat - kompletní skladba	m2	-55,80000	737,01	-41 125,16

;ve skladbě

;* směs frakcí kameniva - minerální beton tl.100 mm

;* kamenivo frakce 4-8mm tl.50 mm

;* kamenivo frakce 16-32mm tl.200 mm

;* štěrkopísek tl.50 mm

;* zhutněná pláň

cesta k zuš : -(47,7+8,1)

-55,80000

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 23**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Změna rozsahu betonových prvků v travě – vstupy do zadních traktů ulice Pražská.			
Odůvodnění změny: Na žádost investora, vyhotovil AD změnu PD ze strany AD, která obsahuje napojení zadních traktů BD na ulici Pražská do lokality Kolonka.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		20 675,02,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		20 675,02,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	4 341,75,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		25 016,77,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:		3 dny
	Vliv změny na termín dokončení díla:		3 dny
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		3.5.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		3.5.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		3.5.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		3.5.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		3.5.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt: ZL - 23 ZL 23 - Změna rozsahu betonových prvků v trávě – vstupy do zadních traktů ulice Pražská
Rozpočet: 1 ZL 23 - Změna rozsahu betonových prvků v trávě – vstupy do zadních traktů ulice Pražská

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
 Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
 60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 675,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 675,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 675,02 CZK
Základní DPH	21 %	4 341,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 25 016,77 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 23 - ZL 23 - Změna rozsahu betonových prvků v trávě – vstupy do zadních traktů ulice Pražská

Popis rozpočtu: 1 - ZL 23 - Změna rozsahu betonových prvků v trávě – vstupy do zadních traktů ulice Pražská

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			20 675,02	100
Cena celkem					20 675,02	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 23	ZL 23 - Změna rozsahu betonových prvků v trávě – vstupy do zadních traktů ulice Pražská
R:	1	ZL 23 - Změna rozsahu betonových prvků v trávě – vstupy do zadních traktů ulice Pražská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				20 675,02
1	591 05 *S6*	Betonové prvky v trávě - kompletní skladba	m2	17,47500	1 183,12	20 675,02

; ve skladbě

; obrubník tl. 100 mm o rozměru 1000/250 mm + 500/250

; spára 20 mm - založ.trávník ornice s drtí


; lože dlažby z drtí fr.4-8mm tl.50 mm

; štěrkopísek tl.150 mm

; geotextilie

(2,1+2,1+2,7+2,5+2,25)*1,5

17,47500

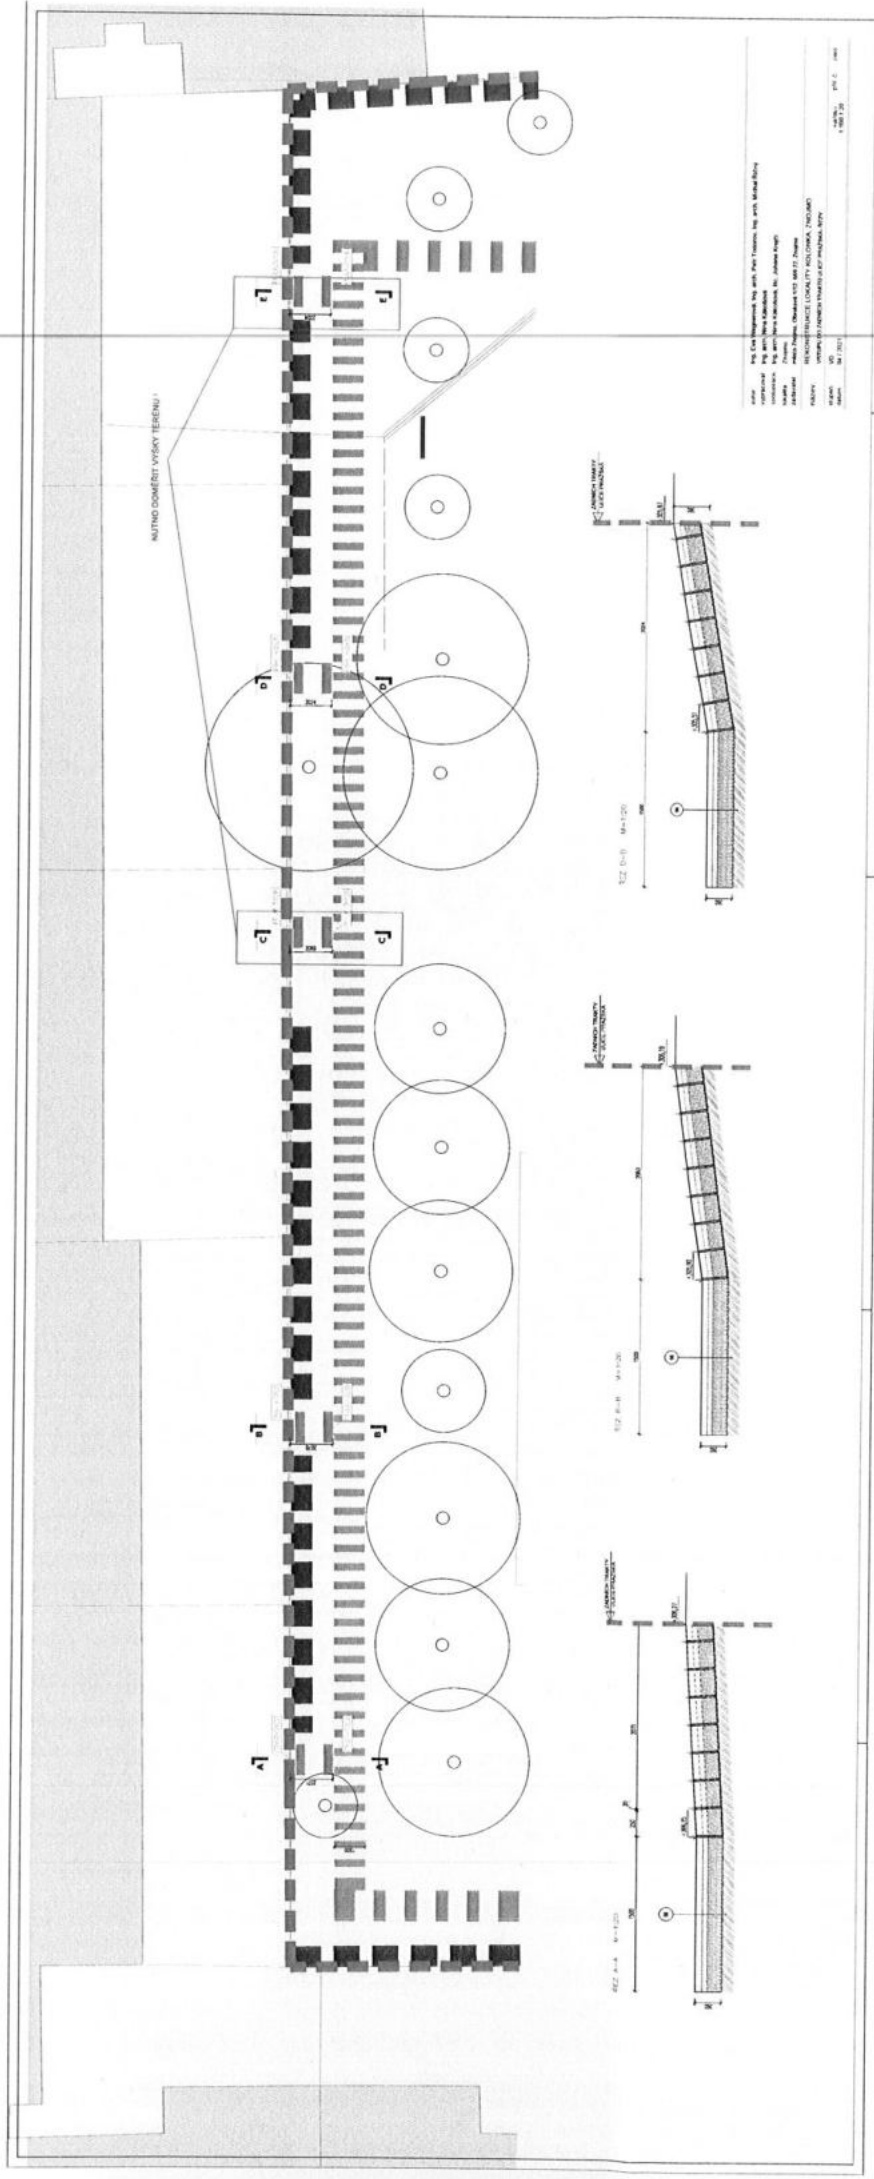

Projektant: Ing. Jan Kopecký, Ing. Jan Kopecký, Ing. Jan Kopecký
Stavba: Stavební úpravy a rozšíření objektu
Adresa: Praha 1, Městská správa
Datum: 15. 12. 2011
Měřítko: 1:100
List: 1 z 1

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 24**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Odvodnění parkoviště F2 vč. vsakovacího tělesa a kanalizace.			
Odůvodnění změny: Na základě změny PD ze strany AD, který reaguje na nově vzniklé skutečnosti na stavbě došlo, ke změně spádových sklonů parkoviště F2 a tudíž i změně odvodnění.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		179 973,73,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		179 973,73,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	37 794,48,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		217 768,212,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:		10 dní
	Vliv změny na termín dokončení díla:		10 dní
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		10.5.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		10.5.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		10.5.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		10.5.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		10.5.2022
přílohy	Přílohy:		
	č. 1 - Rozpočet změny č. 2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:	ZL - 24	ZL 24 - Odvodnění parkoviště F2 vč. vsakovacího tělesa a kanalizace.	
Rozpočet:	1	ZL 24 - Odvodnění parkoviště F2 vč. vsakovacího tělesa a kanalizace	
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo		IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá		IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			179 973,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			179 973,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		179 973,73 CZK
Základní DPH	21 %		37 794,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			217 768,21 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 24 - ZL 24 - Odvodnění parkoviště F2 vč. vsakovacího tělesa a kanalizace.

Popis rozpočtu: 1 - ZL 24 - Odvodnění parkoviště F2 vč. vsakovacího tělesa a kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			85 522,24	48
5	Komunikace	HSV			22 321,00	12
8	Trubní vedení	HSV			33 060,00	18
900	Vsakovací prvky	HSV			31 382,00	17
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 123,27	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 149,55	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			242,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 173,67	1
Cena celkem					179 973,73	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 24	ZL 24 - Odvodnění parkoviště F2 vč. vsakovacího tělesa a kanalizace.
R:	1	ZL 24 - Odvodnění parkoviště F2 vč. vsakovacího tělesa a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				85 522,24
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,23515	130,32	2 637,04

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,23515

8,23515

Odvoz výkopu z vsakovacího prvku na skládku : 12

12,00000

2	113201131RHF	Vytrhání obrub obrubníků kamenných	m	8,00000	90,60	724,80
3	1SO4	hloubení rýh šíř do 2m paží i nepaží tř. iii - bez dopravy	m3	27,58000	2 100,00	57 918,00

výkop : $19 \cdot (0,75 + 1,3) / 2 \cdot 0,8$

15,58000

Výkop vsakovacího prvku : 12

12,00000

4	4SO4	Lože a obsyp - kamenivo těžené 0 - 4 mm	m3	8,23515	1 450,00	11 940,97
		výkop : $21 \cdot 0,5 \cdot 0,8 - 3,14 \cdot 0,05 \cdot 0,05 \cdot 21$		8,23515		

5	5SO4	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,23515	528,00	10 684,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,23515		20,23515		

6	6SO4	zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	8,98485	180,00	1 617,27
		výkop : $21 \cdot (0,75 + 1,3) / 2 \cdot 0,8$		17,22000		
		lože : $-(21 \cdot 0,5 \cdot 0,8 - 3,14 \cdot 0,05 \cdot 0,05 \cdot 21)$		-8,23515		

Díl: 5		Komunikace				22 321,00
7	597121211R00	Montáž odvod.mikroštěrbínových trub -trouba dl.1 m	kus	4,00000	542,00	2 168,00
8	597121251R00	Montáž odvodňov. mikroštěrbínových trub - vpust'	kus	1,00000	3 985,00	3 985,00
9	597121261R00	Montáž odvod.mikroštěrbínových trub - čistící kus	kus	1,00000	729,00	729,00
10	597121291R00	Montáž odvodňov.mikroštěrbínových trub - záslepka	kus	2,00000	229,50	459,00
11	5RFH1	Dodávka mikroštěrbínového žlabu - vč. všech komponent a dopravy	kpl.	1,00000	14 980,00	14 980,00

Cena dodávky:

4 ks spádované dno 1330,- 5 320,-

1 ks čistící kus 1330,- 1 330,-

1 ks vpust'ový komplet 2030,- 2 030,-

2 ks záslepka P+D 150,- 300,-

Celkem 8.980

Doprava 6.000,-

Celkem 14.980,-

Díl: 8		Trubní vedení				33 060,00
12	7SO4	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	19,00000	420,00	7 980,00
13	8SO4	KG150 PŘÍMÁ TROUBA SN8	bm	19,00000	1 020,00	19 380,00
14	9SO4	Montáž potrubí z PVC hrdlových trub DN 150	bm	19,00000	300,00	5 700,00

Díl: 900		Vsakovací prvky				31 382,00
15	900 9/VL	Vsakovací prvek dle návrhu dl. 12000x1000x1000	kpl.	1,00000	31 382,00	31 382,00

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 123,27
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C20/25XF4	m3	0,50000	4 619,82	2 309,91
		8*0,25*0,25		0,50000		

17	917411111RT5	Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože bet C12/15 bez kamenného obrubníku	bm	8,00000	226,67	1 813,36
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 149,55
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 24	ZL 24 - Odvodnění parkoviště F2 vč. vsakovacího tělesa a kanalizace.
R:	1	ZL 24 - Odvodnění parkoviště F2 vč. vsakovacího tělesa a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	0,60000	3 385,00	2 031,00
19	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,78986	1,07	60,77
		2,98894*19		56,78986		
20	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,98894	19,33	57,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				242,00
21	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, úpravy povrchů	t	2,12506	113,88	242,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 173,67
22	979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % příměsí (skup.170107)	t	2,98894	392,67	1 173,67

LEGENDA PŘÍKOD:

1) MIKROŠTRÉNOVÁ TROUBA
- PROFIL M S PŘEÚŠENOU ŠTRÉNOU,
SE SPÁVANÝMI DNEM,
SPAD DNÁ= 0,5 %

2) 6 ks x
1 ks - ROZMĚRY:
DĚLKA= 1000 MM
ŠÍŘKA= 220 MM
VÝŠKA= 260 MM

3) + UKONČENÍ KOMPLETNÍM VPUSŤOVÝM
KUSEM, VÝŠKA DNÁ = 302,72

10000 6000 3000 3000

3000

1% SPAD

4 CM

KAMENNÝ OBRUBNÍK - NEZAPUŠŤENÝ
- VÝŠKA NAD TERÉNEM= 10 CM

KAMENNÝ OBRUBNÍK - ZAPUŠŤENÝ
- VÝŠKA NAD TERÉNEM= 4 CM

KOMPLETNÍ VPUSŤOVÝ KUS

UT= 303,45

UT= 303,36

UT= 303,36

UT= 303,45

MIKROŠTEREINOVÁ TROUBA
• PROFIL M S PŘERUŠENOU ŠTEREINOU,
SE SPAJOVÁVÁNÍM DNEM,
SPAD DNA= 0,5 %

6 ks z
1 ks - ROZMĚRY:
DELKA= 1000 MM
ŠÍŘKA= 220 MM
VÝŠKA= 260 MM

• UKONČENÍ KOMPLETNÍM VPUSŤOVÝM
KUSEM, VÝŠKA DNA = 302,72

* UKONČENÍ KOMPLETNÍM VPUSŤOVÝM
KUSEM, VÝŠKA DNA = 302,72

BETONOVÉ PRVKY V TIRÁŽI

autor	Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. arch. Michal Říčný
-------	--

vypracoval: Ing. arch. Nina Kákošlová
spolupráce: Ing. arch. Nina Kákošlová, Bc. Johana Krejčí

ing. arch. Nina Lukosová, Bc. Jana Křeč	Znojmo
lokalita	

zadávateľ: mesto Znojmo, Obrsková 1/12, 659 22, Znojmo

název: REKONSTRUKCE LOKALITY KOLONKA, ZNOJMO
ÚPRAVA LOKALITNÍHO NEMILNÍHO PŘEDKUPNÍHO A NEMILNÍHO PŘEDKUPNÍHO

úroveň	VD	model/typ
--------	----	-----------

datum:	04 / 2022	meřisko	150
--------	-----------	---------	-----

--	--

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 25**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Odpočet odvozu sutí na skládku.			
Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí AD a TDS, budou použity bourané materiály štěrkopísku a štěrkodrti na stavbě. Tím pádem dojde k menšímu odvozu sutí na skládku. Část těchto sutí, byla již odečtena ve ZL4.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-62 909,08,-
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-62 909,08,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-13 210,91,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-76 119,99,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:	0 dní	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	0 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		2.5.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		2.5.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		2.5.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		2.5.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		2.5.2022
přílohy	Přílohy: č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt: ZL - 25 ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopísků a šterkodrtí na stavbě k 26.4.2022
Rozpočet: 1 ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopísků a šterkodrtí na stavbě k 26.4.2022

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
 Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
 60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-62 909,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-62 909,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-62 909,08 CZK
Základní DPH	21 %	-13 210,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -76 119,99 CZK

v BRNĚ

dne _____

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO 174
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 25 - ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopísků a štěrkodrtí na stavbě k 26.4.2022

Popis rozpočtu: 1 - ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopísků a štěrkodrtí na stavbě k 26.4.2022

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-62 909,08	100
Cena celkem					-62 909,08	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 25	ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopísků a šterkodrtí na stavbě k 26.4.2022
R:	1	ZL 25 - Odpočet odvozu na skládku využitých šterkopísků a šterkodrtí na stavbě k 26.4.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-62 909,08
1	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-320,03400	19,33	-6 186,26
		Odpočet šp a šd (32-63) celková plocha 970 m2 : - (970*0,66)		-640,20000		
		Již započteno ve ZL4 : +320,166		320,16600		
2	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-6 080,64600	1,07	-6 506,29
		-320,034*19		-6 080,64600		
3	979 99-99	Poplatek za skládku	t	-320,03400	156,91	-50 216,53

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 27**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Změna typu dodávky odpadkového koše.			
Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí investora, AD vybral nový typ odpadkového koše pro osazení na zakázce. Dle situace ze dne 29.4.2022 ubyl ještě jeden koš.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-608 395,16,-	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-608 395,16,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-127 762,98,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-736 158,14,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:	0 dní	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	0 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	3.5.2022	Raab
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	3.5.2022	Borek
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	3.5.2022	Křemeček
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	3.5.2022	Todorov
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	3.5.2022	Malačka
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 - Projektová dokumentace změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt:	ZL - 27	ZL 27 - Záměna dodávky typu koše
Rozpočet:	1	ZL 27 - Záměna dodávky typu koše
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	
		IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	
		IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-608 395,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-608 395,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-608 395,16 CZK
Základní DPH	21 %	-127 762,98 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-736 158,14 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Popis objektu: ZL - 27 - ZL 27 - Záměna dodávky typu koše
Popis rozpočtu: 1 - ZL 27 - Záměna dodávky typu koše

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7671		PSV			-608 395,16	100
Cena celkem					-608 395,16	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 27	ZL 27 - Záměna dodávky typu koše
R:	1	ZL 27 - Záměna dodávky typu koše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7671						-608 395,16
1	76706 OK	Odpadkový koš z pozink.válc. oceli s popelníkem v=1000 mm obsah 40l D+M	ks	16,00000	-55 408,76	-886 540,16
2	76706re OK	Odpadkový koš z pozink.válc. oceli s dle nového výběru AD opláštění tahokov	ks	15,00000	18 543,00	278 145,00
		Dle SoD : 16		16,00000		
		Dle situace ze dne 29.4.2022 : -1		-1,00000		

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 28**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Dosypání podkladních vrstev pod plochy betonových prvků v trávě.			
<p>Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí TDS a AD, bude pod betonové prvky v trávě, jako podsypový materiál použit vytěžený štěrkopísek ze středové komunikace. Tento materiál je podmíněčně vhodný do aktivní zóny, čili může nasákat vodu a promrzáním měnit objem. Dle vyjádření AD ze dne 25.4.2022, lze i tak použít, zhotovitel upozorňuje, že v místech kde bude proveden tento podsyp nebude brán na případné reklamace zřetel. V případě, že materiál nebude dostačovat, bude doplněn novým nakupovaným materiálem, který bude zohledněn novým ZL.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	17 580,4,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	17 580,4,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	3 691,88Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	21 272,28,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	2 dny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	2 dny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	3.5.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	3.5.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	3.5.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	3.5.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	3.5.2022	
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		
	č.2 - Rozbor podloží zeminy		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt:	ZL - 28	ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce)
Rozpočet:	1	ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce)
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			17 580,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 580,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 580,40 CZK
Základní DPH	21 %	3 691,88 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	21 272,28 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 28 - ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce)

Popis rozpočtu: 1 - ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 491,80	31
5	Komunikace	HSV			12 088,60	69
Cena celkem					17 580,40	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 28	ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce)
R:	1	ZL 28 - Betonové prvky v trávě - dosypy podkladní vrstvy (práce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 491,80
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	33,18310	98,20	3 258,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 33,18310		33,18310		
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	33,18310	67,30	2 233,22
		Betonové prvky v trávě dle SoD - S6 : (651*0,1)		65,10000		
		Odpočet odkopávek v zeleném dle ZL 10 : -(319,169*0,1)		-31,91690		

Díl: 5		Komunikace				12 088,60
3	564782111RHBHv	Podklad z kam.drceného 10 cm bez dodávky materiálu - kalkulace rozpostření dle ZL4	m2	331,83100	36,43	12 088,60
		Betonové prvky v trávě dle SoD - S6 : 651		651,00000		
		Odpočet odkopávek v zeleném dle ZL 10 : -319,169		-319,16900		
		Mezisoučet		331,83100		

Protokol o zkoušce č. č: 0821 V221003/K04


Naše značka: 190/22/Kr

Strana: 1/1

ROZBOR PODLOŽNÍ ZEMINY - STANOVENÍ ZRNITOSTI, VLHKOSTI A KONZISTENČNÍCH MEZÍ

Objednatel:	FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno		
Název zakázky:	Znojmo, Rekonstrukce lokality Kolonka, materiál pro zásyp		
Číslo zakázky:	č: 0821 V221003/K04		
Odebral:	J. Chytrý	Datum:	05.04.2022
Zkoušel:	p. Bundálek, Ing. Navrátilová	Datum:	8.-14.4.2022

Stanovení zrnitosti zemin - ČSN EN ISO 17892-4, kap. 5.2., 5.3

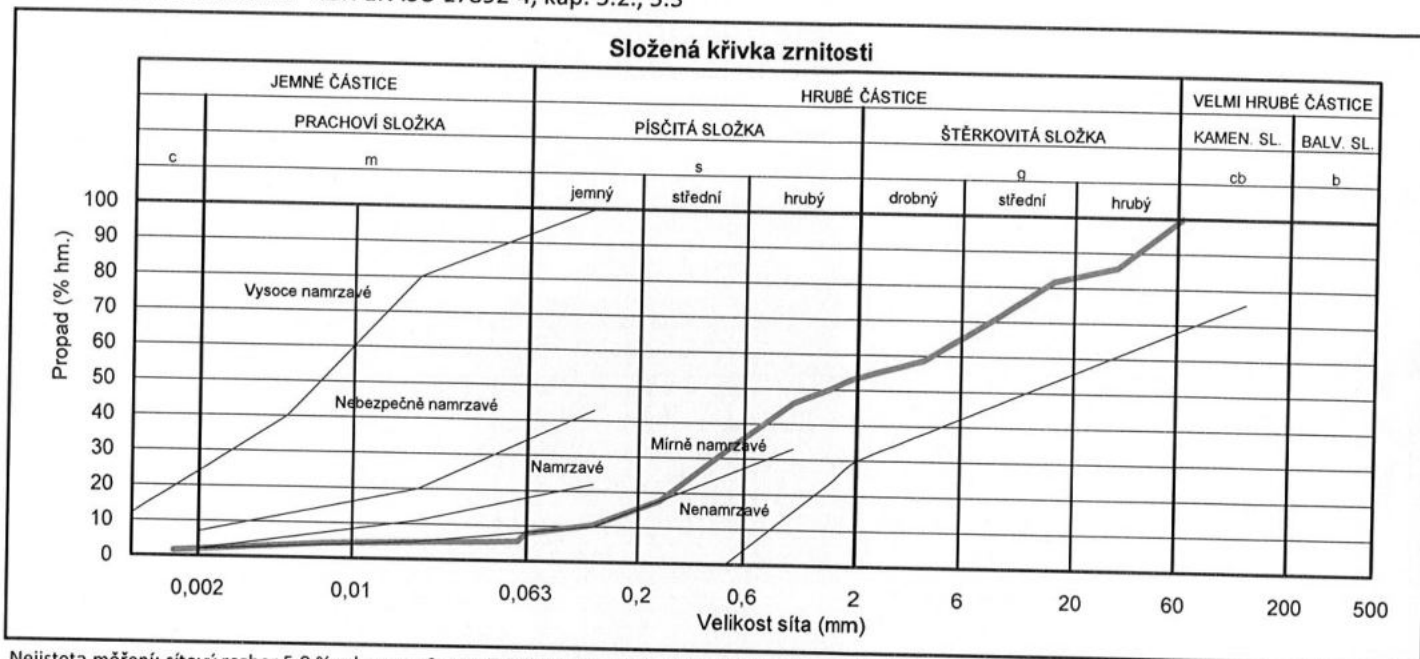

Nejistota měření: síťový rozbor 5,0 % rel. zrna < 2 mm, 7,0 % rel. zrna 2 až 8 mm, 9,0 % rel. zrna 11 až 32 mm, 6 % rel. vlhkost, 6 % rel. mez tekutosti, 5 % rel. mez plasticity, 7 % rel. číslo plasticity je uváděna jako rozšířená s koeficientem $k = 2$, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 %.

Sonda	Znojmo	
Staničení / jízdní pruh (km)	Kolonka	
Hloubka odběru (m)		
Číslo vzorku	22142	
Aktuální vlhkost (%)	ČSN EN ISO 17892-1	4,51
Mez tekutosti (%)	ČSN 72 1014:2005, met. A,B	-
Mez plasticity (%)	ČSN 72 1013:2005	-
Číslo plasticity	ČSN 73 6133	-
Konzistence	ČSN 73 6133	-
Namrzavost	ČSN 73 6133	mírně namrzavé
Klasifikace	ČSN 73 6133	S3-S-F
Klasifikace	ČSN EN ISO 14688-2	grSa
Vhodnost do aktivní zóny	TP 146	podmínečně vhodné
Vhodnost do zásypu	TP 146	vhodné

S3 S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy

Vysvětlivky: P, L pravá, levá strana

ZÚ, KÚ začátek, konec úseku

DL délka úseku

Zkušební laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznámá schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak, než celý.

Výtisk číslo:	1 2 3
Protokol vypracoval:	Ing. Vlastimil Suchyňa
Protokol schválil:	Mgr. Jiří Krésa - vedoucí laboratoře
Datum vystavení protokolu:	14.04.2022



**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 29**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Dosypání podkladních vrstev pod plochy dětských hřišť.			
Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí TDS a AD, bude pod plochy dětských hřišť, jako podsypový materiál pro vyrovnání výškové úrovně použit vytěžený štěrkopísek ze středové komunikace. Tento materiál je podměnečně vhodný do aktivní zóny, čili může nasákat vodu a promrzáním měnit objem. Dle vyjádření TDS, lze i tak použít, zhotovitel upozorňuje, že v místech kde bude proveden tento podsyp nebude brán na případné reklamace zřetel. V případě, že materiál nebude dostačovat, bude doplněn novým nakupovaným materiálem, který bude zohledně novým ZL.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	29 905,42,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	17 580,4,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	6 280,14,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	36 185,56,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	2 dny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	2 dny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	3.5.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	3.5.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	3.5.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	3.5.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	3.5.2022	
přílohy	Přílohy: č.1 - Rozpočet změny č.2 - Rozbor podloží zeminy		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt: ZL - 29 ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce)
Rozpočet: 1 ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce)

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
 66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628
 Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628
 60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			29 905,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 905,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 905,42 CZK
Základní DPH	21 %	6 280,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **36 185,56 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 29 - ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce)

Popis rozpočtu: 1 - ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 951,33	23
5	Komunikace	HSV			22 954,09	77
Cena celkem					29 905,42	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 29	ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce)
R:	1	ZL 29 - Plochy pro hřiště - dosypy podkladní vrstvy (práce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 951,33
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	42,00200	98,20	4 124,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 42,00200		42,00200		
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	42,00200	67,30	2 826,73
		Plocha dětského hřiště - dle PD : 420,02*0,1		42,00200		
		Mezisoučet		42,00200		
Díl: 5		Komunikace				22 954,09
3	564782111RHBHv	Podklad z kam.drceného 15 cm bez dodávky materiálu - kalkulace rozpostření dle ZL4	m2	420,02000	54,65	22 954,09
		Plocha dětského hřiště - dle PD : 420,02		420,02000		
		Mezisoučet		420,02000		


Protokol o zkoušce č. č: 0821 V221003/K04

Naše značka: 190/22/Kr
Strana: 1/1

ROZBOR PODLOŽNÍ ZEMINY - STANOVENÍ ZRNITOSTI, VLHKOSTI A KONZISTENČNÍCH MEZÍ

Objednatel:	FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno		
Název zakázky:	Znojmo, Rekonstrukce lokality Kolonka, materiál pro zásyp		
Číslo zakázky:	č: 0821 V221003/K04		
Odebral:	J. Chytrý	Datum:	05.04.2022
Zkoušel:	p. Bundálek, Ing. Navrátilová	Datum:	8.-14.4.2022

Stanovení zrnitosti zemin - ČSN EN ISO 17892-4, kap. 5.2., 5.3

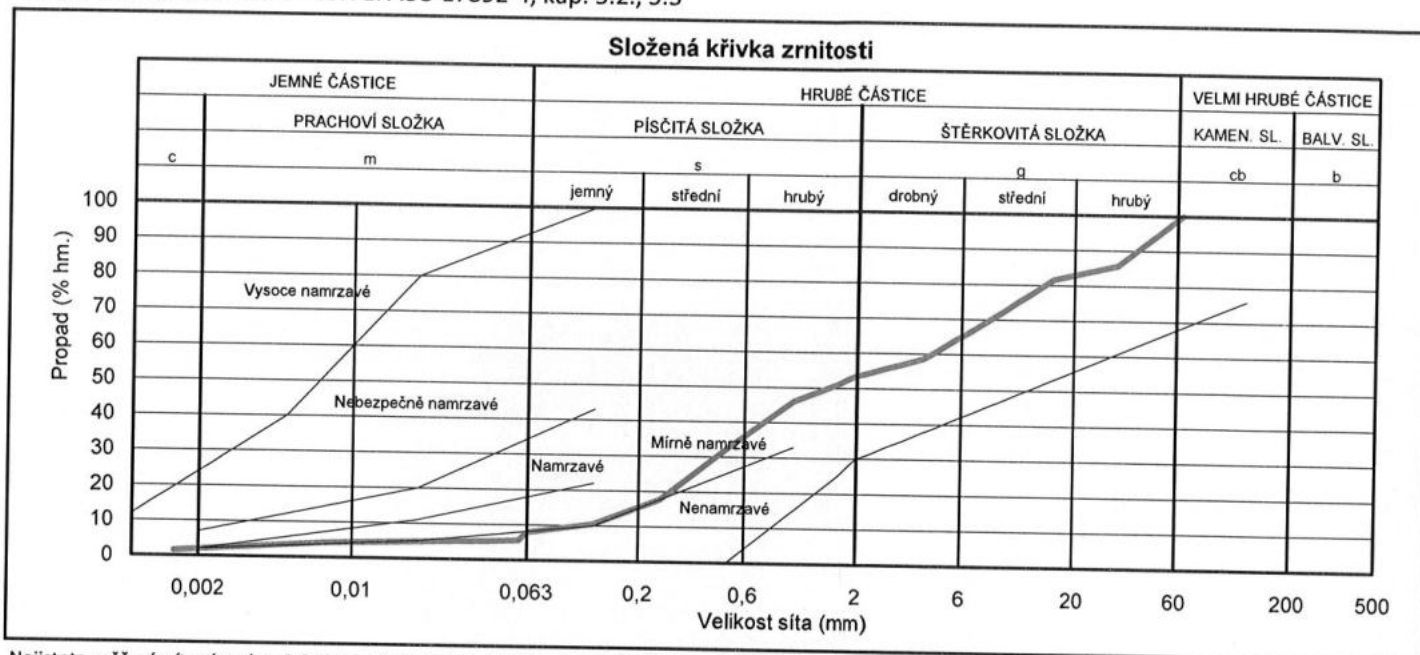

Nejistota měření: síťový rozbor 5,0 % rel. zrna < 2 mm, 7,0 % rel. zrna 2 až 8 mm, 9,0 % rel. zrna 11 až 32 mm, 6 % rel. vlhkost, 6 % rel. mez tekutosti, 5 % rel. mez plasticity, 7 % rel. číslo plasticity je uváděna jako rozšířená s koeficientem $k = 2$, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 %.

Sonda	Znojmo	
Staničení / jízdní pruh (km)	Kolonka	
Hloubka odběru (m)		
Číslo vzorku	22142	
Aktuální vlhkost (%)	ČSN EN ISO 17892-1	4,51
Mez tekutosti (%)	ČSN 72 1014:2005, met. A,B	-
Mez plasticity (%)	ČSN 72 1013:2005	-
Číslo plasticity	ČSN 73 6133	-
Konzistence	ČSN 73 6133	-
Namrzavost	ČSN 73 6133	mírně namrzavé
Klasifikace	ČSN 73 6133	S3-S-F
Klasifikace	ČSN EN ISO 14688-2	grSa
Vhodnost do aktivní zóny	TP 146	podmínečně vhodné
Vhodnost do zásypu	TP 146	vhodné

S3 S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy

Vysvětlivky: P, L pravá, levá strana ZÚ, KÚ začátek, konec úseku DL délka úseku

Zkušební laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků a/nebo měřeného místa a protokol neznamena schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak, než celý.

Výtisk číslo:	1 2 3
Protokol vypracoval:	Ing. Vlastimil Suchyňa
Protokol schválil:	Mgr. Jiří Krása - vedoucí laboratoře
Datum vystavení protokolu:	14.04.2022



**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 30**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Změna povrchu a tedy i skladby části komunikace dle PD z 29.4.2022			
Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí investora, provedl AD na části komunikace od ulice Jugoslávská směrem k centrální ploše lokality Kolonka, záměnu původního mlatového povrchu za povrch z kamenného odseku. V tomto, ZL byla také odečtena plocha nerealizovaného kamenného odseku u pítka.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	86 804,75,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	86 804,75,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	18 229,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	105 033,75,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:	7 dní	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	7 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	10.5.2022	Raab
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	10.5.2022	Borek
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	10.5.2022	Křemeček
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	10.5.2022	Todorov
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	10.5.2022	Malačka
přílohy	Přílohy: č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt:	ZL - 30	ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské
Rozpočet:	1	ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské
Objednatel:	Město Znojmo IČO: 00293881 Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 66902 Znojmo	
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 60200 Brno-Trnitá	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			86 804,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			86 804,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	86 804,75 CZK
Základní DPH	21 %	18 229,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	105 033,75 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 30 - ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské

Popis rozpočtu: 1 - ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 269,34	6
5	Komunikace	HSV			81 535,41	94
Cena celkem					86 804,75	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 30	ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské
R:	1	ZL 30 - Změna skladby mlat/odsek komunikace k Jugoslávské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 269,34
1	122201402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 odstranění zeminy	m3	8,74100	163,61	1 430,12
		Odkopávka dle změny komunikace : 87,41*0,1		8,74100		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, odvoz zeminy na skládku	m3	8,74100	130,32	1 139,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,74100		8,74100		
3	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku	m3	8,74100	308,90	2 700,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,74100		8,74100		
Díl: 5		Komunikace				81 535,41
4	591 05 *S1*	Minerální beton tzv. mlat - kompletní skladba	m2	-87,41000	737,01	-64 422,04
		; ve skladbě				
		; obrubník tl. 100 mm o rozměru 1000/250 mm + 500/250				
		; spára 20 mm - založ.trávník ornice s drtí				
		; lože dlažby z drtí fr.4-8mm tl.50 mm				
		; štěrkopísek tl.150 mm				
		; geotextilie				
5	591 05 *S2*	Dlažba - žulový odsek - kompletní skladba	m2	76,88000	1 898,51	145 957,45
		Přípočet změny rozsahu : 87,41		87,41000		
		Odpočet nerealizovaného odseku u pitka : -10,53		-10,53000		

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 31**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Změna rozsahu kontejnerových stání dle situace z 29.4.2022			
Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí investora, provedl AD změnu návrhu a rozsahu ploch pro kontejnerová stání. Zhotovitel provedl přepočty zpevněných ploch pod tyto kontejnerová stání a provedl aktualizaci plochy betonové dlažby na celé stavbě.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-127 151,91,-
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-127 151,91,- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-26 701,90,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-153 853,81,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:	Bez vlivu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab		3.5.2022
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek		3.5.2022
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček		3.5.2022
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov		3.5.2022
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka		3.5.2022
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
Objekt:	ZL - 31	ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání
Rozpočet:	1	ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-127 151,91
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-127 151,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-127 151,91 CZK
Základní DPH	21 %	-26 701,90 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-153 853,81 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 31 - ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání

Popis rozpočtu: 1 - ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 110,99	-15
5	Komunikace	HSV			-146 262,90	115
Cena celkem					-127 151,91	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 31	ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání
R:	1	ZL 31 - Zemní práce a zpevněné plochy pro kontejnerová stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 110,99
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	18,47500	229,06	4 231,88
		Rumunská : (32,5-11,3)*0,25		5,30000		
		Jugoslávská : (29,2-12,8)*0,25		4,10000		
		Slovenská : 36,3*0,25		9,07500		
2	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 odstranění zeminy	m3	14,78000	163,61	2 418,16
		Rumunská : (32,5-11,3)*0,2		4,24000		
		Jugoslávská : (29,2-12,8)*0,2		3,28000		
		Slovenská : 36,3*0,2		7,26000		
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	27,71250	98,20	2 721,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,47500*0,5		9,23750		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,47500		18,47500		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, odvoz zeminy na skládku	m3	14,78000	130,32	1 926,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,78000		14,78000		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	18,47500	67,30	1 243,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,47500		18,47500		
6	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku	m3	14,78000	308,90	4 565,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,78000		14,78000		
7	181301117R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2	m2	46,18750	43,40	2 004,54
		18,475/0,4		46,18750		
Díl: 5		Komunikace				-146 262,90
8	591 05 *S5*	Skladba zpev. ploch chodníků - kompletní skladba	m2	-124,90000	1 171,04	-146 262,90
		Dle SoD : -704,00		-704,00000		
		Dle skutečnosti vč. návrhu popelnicových stání ze dne 29.4.2022 : 579,1		579,10000		
