

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 43**

<b>Předmět díla:</b>	<b>Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo</b>		
<b>Objekt:</b>	SO 01 – Stavební část		
<b>Objednatel:</b>	Město Znojmo		
<b>Zhotovitel:</b>	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
<b>TDI:</b>	Znojmoinvesta, s.r.o.		
<b>Projektant:</b>	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
<b>Popis změny:</b> Požadavek investora na zhotovení psích pisoárů, dle obdobných již realizovaných v park C2			
<b>Odůvodnění změny:</b> Požadavek investora na zhotovení psích pisoárů.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	<b>Jedná se o změnu:</b> (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	<b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.:</b> (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b> (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	53 373,53,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	53 373,53,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	11 208,44,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	64 581,97,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>	<b>bez dopadu</b>	
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	<b>bez dopadu</b>	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	16.8.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	16.8.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	16.8.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	16.8.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	16.8.2022	
<b>přílohy</b>	<b>Přílohy:</b>		
	č.1 - Rozpočet změny č.2 – PD změny		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **22030202      Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL**

**Objekt:**                    **ZL - 43                    ZL 43 - Dodávka a montáž psího močítka**

**Rozpočet:**                **1                            ZL 43 - Dodávka a montáž psího močítka**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Znojmo</b> <b>Obroková 1/12</b> <b>66902                    Znojmo</b>	<b>IČO: 00293881</b> <b>DIČ: CZ00293881</b>
--------------------	---	--

<b>Zhotovitel:</b>	<b>FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.</b> <b>Mlýnská 388/68</b> <b>60200                    Brno-Trnitá</b>	<b>IČO: 25317628</b> <b>DIČ: CZ25317628</b>
--------------------	---	--

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			53 373,53
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>53 373,53</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>53 373,53 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>11 208,44 CZK</b>

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>64 581,97 CZK</b>
--------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 43 - ZL 43 - Dodávka a montáž psího močítka

Popis rozpočtu: 1 - ZL 43 - Dodávka a montáž psího močítka

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 383,42	4
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			6 110,11	11
7671	Mobiliář	HSV			44 880,00	84
Cena celkem					53 373,53	100


### Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 43	ZL 43 - Dodávka a montáž psiho močítka
R:	1	ZL 43 - Dodávka a montáž psiho močítka



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>2 383,42</b>
1	133 10-001	Hloubení šachet a rýh v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku vč. poplatku	m3	0,70000	3 404,88	2 383,42
		Výkop pro osazení : 0,5*0,5*0,7*4		0,70000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy, zvláštní zakládání</b>				<b>6 110,11</b>
2	274 31-003	Základový blok, pás z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	0,70000	8 728,73	6 110,11
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,70000		0,70000		
<b>Díl: 7671</b>		<b>Mobiliář</b>				<b>44 880,00</b>
3	7671R01	D+M Žulový leštěný sloupek dle výkresu - kamenný psí pisoár	ks	4,00000	11 220,00	44 880,00



## KAMENNÝ PSÍ PISOÁR - POHLED:

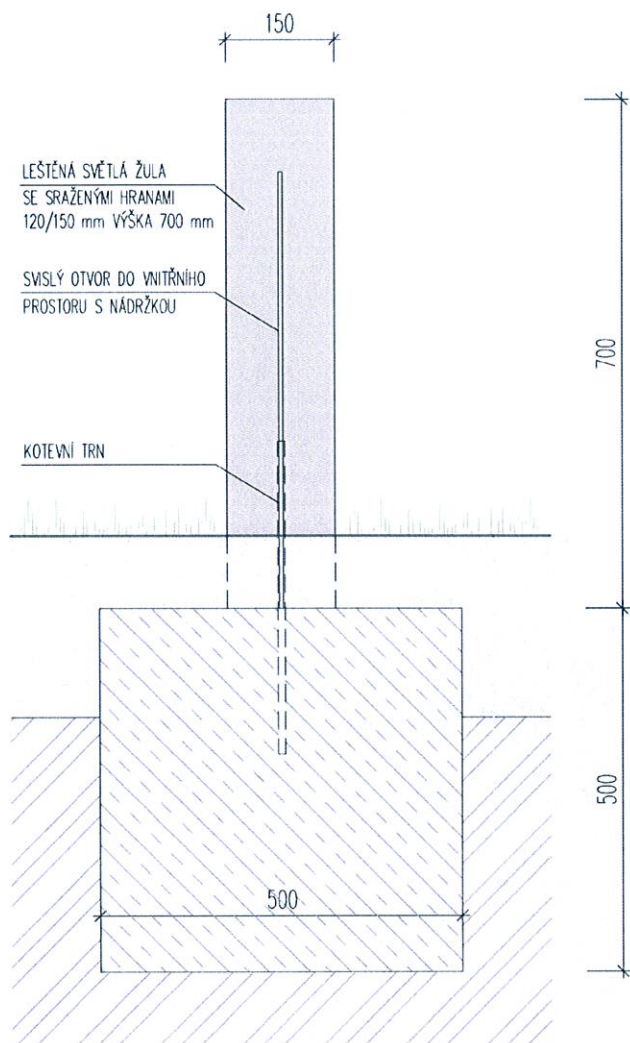

## KAMENNÝ PSÍ PISOÁR - PŮDORYS:

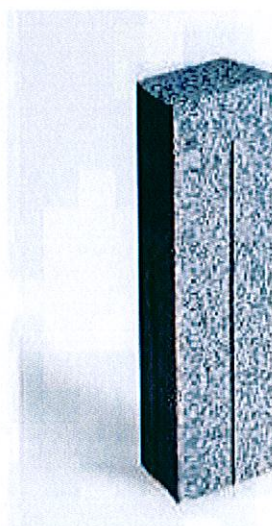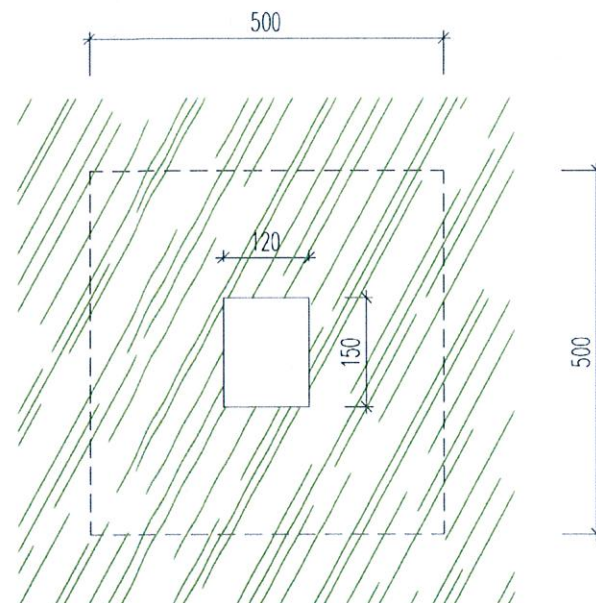

## KAMENNÝ PSÍ PISOÁR - POPIS:

- PROVEDENÍ V LEŠTĚNÉ SVĚTLÉ ŽULE SE SRAŽENÝMI HRANAMI. VE SPODNÍ ČÁSTI PROVEDENÝ KOLMÝ ZÁŘEZ SLOUŽÍCÍ PRO ZAKOTVENÍ DO BETONU.
- PO OBVODU JSOU UMÍSTĚNÝ SVISLÉ OTVORY DO VNITŘNÍHO PROSTORU, KDE SE NACHÁZÍ ZÁCHYTNÁ NÁDRŽKA.
- ROZMĚRY: 120X150 MM, VÝŠKA 700 MM, VÁHA 35 KG.

## LEGENDA MATERIÁLŮ:



autor: Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Petr Todorov, Ing. arch. Michal Řičný  
 vypracoval: Ing. arch. Nina Kákošová  
 spolupráce: Ing. arch. Nina Kákošová, Bc. Johana Krejčí  
 lokalita: Znojmo  
 zadavatel: město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22, Znojmo

název: REKONSTRUKCE LOKALITY KOLONKA, ZNOJMO  
 KAMENNÝ PSÍ PISOÁR

stupeň: VD  
 datum: 05 / 2021

měřítko  
 1:10

příl. č. paré
