

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ „TER“ (Technicko-ekonomické rady) č. 2

**AKCE** : Zateplení objektu Základní školy v Holicích, objekt čp. 47 na pozemku s parc. č. 595  
**DATUM** : 04. 04. 2014  
**PŘÍTOMNI** : viz. prezenční listina


V rámci jednání byl se zástupci objednatele projednáno následující:

### 1. Hlavní vstup do objektu:

- Boční skleněné stěny budou demontovány a nahrazeny copolitovou stěnou v hliníkovém rámu. Sklo copolitů bude vyztuženo drátem


Schváleno: ANO / NE

- Vránci projektu budou vyměněny i lapače dešťových splavenin v blízkosti opěrných stěn hlavního schodiště

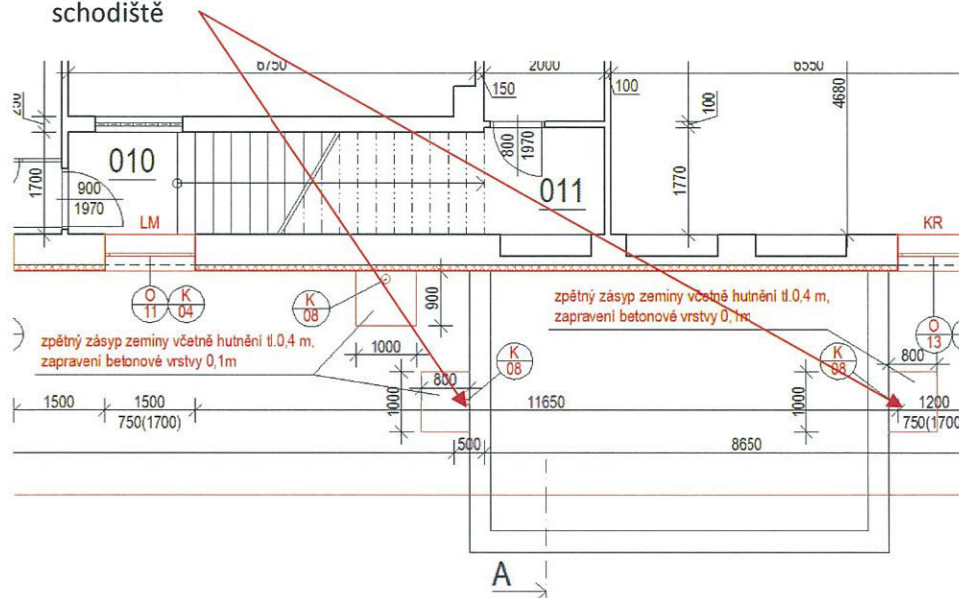


Schváleno: ANO / NE

- Zasklení výplní venkovní dveří a přilehlých výkladců bude takto:

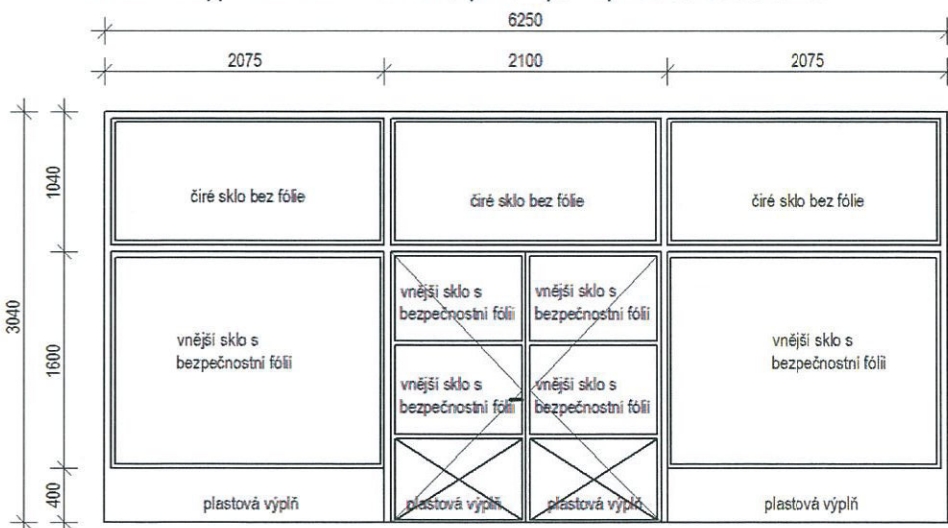

Schváleno: ANO / NE

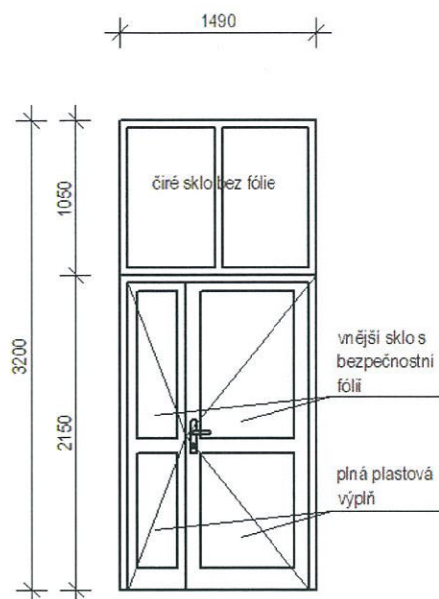

Schváleno: ANO / NE

- Hlavní vchodové dveře opatřit systémem otevírání na čipovou kartu:

Schváleno: ANO / NE

2. Barevné řešení fasády:

- Stará budova: byly předloženy 4 varianty barevného řešení fasády. Pokud investor s návrhy nesouhlasí, žádám o zaslání požadavku.

**Vyjádření investora:**

- Nová budova: byl předložen návrh členění fasády z velké části odpovídající stávajícímu barevnému řešení. Investor souhlasí s předloženým barevným řešením:

Schváleno: ANO / NE

3. Způsob řešení opravy zadního venkovního schodiště (vstup do MŠ):

- Byla předložena navrhovaná varianta opravy schodiště pomocí kamenného schodiště. Investor s tímto řešením souhlasí:

Schváleno: ANO / NE

4. Vnitřní okenní žaluzie na vybraných oknech:

- Byly předloženy dva návrhy řešení žaluzií, vnitřní nebo meziskelní žaluzie. Investor si vybral vnitřní okenní žaluzie

Schváleno: ANO / NE

5. Obložení na chodbách:

- Projektantka se domnívá, že při demontáži oken a dalších stavebních prací souvisejících s projektovaným záměrem, bude poškozeno vnitřní obložení stěn na chodbách. Je na zvážení investora, jestli bude obložení demontováno způsobem umožňujícím zpětnou montáž nebo bude zvolena jiná varianta. Předem upozorňuji na to, že se demontáž nemusí povést bez mechanického poškození obložení

**Vyjádření investora:**

6. Dveře na půdě:

- Jelikož se na půdě v požárních příčkách nacházejí protipožární dveře, budou v ploše zateplené podlahy půdy vynechány prostory umožňující bezpečné otevírání dveří. Díky tomu vzniknou rozdílné výšky podlah a schod o výšce 240mm. Nové hrany rozdílných úrovní podlah budou zvýrazněny dle bezpečnostních požadavku.

**Vyjádření investora:**

Vyjádření investora bude zohledněno při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 07.04. 2014

Zapsala (za projektanta):

Schválil (za investora):






**DABONA s.r.o.**  
Sokolovská 682  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
FAX: +420 494 322 044  
Tel.: +420 494 531 538  
E-mail: [dabona@dabona.eu](mailto:dabona@dabona.eu)   
středisko 2  
IČ 64826996  
DIČ CZ64826996

*Proj. Marková*

---

## PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ TER č.2

STAVBA : Zateplení objektu Základní školy v Holících,  
Objekt čp. 47 na pozemku s parc. č. 595  
DATUM : 04. 04.2014  
PŘÍTOMNI :

| FIRMA         | JMÉNO                     | TEL.<br>E-MAIL                            | PODPIS  |
|---------------|---------------------------|---|---|
| Dabona s.r.o. | Ing. Světlana Trejtnarová | trejtnarova@dabona.eu<br>+420 734 548 031 |  |
| MĚSTO HOLICE  | FR. ČAPEK                 | 604 628 862<br>CAPEK@MESTOHOLICE.CZ       |  |
| - II -        | RENATA<br>ŠEBKOVÁ         | 730 892 846<br>sebkova@mestaholice.cz     |  |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
|               |                           |   |   |
