

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Údlice

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

2013 / 049

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Údlice**
sídlo: Náměstí 12, 431 41 Údlice
zastoupený: Ing. Miloš Pavlík – starosta obce
IČ: 00262153
DIČ: CZ00262153
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 3528441/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **ABC Chomutov spol. s r.o.**
sídlo: Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
jednající: Ing. Stanislav Lesák, jednatel
IČ: 44566760
DIČ: CZ44566760
bank. spojení: KB Chomutov a.s., Chomutov
č. účtu: 541844441 / 0100
společnost zapsaná v: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava článku **V. Doba provádění díla**, smlouvy o dílo uzavřené dne^{8.7.2013} (dále jen Smlouva). Smluvní strany přistupují k úpravě tohoto článku z důvodu prodloužení zadávacího řízení, na jehož základě není možné dodržet termín zahájení díla, a proto se termín plnění posunuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro niž nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

2. **Článek V. Smlouvy, bod 4** se tímto dodatkem mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo bez vad objednateli nejpozději v těchto závazných termínech:

zahájení prací: 15. 7. 2013

ukončení prací: 14. 12. 2013

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet dílčí termíny jednotlivých etap projektu:

I. etapa - Zahájení 15. 7. 2013

Ukončení 6. 9. 2013

Předmětem plnění I. etapy projektu na dotčeném objektu je demontáž původních otvorových výplní. Následně budou osazeny nová okna (včetně příslušenství), dveře a vnitřní parapety. Nově instalované otvorové výplně budou řádně zednický začištěny a bude provedena výmalba. Dalším předmětem této etapy je zateplení stropu k suterénu minerální vatou.

II. etapa - Zahájení 15. 7. 2013

Ukončení 4. 10. 2013

Předmětem plnění II. etapy projektu je dodávka a montáž plynových tepelných čerpadel, plynových kondenzačních kotlů, včetně souvisejícího příslušenství a stavebních prací spojených s instalací spalovacích zdrojů v objektu ZŠ Údlice. Předmětem plnění je také instalace nového měření a regulace zdroje. V průběhu školní výuky (vyjma letních prázdnin) nebudou v pracovních dnech v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. probíhat žádné hlučné stavební práce, které by omezovaly školní výuku.

III. etapa - Zahájení 15. 7. 2013

Ukončení 14. 12. 2013

Předmětem plnění III. etapy projektu je na dotčeném objektu provedení veškerých dodávek a stavebních prací uvedených v projektové dokumentaci zpracované společností Energy Benefit Centre a.s., kromě prací a dodávek uvedených v I. a II. etapě. Zejména se jedná o následující činnosti:

- Zateplení svislých obalových konstrukcí
- Zateplení ploché střechy
- Bourací práce
- Klempířské práce
- Zednické práce
- Výkopové práce
- Hromosvod

3. **Článek V. Smlouvy, bod 5** se tímto dodatkem mění takto:

V průběhu školní výuky (2. 9. 2013 – 14. 12. 2013) nebudou v pracovních dnech v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. probíhat žádné hlučné stavební práce, které by omezovaly školní výuku. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované z venkovních prostor se zásobováním po fasádním lešení.

4. Tímto dodatkem se mění i **příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram projektu.**

II.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1 Harmonogram projektu

V Údlicích, dne 8.7.2013

V Chomutově dne: 8.7.2013


Objednatel:




Ing. Miloš Pavlík – starosta obce



Zhotovitel:




Ing. Stanislav Lesák - jednatel



FINANČNÍ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Stavba: **Snižení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Údllice**
 Investor: **Obec Údllice**
 Dodavatel: **ABC Chomutov spol. s r.o.**

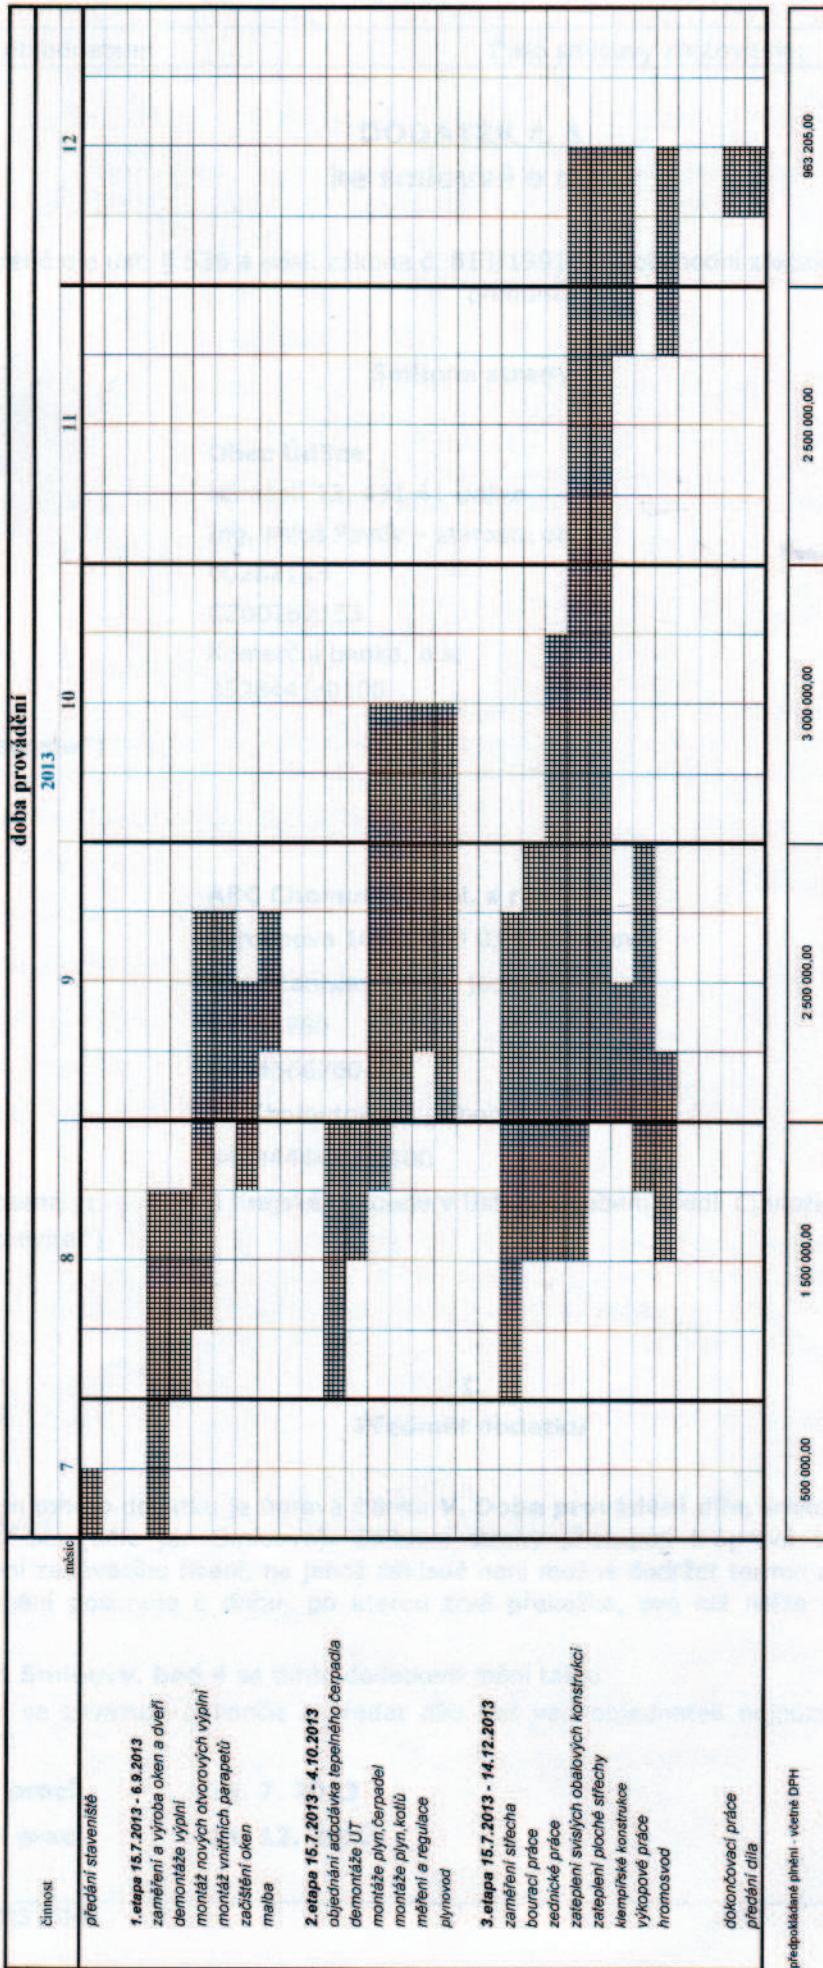

Celkem
10 963 205,00

předpokládané plnění - včetně DPH

V Chomutově dne:

ing. Stanislav Lesák



ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
 430 01 Chomutov, Škroupova 1059
