



S004P01E3NMG

Číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0145/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO HODONÍN“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:**ELVOREV s.r.o.**

Adresa:

Anenská 405/7

IČO:

63475219

DIČ:

DIČ: CZ63475219

Bankovní spojení:

27912002510300

Zastoupen:

Zdeňkem Pávkem - jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka
20354

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0126/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:
- 45 609 Kč bez DPH
9577,89 Kč DPH 21%
55 186,89 Kč vč. DPH 21%
- Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:
- 1 739 824 Kč bez DPH
365 363,04 Kč DPH 21%
2 105 187,04 Kč vč. DPH
- 2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení:

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu více prací

V Hodoníně, dne 28.8.2020

V^{Hodoníně} dne 28.8.2020

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:


Podpis:



.....
Libor Střecha
starosta města Hodonín



Podpis:



.....
Zdeňek Pávek
jednatel společnosti

Název akce:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO HODONÍN

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1
 „(škrábání stěn, vrtání průrazů)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2020/0145/150

1. **Oddíl stavby:** (MŠ Pr. Veselého, SO02)
2. **Zpracovatel změnového listu:** ELVOREV s.r.o., Anenská 405/7, 695 35 Hodonín
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. 1, datum 4.8.2020)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. 3, ze dne 4.8.2020)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (položkový rozpočet)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
 Stará výmalba ve 2NP a 1NP o výměře 253m², nedostatečně drží na stěně, proto je nutné oškrábání stěn, penetrace před stěrkováním a následné přestěrkování stěrkou. Provrtání prostupů přes betonové průvlaky v 1PP pro kabeláž z důvodů nízkých stropů.
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
 Odstranění staré výmalby, napenetrování před stěrkováním stěn a následné stěrkování stěrkou. Provrtání prostupů přes betonové průvlaky pro kabeláž z důvodů nízkých stropů.
6. **Finanční náklady změny**
 (položky dle rozpočtu v SoD a nově doplněné dle RTS)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	45 609,00	55 186,89
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 694 215,00	2 050 000,15
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 739 824,00	2 105 187,04

v Hodoníně dne 5.8.2020

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrola souladu změny zejména se:

- *zadávací dokumentací VZ*- vícepráce nebyly v PD obsaženy
- *Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo) – ANO (zakázka malého rozsahu)*
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd) – bude řešeno **dodatkem k SoD***
- *podmínkami dotačního programu – akce bez dotace*

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) :

- *Úprava harmonogramu stavby - NE*
- *Dodatek IZ - NE*
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - NE*
- *Dodatek Smlouvy o dílo - ANO*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) - NE*

Doporučení

TDS odsouhlasuje rozsah uvedených víceprací ve změnovém listu a přílohách, včetně nasazení jednotkových cen a doporučuje jejich schválení.

V HODOLÍPĚ dne 5. 8. 2020.....

(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Při průzkumu a zpracování PD nebylo zřejmé, že stávající výmalbu bude nutno oškrábat a stěny následně penetrovat a stěrkovat.
Provedení kabeláže v 1. pp s využitím prostupů zhotovených v betonových průvlacích se při realizaci projeví jako vhodnější oproti uložení vodičů do stěny, která je opatřena sanační omítkou (což taktéž při průzkumu a zpracování PD nebylo zřejmé). Navržené řešení je po odsouhlasení statikem technicky možné.

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V HODOLÍPĚ dne 5. 8. 2020.....

(jméno, podpis)

8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Úpravami dochází ke zkvalitnění a prodloužení životnosti vnitřních povrchových úprav

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH). Vícepráce vedou k navýšení celkové ceny díla - bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

a) Návrh finančního krytí:

FI:

Provozní náklady PO: 0

Rozpočet MH – ORJ 150, ORG 588 124 512

Dotace EU/SR: 0

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hoděšovicích dne 15. 8. 2020

(jméno, podpis)

VEDOUCÍ ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

9. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Příloha č. 2 položkový rozpočet

Příloha č. 3 fotodokumentace

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č. 1	Název Změnového listu	celková částka
	„(škrábání stěn, vrtání průrazů)“	
Rozpis částky na roky:	2020	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	0150	588 124 512		2 105 187,04

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:


příkazce operace:	datum:	jméno:	po
správce rozpočtu:	datum:	jméno: <i>Marcela Meráz</i>	po

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Výkaz výměr

16-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pr. Veselého 38 Hodonín
SO.02	MŠ Pr. Veselého 38, Hodonín
R. D.4	Stavební zapravení a výmalby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy								
	97104-2141	vybourání otvoru do betonového stropu - do R=60mm, tl. do 300mm	ks					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t					
Díl: 784 Malby								
4	784191101R00	Penetrace podkladu univerzáln 1x	m2					
5	784402801R00	Oškrábání malby do 3,8m, jakýkoliv počet vrstev	m2					
6	602011147	Stěrka sádrová, tl.2mm, ručně	m2					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t					

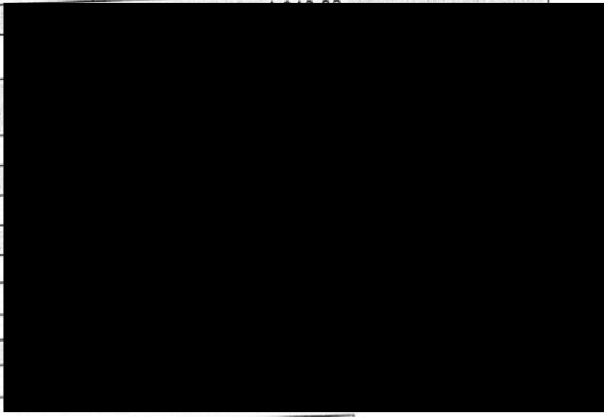

Celkem 45 609,00

Poznámky uchazeče k zadání

