



S004P01LYJLV

Číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0125/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě na dodávku a montáž movitých věcí

uzavřený podle ust. 2586 a násl. a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na akci s názvem:

**„Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské Důbravy –
rekonstrukce objektu centra ekologické výchovy – PS 02 - INTERIÉR“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Město Hodonín

Sídlo:

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IČO:

00284891

DIČ:

CZ699001303

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. účtu:

424671/0100

zastoupený:

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Dodávka a montáž interiérů s.r.o.

Adresa:

Příkop 843/4 602 00 Brno, Zábřovice

IČO:

10862722

DIČ :

CZ10862722

Bankovní spojení:

KB číslo účtu 123-5515750217/0100

Zastoupen:

Jan Huliák

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 123170

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu na dodávku a montáž movitých věcí č. SD/2023/0125/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce), uvedených ve Změnovém listu č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy v návaznosti na úpravu ceny dle dodatku č. 1 smlouvy.
- 2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1:
- 26 850 Kč bez DPH
5 638,50 Kč DPH 21%
32 488,50 Kč vč. DPH 21%
- 2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1:
- 78 500 Kč bez DPH
16 485 Kč DPH 21%
94 985 Kč vč. DPH 21%
- 2.4. Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 upravuje v návaznosti na dodatek č. 1 smlouvy následovně:
- 1 747 080 Kč bez DPH
366 886,80 Kč DPH 21%
2 113 966,80 Kč vč. DPH
- 2.5. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 7. 11. 2023, usnesení č. 1647

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. příloh

V Hodoníně, dne **09. 11. 2023**

Objednatel

Razítko:

Podpis:




.....
I
staro

V Brně, dne **09. 11. 2023**

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:



.....
Jan Huliák
jednatel

Název akce:

**Návštěvnícké středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské Důbravy –
rekonstrukce objektu centra ekologické výchovy – PS 02 - INTERIÉR**

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 01

„Úpravy v průběhu realizace interiéru“

zpracovaný v souladu s Kupní smlouvou č.: SD/2023/0125/150 ze dne 26. 6.2023

1. **Oddíl stavby:** PS 02 - INTERIÉR
2. **Zpracovatel změnového listu:** Dodávka a montáž interiéru, spol. s r.o., Brno
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
3.1. Soupis prací + průběžná konzultace s architektem stavby
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
Reakce na změny a upřesnění projektu.
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

D0 - Atypické výrobky

Pol. 3

V soupisu prací bylo původně počítáno se špalky k sezení s nízkými konferenčními stolky (A/3).

Dodány byly dubové sedačky (přírodní dřevo speciálně vybrané) kulaté stoly s podnoží z přírodního dřeva, opatřené kříži pro stabilitu stolu a uchycení 2 stolových kulatých desek z dubové spárovky 40 mm průměr 1000 mm.

Vícepráce: 5000,- Kč

Pol. 71

Akustické závěsy (A/8) byly zrušeny. (viz vyjádření projektanta).

Méněpráce: 54 000,- Kč

D1 – stoly

Pol. 8

V soupisu prací při VZ byly chybně vykázaný 3 ks kancelářských stolů s kontejnery (T/1). Skutečně byly dodány v souladu s výkresovou dokumentací 4 ks kancelářských stolů s kontejnery.

Vícepráce: 12 400,- Kč

D2 – židle

Pol. 15

Z provozních důvodů nastala nutnost koupit jednu kancelářskou židli (Z/1) navíc. Jedná se o požadavek investora.

vícepráce: 4 450,- Kč

D3 – policové systémy

Pol. 23

Dle požadavku projektanta bylo dohodnuto, že kovovou část polic nahradíme laminátovou s háčky pro sjednocení interiéru.

Tato změna je bez vlivu na cenu.

Pol. 24,25

Ocelové lanko u regálů (P/5, P/6) bude po dohodě s architektem nahrazeno závitovými tyčemi s matkami. Ke změně technologie došlo z důvodu stávajících heraklitových příček, které by neudržely zavěšení polic (150 kg zátěž).

Tato změna je bez vlivu na cenu.

Pol. 30,31

U kuchyňské linky nutno provést úpravy skříněk dle požadavku vodoinstalace a elektroinstalace (P/11). Kovové regály (P/12) budou nahrazeny laminátovými. Sklokeramická varná deska bude dle požadavku architekta zaměněna za nerezovou plynovou.

Tato změna je bez vlivu na cenu.

D4 - skříně

Pol. 35,36

U těchto položek došlo po dohodě s architektem ke změně technologie z důvodu snížení stropu. Snížení stropu neumožňuje vyrobit sestavy dle výkresové dokumentace. Typizované skříně a nástavce budou nahrazeny atypickými skříněmi. Z důvodu montáže (postavení skříně) musí být skříně ukončeny záslepkami výšky 100 mm a více. Po namontování vypínačů budou upraveny i obklady skříní na sílu 20 mm. Výsledkem uvedené změny jsou méněpráce: 14 000,- Kč

Pol. 38

V audiovizuálním sále dojde u skříňové sestavy (S/5) k úpravám dle zaměření, elektroinstalace a vzducho-techniky, k úpravám šířek skříní, obkladů a nástavců. Do skříně s elektro vybavením budou na přání dodavatele expozice odvrtny větrací mřížky.

vícepráce: 2 000,- Kč

D5 – sanitární vybavení

Pol. 41

Pro elektrické osoušeče rukou (H/2) nebyla v PD připravena elektroinstalace. Z toho důvodu nemohly být osoušeče namontovány a výrobky byly vráceny. Pro osoušení rukou budou použity pouze papírové utěrky v zásobnících, které jsou součástí PD.

méněpráce: 10 500,- Kč

Mimo smluvní rozpočet

Dle požadavku architekta bude navíc provedeno obložení okna v šatně (místn. č. 1.13), ostění vchodu z chodby (místn. č. 1.10) do místnosti 1.01 a ostění u výtahu v přízemí. Celkem se jedná o 3 m².

vícepráce: 3 000,- Kč

6. Finanční náklady změny

Nacenění bylo provedeno dle rozpočtu v SoD + individuální kalkulaci dodavatele

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	26 850,00	32 488,50
MÉNĚPRÁCE	78 500,00	94 985,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 798 730,00	2 176 463,30
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 747 080,00	2 113 966,80

V *Hodoníně* dne *6. 11. 2022*

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Změny vychází z průběžné konzultace s architektem stavby a z postupného zpřesňování stavebního řešení v průběhu stavby. TDS doporučuje změnový list č. 1 schválit.

Snížení ceny činí 51 650,- Kč bez DPH.,

TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1 = 105 350,- Kč bez DPH, což odpovídá 5,85% z ceny bez DPH dle KS.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.

V *Hodoníně* dne *6. 11. 2022*

– Prost Hodonín

8. Stanovisko generálního projektanta (GP), (autorského dozoru (AD)

Požaduji zrušení akustických závěsů v audiovizuálním sálu (Pol. 71 soupisu prací).

Všechny řešené změny vychází z mých požadavků v průběhu stavby. S uvedenými změnami souhlasím a doporučuji změnový list schválit.

V *Hodoníně* dne *6. 11. 2022*

– Létající inženýři

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listů č. 1 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí:

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

v Hodovčice dne 6.11.2022

VEDOUcí ODBORU:

v Hodovčice dne 6.11.2022

GARANT ODBORU:

v Hodovčice dne 6.11.2022

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce



Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2023/0125/150 ve znění dodatků č. 1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 1	
Rozpis částky na roky:	2023	-51 650 Kč bez DPH

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	651		-51 650 Kč bez DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: <u>6.11.2022</u>	jméno: 
správce rozpočtu:	datum: <u>6.11.2022</u>	jméno: 

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Půdorys interiér

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Důbrava - Dům přírody
Hodonínské Důbravy - mobiliář

Objekt:

02 - Nezpůsobilé náklady projektu

Soupis:

0271 - Mobiliář

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hodonín

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

duben 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH -51 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 650,00	21,00%	-10 846,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -62 496,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Důbrava - Dům přírody
Hodonínské Důbravy - mobiliář

Objekt: 02 - Nezpůsobilé náklady projektu

Soupis: **0271 - Mobiliář**

Místo: Město Hodonín

Zadavatel: Město Hodonín

Zhotovitel:

Datum: duben 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-51 650,00
	-51 650,00
OST - Ostatní	-49 000,00
D0 - Atypické výrobky	12 400,00
D1 - STOLY	4 450,00
D2 - ŽIDLE	0,00
D3 - POLICOVÉ SYSTÉMY	-12 000,00
D4 - SKŘÍNĚ	-7 500,00
D5 - SANITÁRNÍ VYBAVENÍ	

SOUPIS PRACÍ

Navrhl: Návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Důbrava - Dům přírody
Hodonínské Důbravy - mobiliář


Objekt: 02 - Nezpůsobilé náklady projektu

Soupis: **0271 - Mobiliář**

Místo:
Zadavatel: Město Hodonín
Zhotovitel:

Datum: duben 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-51 650,00
D	OST		Ostatní				-51 650,00
D	D0		Atypické výrobky				-49 000,00
2	K	Pol3	A/3_posezení_volné neformální posezení, 10 ks křesílek a 2 ks nízkých konferenčních stolků - dřevěné špalky viz ideový obrázek v příloze_m.č. 1.01	soub	1,000		
7	K	Pol71	A/8_akustické závěsy_garnýž ze smrkové biodesky s mechanizmem pro zavěšení závěsu (kolejnice) a kvalitní látkový závěs pro zlepšení akustických vlastností prostoru audiovizuálního sálu_m.č. 1.19	bm	20,000		
D	D1		STOLY				12 400,00
9	K	Pol8	T/1_kancelářský stůl_m.č. 1.02	kus	1,000		
D	D2		ŽIDLE				4 450,00
16	K	Pol15	Z/1_kancelářská židle_m.č. 1.01, 1.02	kus	1,000		
D	D3		POLICOVÉ SYSTÉMY				0,00
23	K	Pol23	P/4_police_m.č. 1.13	kus	0,000		
24	K	Pol24	P/5_police_m.č. 1.14	soub	0,000		
25	K	Pol25	P/6_police_m.č. 1.16	soub	0,000		
30	K	Pol30	P/11_sestava_m.č. 1.25	soub	0,000		
31	K	Pol31	P/12_police_m.č. 1.25	soub	0,000		
D	D4		SKŘÍŇĚ				-12 000,00
35	K	Pol35	S/2_skříňová sestava_m.č.1.10	soub	1,000		
36	K	Pol36	S/3_skříňová sestava_m.č.1.10	soub	1,000		
38	K	Pol38	S/5_skříňová sestava_m.č.1.19	soub	1,000		
D	D5		SANITÁRNÍ VYBAVENÍ				-7 500,00
40	K	Pol41	H/2_el.sušák_m.č.1.04, 1.07	kus	2,000		
			PRÁCE MIMO SMLUVNÍ ROZPOČET				
41	K	Mimosmluvní	Obložení v místn.1.13, ostění z místn.1.10 do 1.01 a ostění u výtahu	soub	1,000		

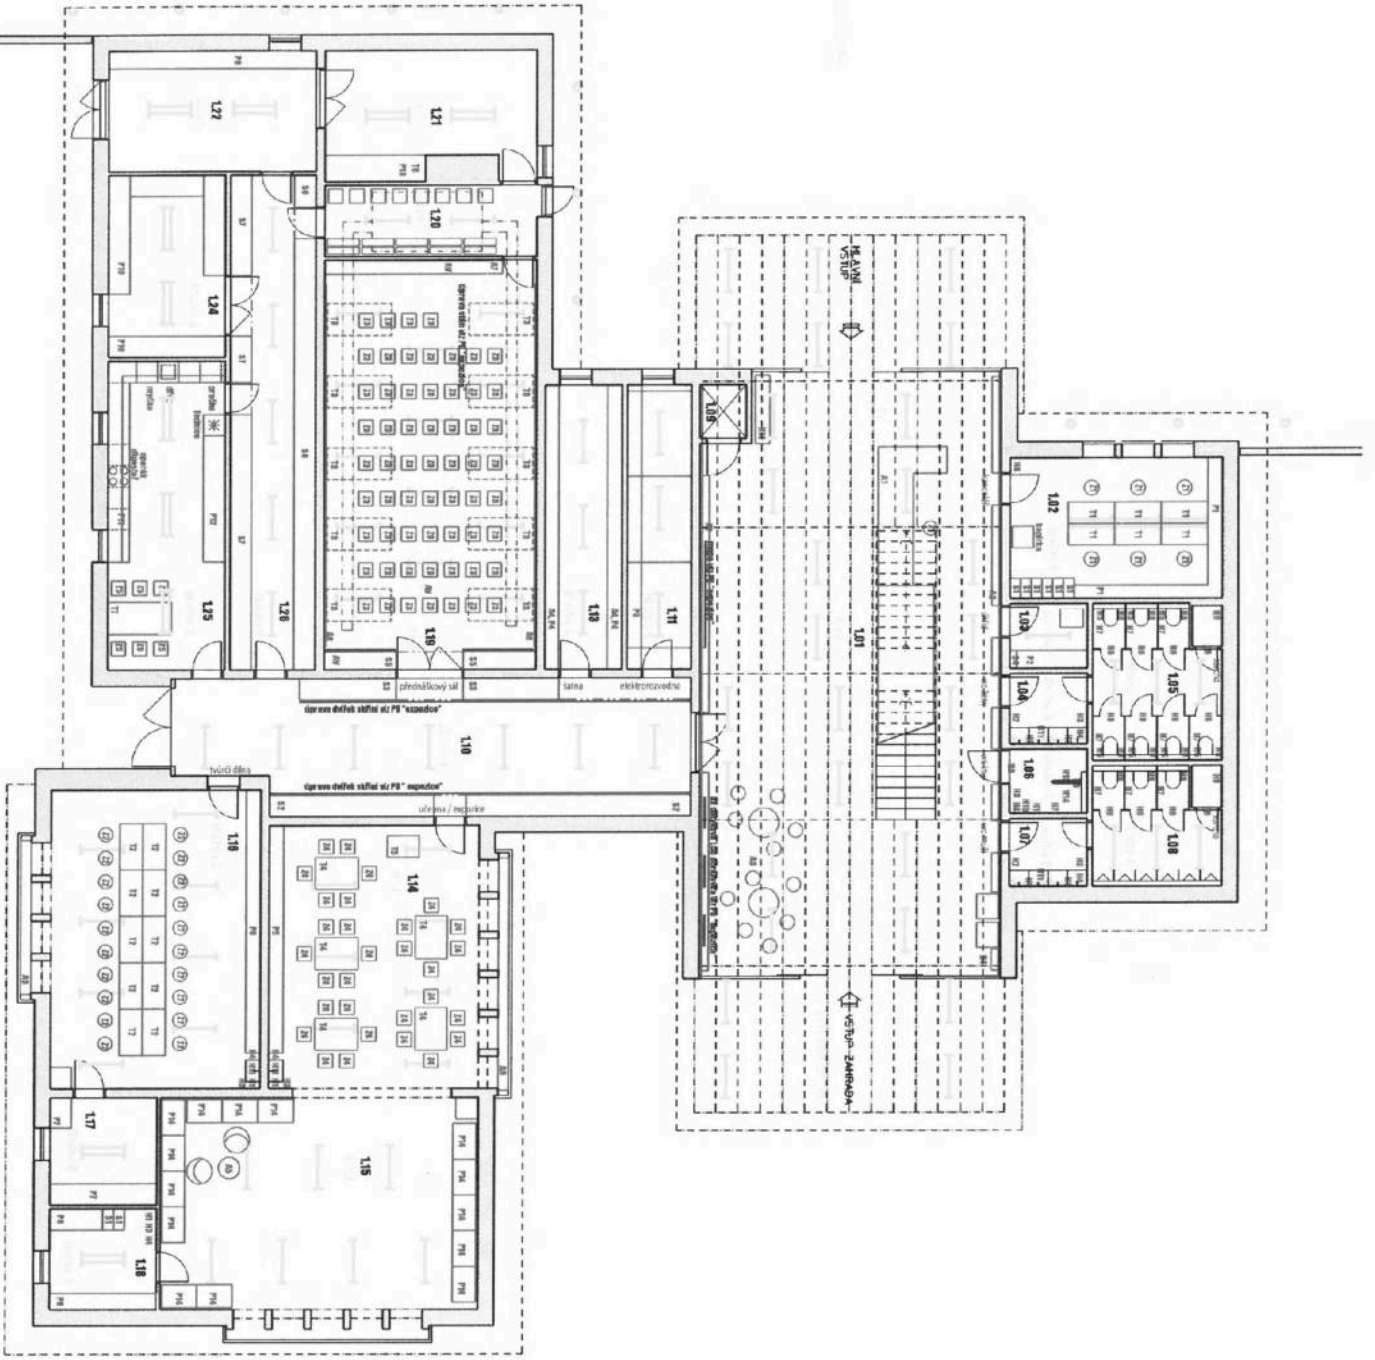

vybavení interiéru půdorys 1.np_m1/100_1
