

**Město Hodonín****DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Rekonstrukce povrchu hrací plochy vč. technologií na zimním stadionu v Hodoníně“**1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel: Město HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína;
[REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: „Sdružení FROST – service s. r. o. & H+H TECHNIKA“Správce společnosti:**H+H TECHNIKA, spol. s r. o.**

Sídlo: Čechyně 182, 683 01 Rousínov, ČR

IČO: 494 36 686

DIČ: CZ49436 686

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupen: Miloš Halas – jednatel společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C12029

Společník:**FROST – service, s.r.o.**

Sídlo: Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne

IČO: 31 645 640

DIČ: 2020442204

Bankovní spojení:

Zastoupen: Peter Slabý, konateľ spoločnosti

Spoločnosť je zapsaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Trenčíne, oddíl Sro, vložka 3288/R

/ďalej jen zhotoviteľ/

Objednatel a Zhotovitel společně ďalej také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ďalej jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0204/150 (ďalej jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 3. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy

2.2. Cena více/méně prací dle Změnového listu č. 1 činí:

Vícepráce 1.783.145,57 Kč bez DPH

Méněpráce - 16.819,31 Kč bez DPH

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 6 ZZVZ;

Vícepráce 0

Méněpráce - 453.562,70 Kč bez DPH

Změny závazku spadají pod § 222 odst.4 ZZVZ;

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ: **1,04 %** (limit je nižší jak 15 %)

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ: **4,03 %** (limit je nižší jak 30 %)

Celkové navýšení 1.312.763,56 Kč bez DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	1 783 145,57	2 157 606,14
MÉNĚPRÁCE	470 382,01	569 162,23
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	43 801 652,89	53 000 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	45 114 416,45	54 588 443,90

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

45.114.416,45 Kč bez DPH

9.474.027,45 Kč 21% DPH

54.588.443,90 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2.** Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 Změnový list č.1
- 3.3.** Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek č.1 uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek č.1 bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín
Datum usnesení: 14.7.2026

V Hodoníně, dne dle el. podpisu

V, dne dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

Libor Střecha
Digitálně podepsal Libor Střecha
Datum: 2026.07.30 11:23:37 +02'00'

.....
Libor Střecha
starosta města

 Digitálně podepsal Miloš Halas
Datum: 2026.07.29 15:54:39 +02'00'

.....
Miloš Halas
jednatel společnosti
H+H TECHNIKA, spol. s r. o.

Peter Slabý
Digitálně podepsal Peter Slabý
Datum: 2026.07.30 09:48:55 +02'00'

.....
Peter Slabý
konatel' společnosti
FROST – service s.r.o.

Název akce:

Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 001

„(Bourací práce - Ledová plocha)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0234/150

1. Oddíl stavby: 020 Bourání a zakládání

2. Zpracovatel změnového listu: Sdružení FROST - service s.r.o. + H+H TECHNIKA spol. s.r.o

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 kontrolní den: (KD č. 03, ze dne 12.05.2026)

3.2 jiné související dokumenty: fotodokumentace

4. Zdůvodnění a příčina změny:

- a) Při demoličních pracích na stávajících konstrukcích ledové plochy byla odkryta nová betonová plocha tl. 20cm, která obsahovala ocelový potrubní rozvod chlazení z trubek průměru 40mm. Tato plocha nebyla předmětem projektové dokumentace, protože projektant neměl vědomí, že pod stávajícími betonovými plochami se nachází ještě jedna plocha. Skutečnost nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace ani běžnou prohlídkou staveniště. Zjištění skutečného stavu by bylo možné pouze destruktivními zásahy do funkční ledové plochy, které nebylo možné provést vzhledem k provozu zimního stadionu. Zadavatel při přípravě veřejné zakázky postupoval s odbornou péčí, přesto nebylo možné tuto skutečnost objektivně předvídat. Jedná se o vícepráce oproti SoD. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o stavební práce přímo související s realizací původního předmětu plnění, které nemění účel ani charakter veřejné zakázky.
- b) Při demoličních pracích byla odhalena další podkladová vrstva tl. 20cm, mezi betonovými plochami, která nebyla předmětem PD a výkazu výměr. Skutečnost nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace ani běžnou prohlídkou staveniště. Zjištění skutečného stavu by bylo možné pouze destruktivními zásahy do funkční ledové plochy, které nebylo možné provést vzhledem k provozu zimního stadionu. Zadavatel při přípravě veřejné zakázky postupoval s odbornou péčí, přesto nebylo možné tuto skutečnost objektivně předvídat. Jedná se o vícepráce oproti SoD. Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o stavební práce přímo související s realizací původního předmětu plnění, které nemění účel ani charakter veřejné zakázky.
- c) Při demoličních pracích bylo zjištěno, že v bouraných konstrukcích se nenacházejí tepelné izolace, jak se uvažovalo v PD. Tyto skladby s tepelnou izolací byly i u jiných zimních stadionů běžné, dřívější normy s tepelnou izolací počítaly. Zadavatel při přípravě veřejné zakázky postupoval s odbornou péčí, přesto nebylo možné tuto skutečnost objektivně předvídat. Jde o méně práce oproti SoD.
- d) Projektová dokumentace ani vysoutěžený výkaz výměr neuvažovaly s dělením nebo krácením ocelového potrubí zabudovaného v betonových plochách. Po odkrytí skutečného stavu konstrukcí bylo zjištěno, že pro bezpečné provedení demoličních prací je nezbytné betonové plochy před bouráním proříznout v celém profilu, včetně zabudovaného potrubí. Prořezání je nezbytné zejména z důvodu omezení přenosu ořesů do konstrukce budovy zimního stadionu s ohledem na založení tribun. Tyto dodatečné stavební práce jsou technicky neoddělitelné od původního předmětu plnění a bezprostředně navazují na probíhající demoliční práce. Změna dodavatele není z technických důvodů možná, neboť provedení těchto prací jiným dodavatelem by způsobilo značné technické obtíže a podstatné zvýšení nákladů zadavatele. Jde o vícepráce oproti SoD. Navržené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o stavební práce přímo související s realizací původního předmětu plnění, které nemění účel ani charakter veřejné zakázky.
- e) Vzhledem k tomu, že při demoličních pracích bylo zjištěno větší množství zabudovaného ocelového potrubí, vzniklo vyšší množství železného šrotu, než předpokládala projektová dokumentace. Zadavatel při přípravě ve-

řejně zakázky postupoval s odbornou péčí, přesto nebylo možné tuto skutečnost objektivně předvídat. Jde o méně práce oproti SoD.

Zjištěné práce představují pokračování původních demoličních prací a nelze je technicky ani technologicky oddělit od realizace díla.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

- a) Zjištěnou novou betonovou plochu je třeba v celém rozsahu vybourat, odstranit a odvézt na skládku, aby bylo možné realizovat zakládání pro nové konstrukce. Jelikož se jedná o vícepráce, které svým charakterem odpovídají pracím obsaženým v původním položkovém rozpočtu (tj. jsou totožné s pracemi na ostatních betonových vrstvách), bude tato vrstva vybourána podle položky v dílu 020-BOURÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ č. 2 v ploše podle skutečnosti 1.624,500m² včetně souvisejících položek z dílu 997 – Přesun sutě č. 26,27,28,29,32,34,35 a z dílu 96 – Bourání konstrukcí půl. Č. 52. Množství a jednotkové ceny jsou uvedeny v podrobném výkazu výměr pro ZL č. 1
- b) Základní vrstvu mezi betonovými plochami je třeba odstranit a odvézt na skládku, aby bylo možné zrealizovat zakládání pro nové konstrukce. Jelikož se jedná o více prací, které svým charakterem odpovídají pracím obsaženým v původním položkovém rozpočtu (tj. jsou totožné s pracemi na ostatních podkladních vrstvách), bude tato vrstva odstraněna podle položky v oddíle 020-BOURÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ č. 1 v ploše podle skutečnosti 1848,000m² a k tomu příslušujícími položkami z dílu 997 – Přesun sutě č. 26,27,28,29,32,34,35. Množství a jednotkové ceny jsou uvedeny v podrobném výkazu výměr pro ZL č. 1
- c) Tepelné izolace, které se při bouracích pracích neobjevily, budou odečteny jako nerealizované práce, v jednotkových cenách podle oddílu 713 – izolace tepelné pod pol. č. 39. a 40. Množství a jednotkové ceny jsou uvedeny v podrobném výkazu rozlohy pro ZL č. 1
- d) Všechny betonové plochy je třeba před bouráním prořezat v modulech do 4 m, aby bylo možné při strojním bourání oddělovat zabudovanou výztuž a ocelové potrubí v betonu, bezpečně manipulovat s vybouranými konstrukcemi a následně je nakládat na dopravní prostředek. Prořezání je nezbytné rovněž z důvodu omezení přenosu otřesů do konstrukce budovy zimního stadionu, zejména s ohledem na založení tribun. Jedná se o dodatečné stavební práce, které jsou technicky neoddělitelné od probíhajících demoličních prací a navazují na původní předmět plnění. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová rozpočtová položka v dílu 96 – Bourání konstrukcí podle cenové soustavy CS ÚRS 2025/I. Množství a jednotkové ceny jsou uvedeny v podrobném výkazu výměr pro ZL č. 1.
- e) Skutečné množství železného šrotu bude odečteno na základě předložených vážných listů a bude odečteno podle položky v oddíle 997 – Přesun sutě č. 35. Množství a jednotkové ceny jsou uvedeny v podrobném výkazu výměr pro ZL č. 1

Zjištěné práce představují pokračování původních demoličních prací a nelze je technicky ani technologicky oddělit od realizace díla.

Změna a+b)	vícepráce	1.138.745,57 Kč bez DPH
	Méněpráce	- 16.819,31 Kč bez DPH

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 6 ZZVZ; součet hodnot všech těchto změn je **1.121.926,26 Kč bez DPH**

Změna c)	vícepráce	0
	Méněpráce	- 313.264,37 Kč bez DPH

Změny závazku spadají pod § 222 odst.6 ZZVZ; součet hodnot všech těchto změn je **- 313.264,37 Kč bez DPH**

Změna d)	vícepráce	644.400,- Kč bez DPH
	Méněpráce	0,-

Změny závazku spadají pod § 222 odst.4 ZZVZ; součet hodnot všech těchto změn je **644.400,- Kč bez DPH**

Změna e)	vícepráce	
	Méněpráce	- 140.298,33,- Kč bez DPH

Změny závazku spadají pod § 222 odst. 4 ZZVZ; součet hodnot všech těchto změn je **- 140.298,33 Kč bez DPH**

Jednotlivé změny byly posouzeny samostatně podle příslušných ustanovení § 222 ZZVZ, neboť jejich důvody i režim posouzení se liší.

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ: **1,79 %** (limit je nižší jak 15 %)

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ: **1,85 %** (limit je nižší jak 30 %)

Celkové navýšení 1.312.763,56 Kč bez DPH

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	1 783 145,57	2 157 606,14
MÉNĚPRÁCE	470 382,01	569 162,23
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	43 801 652,89	53 000 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	45 114 416,45	54 588 443,90

V dne

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

TDS souhlasí se zdůvodněním a příčinou změn, uvedenými v bodu 4. „Zdůvodnění a příčiny změn“ tohoto ZL. TDS respektuje a souhlasí se změnami uvedenými v bodu 5. „Návrh technického řešení a rozsah změny“ tohoto ZL.

TDS provedl kontrolu přiloženého výkazu výměr i nacenění jednotlivých položek, dle podmínek a požadavků, uvedených v SOD.

Změny zahrnuté v tomto změnovém listě znamenají mírný nárůst nákladů stavebníka. Hodnota změn nepřesahuje limity stanovené v § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ: **1,79 %** (limit je nižší jak 15 %)

Celkový podíl změn závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ: **1,85 %** (limit je nižší jak 30 %)

Doporučuji na základě tohoto ZL vypracovat dodatek k smlouvě o dílo se zhotovitelem, který bude obsahovat úpravu konečné ceny díla.

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.

V dne

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

S navrženými změnami souhlasím, jejich provedení bylo nezbytné pro zvýšení užitné kvality celého díla stavby. Změny nemění původní parametry stavby. GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

V dne

9. Stanovisko zástupce investora

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

Vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů a úspora finančního limitu bude RMH předložena ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG- 135119).

FI: navýšení 1.312.763,56 Kč bez DPH(1.588.443,91 Kč vč. DPH)

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG: 135119

Dotace EU/SR: ano / NSA

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

SD/2025/0234/150 ve znění dodatků č.1

Změnový list č.		Název Změnového listu:		celková částka
		ZL č. 1		1.588.443,91
Rozpis částky na roky:		2026		48.000.000,- Kč
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2026	150	135119		1.588.443,91

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:



příkazce operace:	datum:
správce rozpočtu:	datum: 20.7.26

11. Přílohy ke změnóvómu listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č.2 fotodokumentace
Příloha č.3 evidence vážních listku

1. Položkový rozpočet

SOUPIS VÍCE a MÉNE PRACÍ - Ledová plocha ZL č. 001										
Stavba: Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně										
Objekt: 020 - BOURÁNÍ AZAKLÁDÁNÍ										
Místo: Tyršova 3588/10		Datum: 30.06.2026								
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín		Projektant: B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2								
Účastník: Sdružení FROST - service s.r.o. + H+H TECHNIKA spol. s.r.o		Zpracovatel: František Zvonek								
Př.	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství více a méně pra	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] za ZL 1	Cenová soustava	ZZVZ, § 222 odst
Náklady soupisu celkem								1 312 763,56		
D HSV		Práce a dodávky HSV						981 627,93		
D 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce						451 407,38		
1	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmoty na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamene hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2						
2	K	113107237	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmoty na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2						
D 997		Přesun sutě						530 220,55		
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t						
27	K	997221559R	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně dopravy na skládku dle dodavatele	t						
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t						
29	K	997221569R	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně dopravy na skládku dle dodavatele	t						
32	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t						
34	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t						
35	K	997019999R	Výkup lezného odpadu	t						
D PSV		Práce a dodávky PSV						-313 264,37		
D 713		Izolace tepelné						-313 264,37		
39	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2						
40	K	713120829R	Odstranění tepelné izolace podlah z pěnového skla suchého tl do 100 mm	m2						
D 96		Bourání konstrukcí						644 400,00		
52		970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m						

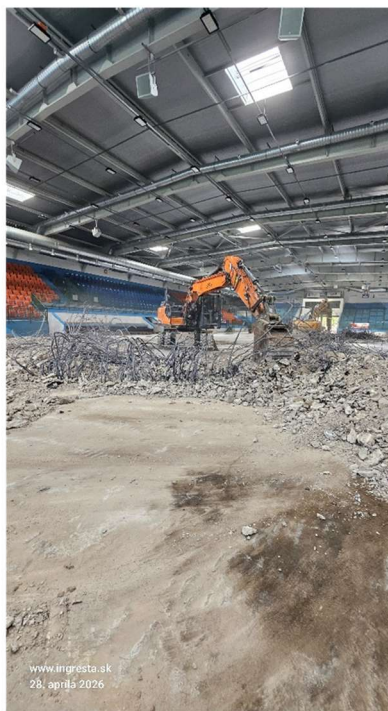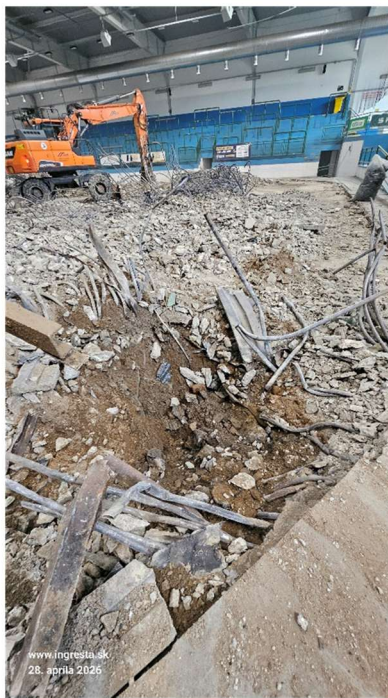

Příloha č.3

evidenze vážních listků

Č. VL	Datuma	SPZ	Váha (t)
19455	28.04.2026	JO49412	0,18
19801	29.04.2026	2BL4904	3,52
19693	29.04.2026	2BL4904	3,1
19851	29.04.2026	2BL4904	3,1
19938	30.04.2026	2BL4904	2,86
20021	30.04.2026	2BL4904	4,02
20090	30.04.2026	2BL4904	2,28
20140	30.04.2026	2BL4904	2,98
20163	30.04.2026	2BL4904	2,68
20455	04.05.2026	2BL4904	2,84
20356	04.05.2026	2BL4904	2,78
20502	04.05.2026	2BL4904	2,58
20584	04.05.2026	2BL4904	2,9
20542	04.05.2026	2BL4904	2,92
20880	05.05.2026	2BL4904	2,78
20796	05.05.2026	2BL4904	2,94
20933	06.05.2026	2BL4904	2,95
20957	06.05.2026	2BL4904	2,32
21013	06.05.2026	2BL4904	3,28
21081	06.05.2026	2BL4904	2,9
21136	06.05.2026	2BL4904	2,5
21642	11.05.2026	2BL4904	3,88
21669	11.05.2026	2BL4904	3,98
21715	11.05.2026	2BL4904	4,3
21766	11.05.2026	2BL4904	3,6
21836	11.05.2026	2BL4904	3,58
21880	11.05.2026	2BL4904	2,66
21191	07.05.2026	2BL4904	2,98
21251	07.05.2026	2BL4904	3,66
21335	07.05.2026	2BL4904	2,94
21394	07.05.2026	2BL4904	3,28
21926	12.05.2026	2BL4904	3,64
22049	12.05.2026	2BL4904	3,4
22077	12.05.2026	2BL4904	3,14
22170	13.05.2026	2BL4904	3,26
22247	13.05.2026	2BL4904	3,14
22332	13.05.2026	2BL4904	2,92
22519	14.05.2026	2BL4904	2,38
22472	14.05.2026	2BL4904	2,66
22697	14.05.2026	2BL4904	3,04
22800	15.05.2026	2BL4904	4,08
22851	15.05.2026	2BL4904	4,1
22940	15.05.2026	2BL4904	3,92
23136	18.05.2026	2BL4904	3,6
23209	18.05.2026	2BL4904	3,8
23291	18.05.2026	2BL4904	4,32
23508	19.05.2026	2BL4904	3,58
23545	19.01.1900	2BL4904	4,12
23636	20.05.2026	2BL4904	4,98
23752	20.05.2026	2BL4904	4,84
24088	21.05.2026	2BL4904	4,96
24086	21.05.2026	2BL4904	4,14
24107	22.05.2026	2BL4904	4,8
24570	25.05.2026	2BL4904	4,08
24753	25.05.2026	2BL4904	4,7
24781	25.05.2026	2BL4904	1
26170	01.06.2026	1BU2640	0,5
26075	01.06.2026	1BU2640	0,6
26041	01.06.2026	1BU2640	0,66
Celkem:			187,63
