




VARIANTA 1 I. etapa

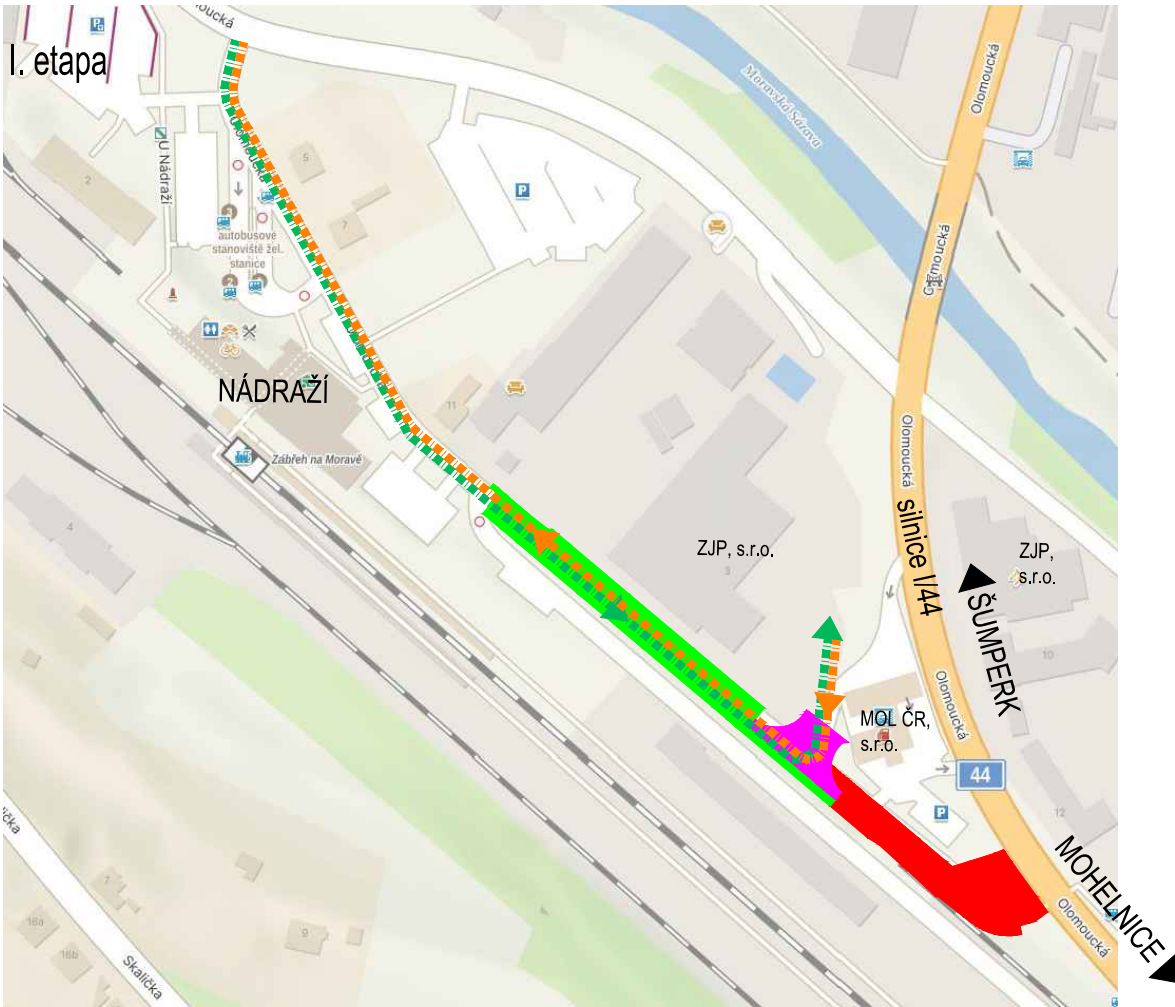

III. etapa

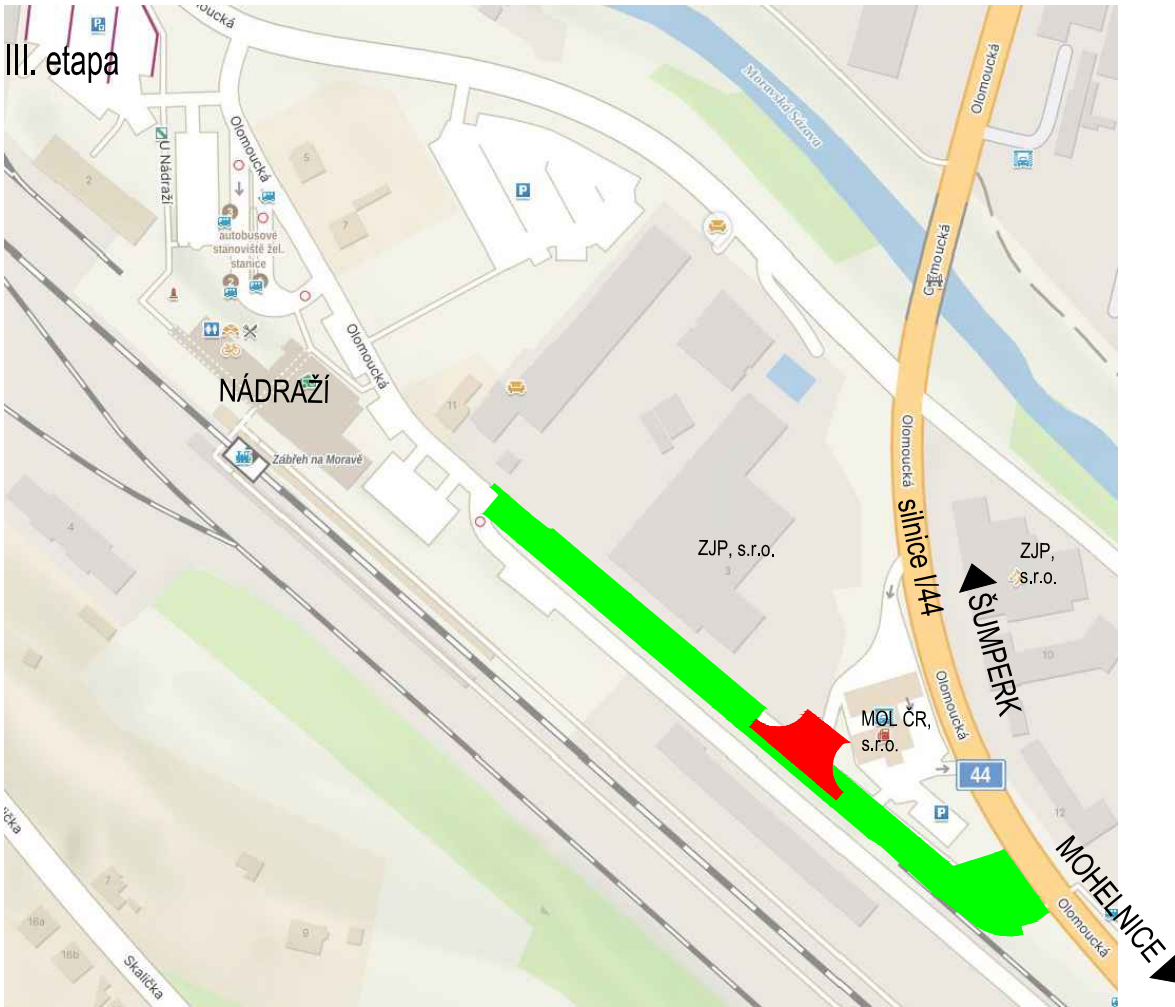

VARIANTA 2 I. etapa

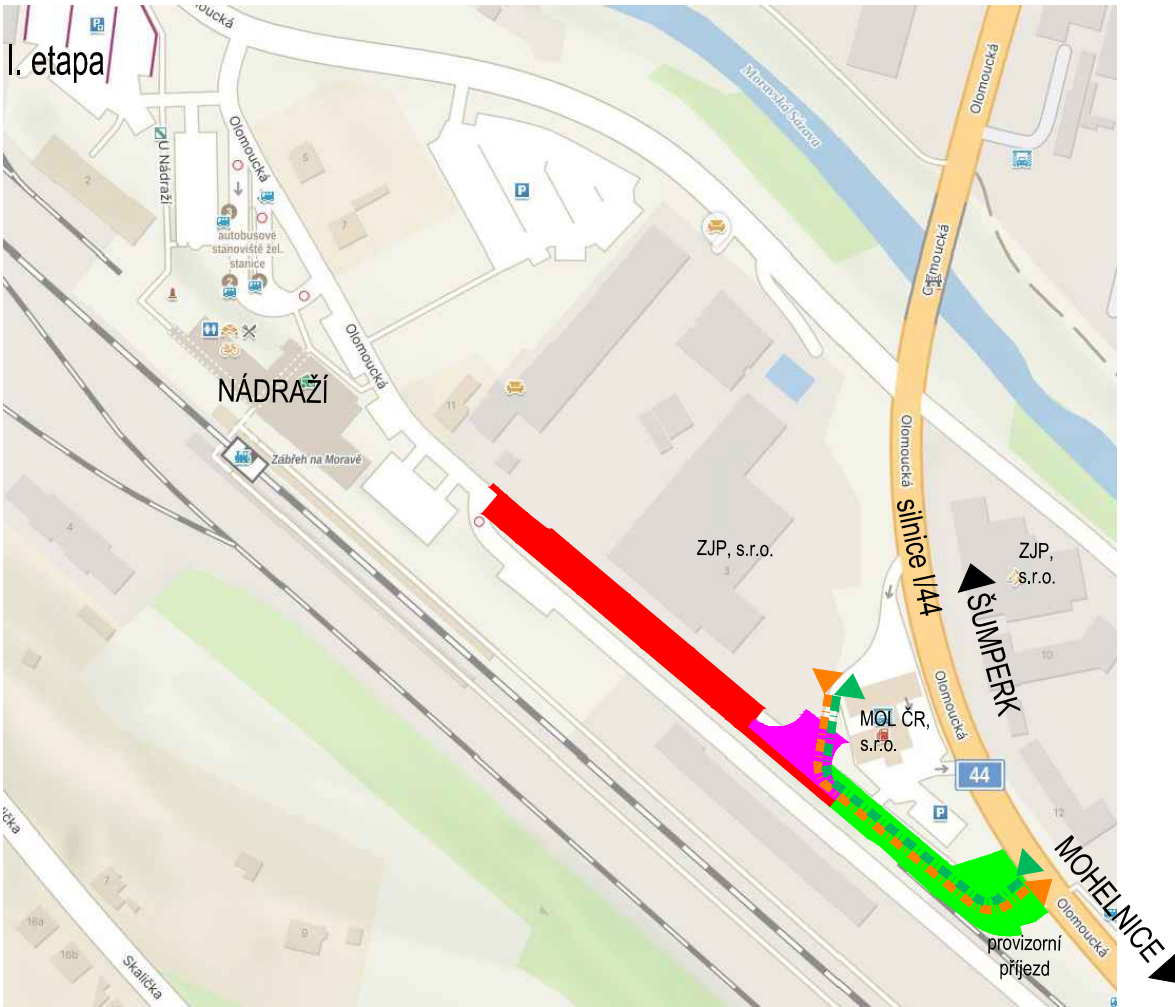

- LEGENDA PLOCH:
- PRŮJEZDNÉ
 - UZAVŘENÉ
 - OBNOVA ASFALTOBETONU - PRŮJEZDNÉ PO CELOU DOBU (MIMO DOBU POKLÁDKY OBRUSNÉ + LOŽNÉ VRSTVY)
 - PRÍJEZD K ZJP, s.r.o
 - VÝJEZD OD ZJP, s.r.o

POZN.:
Průjezdnost místní komunikace (ul. Olomoucká) bude v místě provádění stavebních prací možná pouze pro vozidla stavby, ZJP, s.r.o a IZS. Stavba bude rozdělena do tří etap. Je potřeba zajistit, aby byl zachován provoz do areálu ZJP, s.r.o a na ČS MOL, s.r.o. po celou dobu stavby.


Var.1) V první etapě bude neprůjezdná část v km 0,164-KÚ. Jedná se o stávající zaslepenou část. Vozidla budou do areálu ZJP, s.r.o. jezdit stále stejným způsobem. Komunikace bude uzavřena od ZÚ mimo vozidla ZJP, s.r.o. a stavby. Na ČS bude zamezeno vyjíždění na MK Olomoucká, výjezd na silnici I/44 bude umožněn, provoz ČS bez omezení.

V druhé etapě bude neprůjezdná část od km 0,000-0,123. Vozidla budou muset ze silnice I/44, přes ČS a do areálu ZJP, s.r.o. zacouvat. Provoz na ČS upraven B29 - na příjezdové komunikaci od I/44 po MK Olomoucká. Výjezd umožněn nově vybudovanou křižovatkou. NEBO. Vozidla budou najíždět novou křižovatkou, jejíž geometrie bude tomuto stavu natrvalo přizpůsobena (zvětšeno nároží).


Var. 2) Při přípravě zařízení staveniště bude zřízeno provizorní napojení na silnici I/44 pro vozidla stavby a nákladní vozidla jedoucí do areálu ZJP, s.r.o. Následně bude zealizována I. etapa od 0,000-0,123. Jakmile se dokončí tento úsek, budou v druhé etapě stavby vozidla jezdit po MK přes přednádražní prostor a bude realizována část v km 0,164-KÚ.

V třetí etapě bude v obou variantách neprůjezdné dopravní napojení od ZJP / MOL na MK - pokládka asfaltu, neprojde nikdo (1-2 dny dle zhotovitele).


VARIANTA 1 II. etapa

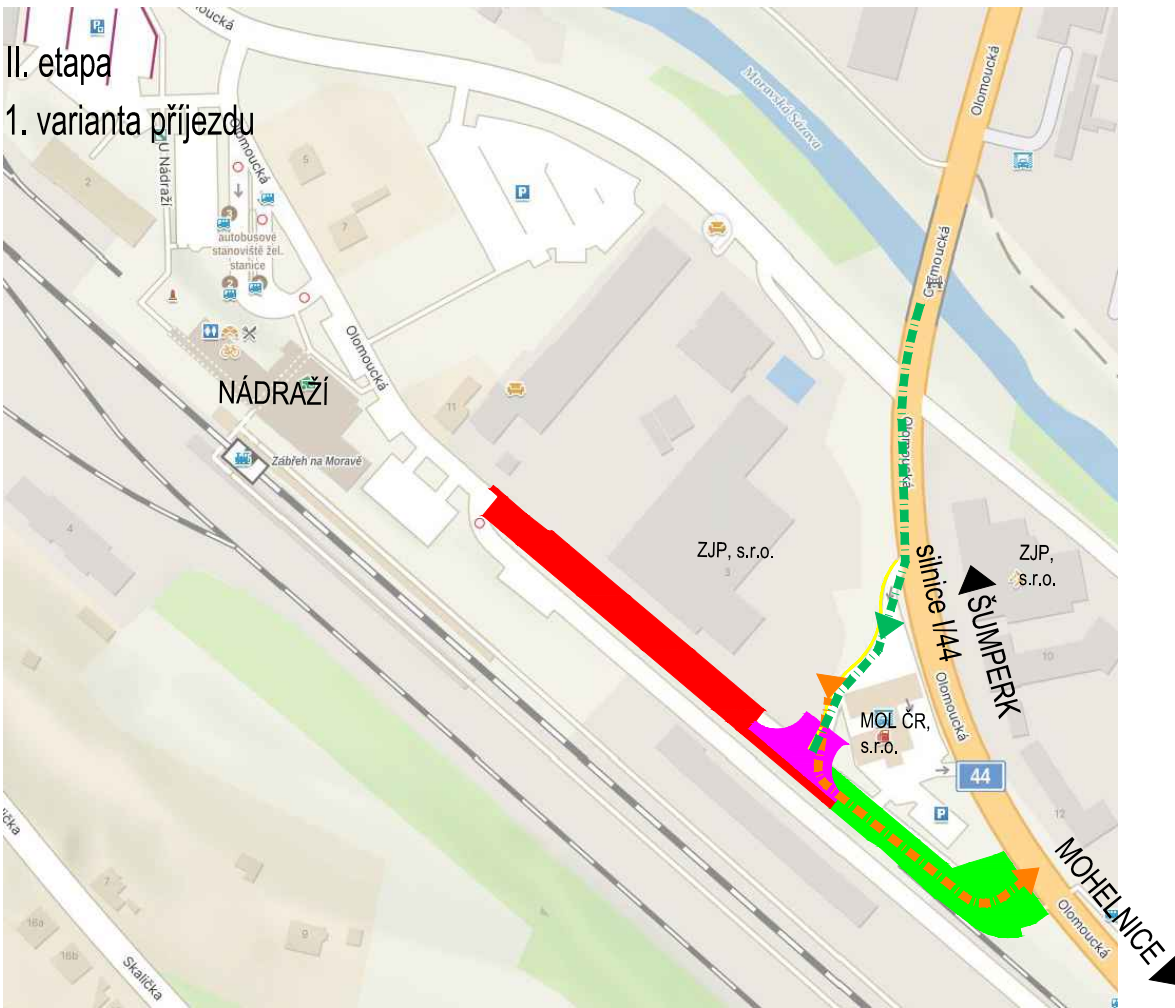

VARIANTA 1 II. etapa

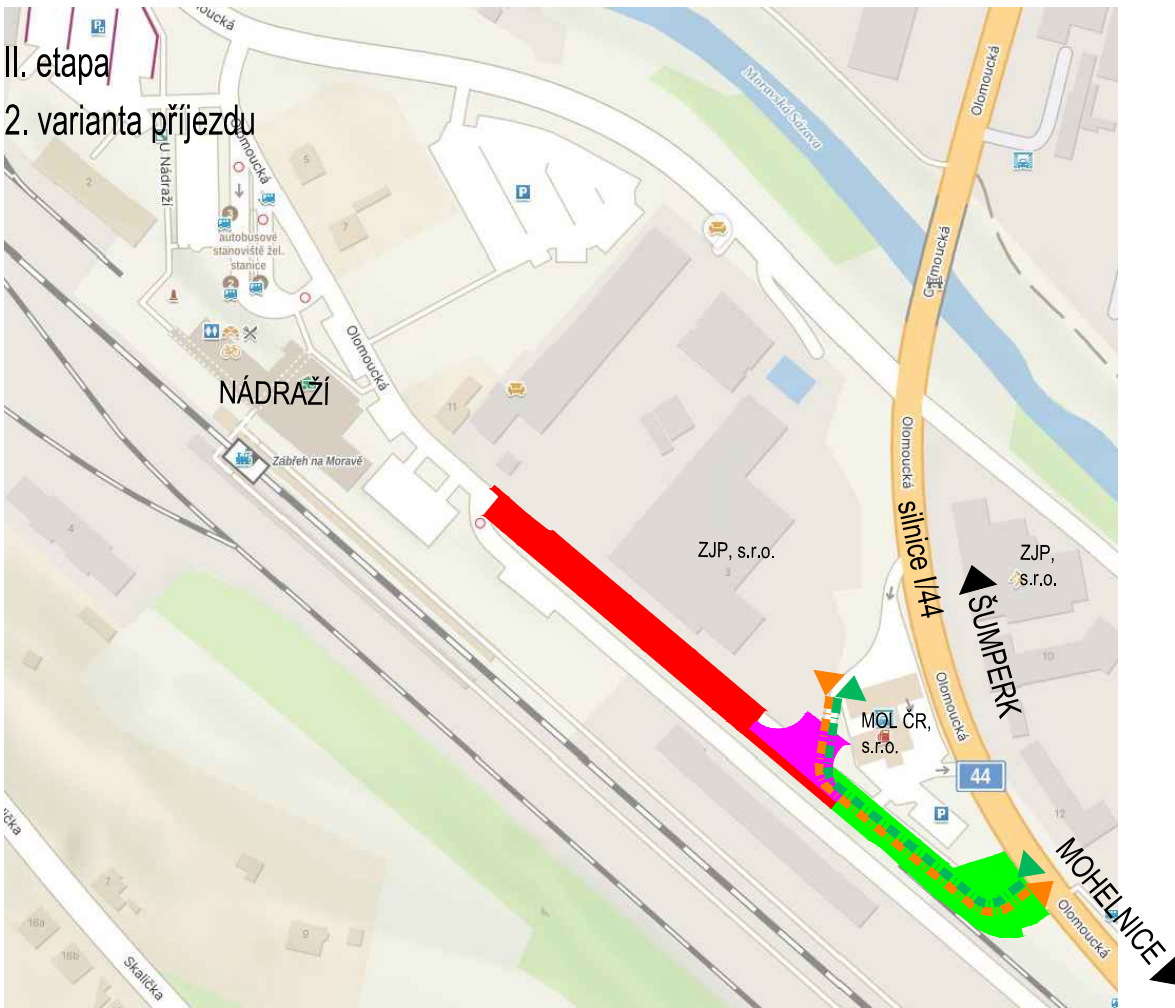

VARIANTA 2 II. etapa

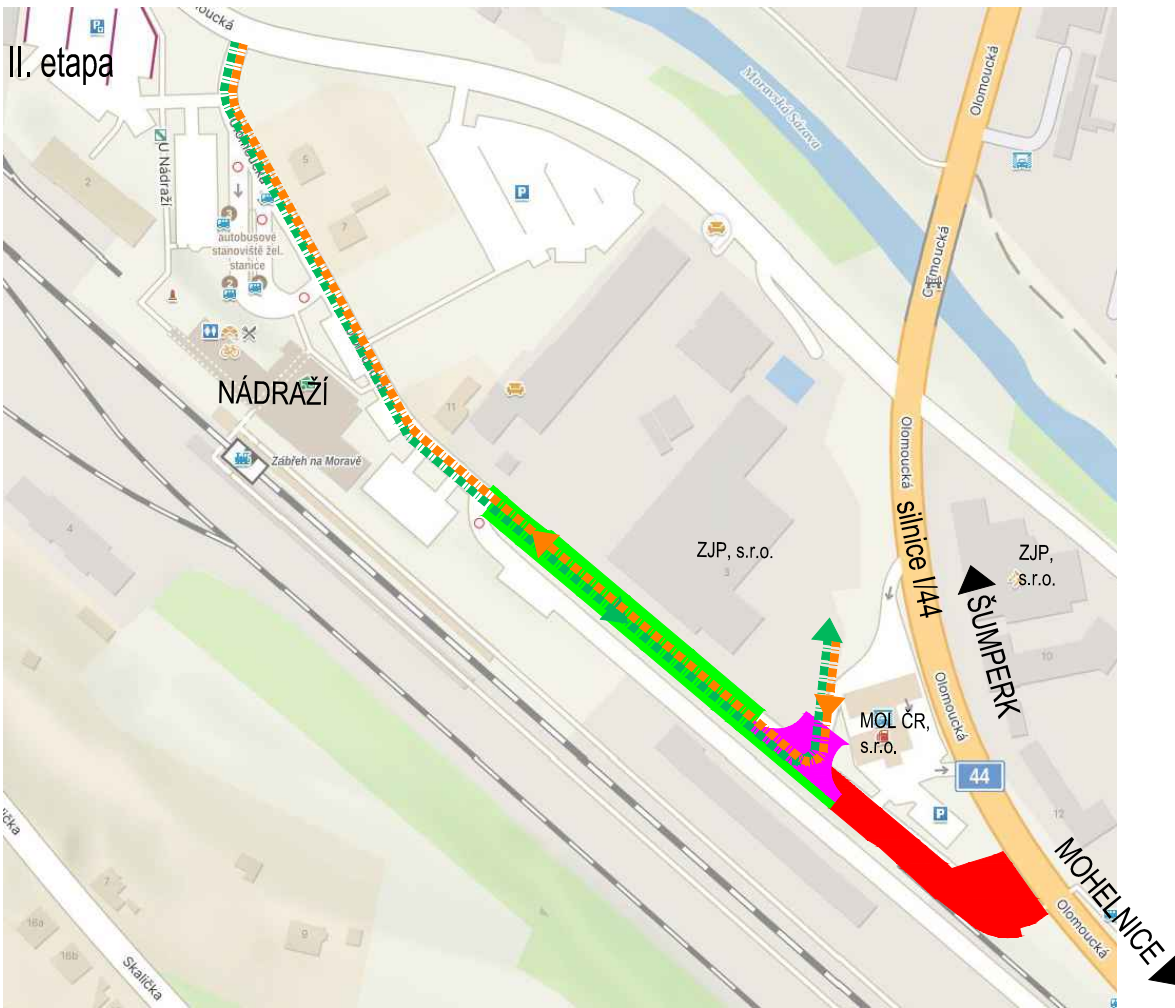

VEDOUCÍ PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		Ing. Linda Smitalová, IČO 74276361 Rokycanova 781/13 Olomouc 77900 +420 777 829 795 smitalova@atelis.eu www.atelis.eu	
Ing. Petr SMÍTAL ČKAIT 1202264		Ing. Linda SMÍTALOVÁ ČKAIT 1201908		Bc. Jitka RŮŽKOVÁ			
STAVEBNÍK Město ZÁBŘEH							
KRAJ OLOMOUCKÝ		MÍSTO k.ú. ZÁBŘEH NA MORAVĚ				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2025006	
AKCE						FORMAT 4 × A4	
						DATUM 06/2025	
						STUPEŇ PDPS	
						MÉRITKO - - -	
ZÁBŘEH - REVITALIZACE UL. OLOMOUCKÁ						ČÍSLO PŘÍLOHY B.P4b	
ETAPY VÝSTAVBY						ČÍSLO SOUPRAVY	
